

Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono

*“Programa Ambiente”*

*Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014 – 2021*

## **09\_CALL#3 - Reservas da Biosfera: territórios sustentáveis, comunidades resilientes**

*De acordo com os Artigos 25º, nº 2, alínea j) e 29º, nº4 do ‘Guia para os Candidatos ao Financiamento de Projetos de Ambiente, sobre Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono’*

### **Relatório Intercalar n.º 1**

09#3 | período: 12 nov. 2020 a 11 mar. 2021

março 2021

Técnicos	Formação	Funções
António Domingos Abreu	Biologia	Coordenador Técnico-científico do Projeto
Ana Barroco	Arquitetura Paisagista	Coordenadora Executiva do Projeto
Cláudia Mendes	Gestão de Empresas	Responsável pela Gestão do Projeto
Carlos Cerqueira	Marketing e Gestão de Empresas	Responsável pelo tema da Inovação e do Empreendedorismo
Cristina Abreu	Biologia	Membro da equipa técnica do Projeto
Fernanda Rollo	Historiadora	Responsável pelo tema Memória e Identidade e Infraestrutura Digital
Helena Freitas	Biologia	Responsável pelo tema Serviços de Ecossistema e Património Natural
Inês Castaño	Artes Plásticas	Coordenação equipa da KEEP
José Matos	Biologia	Responsável pelas Olimpíadas da Biosfera
Leonor Rocha	Ciências Sociais/História	Responsável pelo tema da Formação
Madalena Coutinho	Arquitetura Paisagista	Membro da equipa técnica do Projeto / Apoio à Coordenação Executiva do Projeto
Margarida Ramos	Tradutora	Apoio à Gestão do Projeto
Pedro Celeste	Gestão e Estratégia Industrial	Coordenação da Área da Comunicação

**O Promotor do Projeto**

Nome

Ana Maria Moreira Freire de Morais Barroco Parreira do Amaral

Data e Assinatura

Posição

Administração da Quaternaire Portugal

**O Operador do Programa – Secretaria Geral do Ambiente**

Nome

Alexandra Carvalho

Data e Assinatura

Posição

Secretária Geral

*Página deixada propositadamente em branco*

## Índice

<b>1</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Descrição detalhada .....</b>	<b>3</b>
2.1	Identificação das atividades.....	3
2.2	Resumo das atividades desenvolvidas .....	4
2.2.1	Progressão técnica.....	5
2.2.2	Progressão financeira .....	6
2.2.3	Envolvimento dos parceiros .....	7
2.2.4	Informação relativa aos participantes no Projeto.....	8
<b>3</b>	<b>Resultados alcançados .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro .....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente.....</b>	<b>21</b>

## Tabelas

Tabela 2.1 – Atividades abrangidas no período entre 12 de novembro 2020 e 28 de fevereiro 2021 .....	3
Tabela 2.2 – Progressão financeira. Custos de Gestão do Projeto .....	7
Tabela 2.3 – Envolvimento dos parceiros nas atividades de 12 de novembro 2020 e 28 de fevereiro 2021 ...	7
Tabela 2.4 – Envolvimento das RB e do Comité Nacional MaB .....	9
Tabela 4.1 – Progressão financeira. Custos do Projeto .....	19
Tabela 5.1 – Programa Ambiente, indicadores e metas .....	21
Tabela 5.2 – Relação de cada atividade com os indicadores previstos no Programa Ambiente .....	23

## Figuras

Figura 3.1 – Execução do Projeto. Progressão das atividades iniciadas e executadas.....	15
Figura 3.2 – Execução do Projeto. Progressão de execução das atividades ativas .....	16
Figura 3.3 – Execução do Projeto. Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento .....	17
Figura 3.4 – Execução do Projeto. <i>Outputs</i> .....	17
Figura 3.5 – Execução do Projeto. Indicadores de resultados.....	18
Figura 3.6 – Comunicação e divulgação do Projeto.....	18

## Anexos

<b>A.</b>	<b>Fichas das atividades .....</b>	<b>25</b>
-----------	------------------------------------	-----------

*Página deixada propositadamente em branco*

# 1 INTRODUÇÃO

O presente documento corresponde ao 1º Relatório Intercalar do projeto **09#CALL3 – Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes** e tem como objetivo apresentar informação sobre o progresso de execução técnico e financeiro do Projeto, sendo a avaliação efetuada reportada ao período entre 12 de novembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021<sup>1</sup>.

Pretendendo-se a sua rápida leitura e perceção clara do estado de evolução do Projeto, o documento encontra-se organizado, seguindo a estrutura modelo proposto pelo Programa EEA Grants:

- O capítulo 2 é dedicado à descrição detalhada das atividades, no qual se inclui:
  - a identificação das atividades em curso no período em apreço e a apresentação do seu cronograma de desenvolvimento revisto em função da data efetiva de assinatura do contrato;
  - o resumo das atividades desenvolvidas, focalizado-se na progressão técnica e financeira, bem como no envolvimento dos parceiros e de outros participantes;
- O capítulo 3 é dedicado aos resultados alcançados;
- O capítulo 4 é dedicado à descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro;
- O capítulo 5 é dedicado à descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente.

No Anexo A encontram-se as fichas das atividades, onde é sistematizada, em formato de tabela, toda a informação de caracterização da progressão técnica e financeira considerada relevante.

---

<sup>1</sup> De acordo com a informação recebida da SGA a 5 de março de 2021.

*Página deixada propositadamente em branco*



## 2 DESCRIÇÃO DETALHADA

### 2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

De acordo com a candidatura, apresenta-se na tabela seguinte as atividades iniciadas no período entre 12 de novembro e 28 de fevereiro, destacando-se as datas previstas para o seu desenvolvimento, bem como os parceiros responsáveis pela sua execução.

As atividades associadas à gestão geral do Projeto, no qual se inclui a elaboração do presente relatório, são consideradas tarefas regulares ao longo de todo o Projeto pelo que, face à sua natureza, são consideradas atividades transversais.

**Tabela 2.1 – Atividades abrangidas no período entre 12 de novembro 2020 e 28 de fevereiro 2021**

ID	Designação	Data início	Data fim	Parceiro responsável
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)	12-11-2020	30-04-2021	QP
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB	12-11-2020	30-04-2021	QP
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO	01-01-2021	31-03-2021	QP
4	História das Reservas da Biosfera	12-11-2020	01-11-2022	UNL-FCSH
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto	12-11-2020	30-04-2021	UNL-FCSH
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	12-11-2020	30-04-2021	UNL-FCSH
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída	01-01-2021	30-06-2021	UNL-FCSH
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	01-01-2021	30-01-2023	UNL-FCSH
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB	12-11-2020	30-04-2021	UC/ Univ Bergen
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	01-12-2020	31-05-2021	UC/ Univ Bergen
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	01-01-2021	31-10-2021	QP
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB	01-01-2021	30-06-2021	IPN
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	01-01-2021	30-06-2021	IPN
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	01-02-2021	31-10-2021	UC/ Univ. Bergen/ RB de Nordhordland
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)	12-11-2020	30-09-2021	UNL-FCSH
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	12-11-2020	11-04-2023	QP
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	12-11-2020	31-12-2020	PC&A
57	Conceção do Plano de Comunicação	01-01-2021	28-02-2021	PC&A
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	01-01-2021	30-06-2021	QP
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	01-02-2021	31-05-2021	OBio
80	Extensão do conhecimento	12-11-2020	30-05-2022	Keep
	Gestão do projeto	12-11-2020	11-05-2023	QP
RI 1	Relatório Intercalar 1	12-11-2020	01-04-2021	QP

Fonte: Contract\_09\_CALL#3\_Anexo I\_Vf 04nov

## 2.2 RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Todas as atividades são descritas através de um conjunto de indicadores que permitem uma leitura síntese dos níveis de execução técnica e financeira de desenvolvimento de cada atividade, permitindo a apreensão do estado de execução do Projeto de uma forma objetiva, integrada e consistente, passível de ser monitorizada. Assim, cada atividade é sistematizada em duas componentes essenciais da sua execução – progressão técnica e progressão financeira – com os seguintes campos descritivos (veja-se Anexo A):

- Progressão técnica:
  - Tarefas realizadas – onde se identificam as ações desenvolvidas, o parceiro responsável e outros parceiros participantes;
  - Resultados obtidos – onde se enuncia o que foi conseguido com as tarefas realizadas e se listam os documentos, ações e outras formas de evidência dos resultados obtidos;
  - Reorientações e ajustamentos – onde se evidenciam as tarefas/ ações que, por qualquer motivo, não foram realizadas, se justifica a sua não realização e se apresentam medidas corretivas no sentido de resolver eventuais lacunas, atrasos, etc.;
  - Barómetro de execução - onde se recuperam os indicadores, metas e fontes de verificação associados a cada atividade, tal como apresentados na candidatura/ contrato e se regista o seu estado de execução (executado, em execução, não executado);
  - Cronograma de execução – onde se regista o estado de execução da atividade no período de avaliação do Relatório Intercalar em apreço e se projeta a sua evolução para o próximo relatório, com a enunciação de tarefas previstas a realizar.
- Progressão financeira:
  - Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a;
  - Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b;
  - Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4;
  - Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2;
  - Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e;
  - Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f;
  - Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g.

Todos estes campos especificam os seguintes parâmetros:

- Total previsto: valores contratados de acordo com os documentos “Contract\_09\_CALL#3\_Anexo I” e “Contract\_09\_CALL#3\_Anexo I\_Rev.01\_2021\_03\_23”, partes integrantes do contrato;
- Executado entre: valor do que foi executado no período de avaliação a que o relatório intercalar diz respeito;
- % do que foi executado em relação ao total previsto;

- Executado acumulado: somatório do valor do que foi executado nos diferentes períodos de avaliação/relatórios intercalares;
- % do executado acumulado em relação ao total previsto.

Em adicional considera-se a atividade transversal de “Gestão” do Projeto.

### 2.2.1 Progressão técnica

No geral verifica-se que todas as 23 atividades em avaliação neste relatório iniciaram a sua atividade, como previsto.

Como seria de esperar, as **tarefas realizadas** associam-se a ações típicas de uma fase inicial de arranque do Projeto, destacando-se as seguintes, entre outras:

- Pesquisa, recolha e sistematização de informação, incluindo a recebida das RB;
- Reuniões de apresentação e de primeiros contactos com as RB Portuguesas, com o envolvimento de diferentes parceiros, onde foi solicitado um conjunto diversificado de informação;
- Afinação de metodologias;
- Preparação de bases de dados;
- Preparação de inquéritos e entrevistas.

Na sua sequência, nos **resultados obtidos** incluem-se a troca de informações, o recebimento de informação relevante das RB, a criação de bases de documentos de trabalho, análises de benchmarking e lançamento de inquéritos, entre outros, com **evidências** em registos próprios, em atas das reuniões, nas respostas aos inquéritos e na produção de diversos documentos de trabalho de tratamento de dados.

A diversidade do tipo de atividades e do seu cronograma de execução, que justifica diferentes estágios de desenvolvimento, leva a que seja destacada a atividade Estratégia de Marketing (ID56) por ser a única, neste período de avaliação, com a edição de relatório como produto.

**Justificado** pelo estado de pandemia e correspondente estado de emergência, todas as deslocações e visitas às RB ficaram suspensas, obrigando a **reorientações e ajustamentos** à programação inicial de algumas das tarefas previstas para o desenvolvimento das atividades. De facto, ficaram suspensos os contactos diretos com os locais, comunidades e territórios, levando a ajustar o cronograma de execução de algumas tarefas das atividades relacionadas com a Estratégia de Marketing (ID56) e o Plano de Comunicação (ID57). Há também a referir a reprogramação inicial das atividades relacionadas com o Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB (ID15), a Identificação dos serviços de ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas (ID16) e a Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB (ID21), justificada pela própria data de início do Projeto e da interligação entre atividades.

Relativamente a estas 3 últimas atividades, importa salientar o envolvimento e participação direta da da Cátedra Unesco "Sustainable heritage and environmental management" da Universidade de Bergen, sendo que à atividade ID21 também se junta Reserva da UNESCO Nordhordland da Noruega, ambos parceiros noruegueses.

Como **medidas corretivas** destacam-se a intensidade de contactos e reuniões online, os reagendamentos de deslocações e entrevistas e os ajustes ao cronograma de execução já referidos. Refere-se também a necessidade que houve de ajustamentos ao orçamento aprovado em duas atividades - Levantamento dos

planos de ação, objetivos e prioridades das RB (ID2) e Extensão do conhecimento (ID80) – que se traduziram em realocação de verbas.

A análise do campo **barómetro de execução** demonstra que todas as atividades estão em desenvolvimento, com todos os indicadores, metas e fontes de verificação “em execução”, com exceção da atividade Estratégia de Marketing (ID56), considerada como “executada” por ser a única, como já mencionado, com um output. Ressalva-se, contudo, que a proposta de prolongamento desta atividade para realização de visitas às RB e a própria divulgação do documento pelas RB, poderá induzir alguns ajustamentos no documento, incorporando iniciativas e propostas já previstas pelas próprias Reservas da Biosfera.

No contexto do que tem sido referido, o **cronograma de execução** evidência que, no período de 12 de novembro de 2020 e 28 de fevereiro do corrente ano, todas as atividades se encontram “em execução” com a exceção da atividade Estratégia de Marketing (ID56), considerada como “executada”, e que todas estarão em execução no próximo período de avaliação (1 de março a 30 de junho de 2021), no qual se destaca a continuação da realização das tarefas em curso e as deslocação às RB como as principais tarefas previstas para o próximo quadrimestre.

Importa, ainda, destacar que entre as 23 atividades em avaliação 11 deverão ser concluídas durante o próximo período de avaliação.

Por último, numa breve referência à atividade transversal de **Gestão do Projeto**, refere-se o envolvimento constante da Coordenação do Projeto, quer com todos os parceiros da equipa (nacionais e internacionais, estes últimos envolvidos nas reuniões gerais do Projeto), quer com as próprias Reservas da Biosfera, bem como com o Comité Nacional MaB, traduzindo-se no acompanhamento contínuo do desenvolvimento das atividades técnicas e dos procedimentos administrativos que um Projeto desta natureza tem associado, mas também na procura de oportunidades de parcerias, divulgação e de participação do Projeto em eventos, com destaque para as comemorações dos 50 anos do Programa MaB, onde conta com a colaboração de toda a equipa.

### 2.2.2 Progressão financeira

A análise da progressão financeira das atividades em avaliação permite evidenciar 3 atividades com uma percentagem de execução em termos de afetação de **recursos humanos**, superior a 80%, o que se justifica por se tratarem de atividades muito dirigidas à fase de arranque em que o Projeto se encontra neste período de avaliação, a saber:

- ID1 - Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)
- ID2 - Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB
- ID56 - Elaboração da Estratégia de Marketing

Em relação aos “recursos humanos” destaca-se também o facto de haver 6 atividades que ainda não afetaram qualquer despesa a esta rubrica, por considerarem as tarefas desenvolvidas até ao momento como sendo ações da competência da própria entidade. A estas juntam-se mais 4 por atraso no processamento de contratação.

É igualmente possível verificar que 11 das atividades possuem verbas atribuídas à rubrica **custos com transporte**, sem haver qualquer despesa associada, o que reflete o já referido na progressão técnica relativamente às deslocações às RB não executadas em virtude da pandemia e do estado de emergência declarado.

Destaca-se também que das 2 atividades com verba para **equipamentos** apenas 1 já a utilizou, e o facto de 8 atividades preverem a **aquisição de serviços** que ainda não se concretizaram.

Em termos de **Gestão do Projeto** verifica-se que, relativamente às verbas previstas, a média dos custos já verificados é de 13% do valor total previsto, apresentando-se na tabela seguinte um resumo por rubrica.

**Tabela 2.2 – Progressão financeira. Custos de Gestão do Projeto**

Rubrica	Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)
Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a	275 714,10€	38 360,53€	14%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b	22 578,50€	0,00€	0%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4	2 902,50€	338,63€	12%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2	4 950,00€	0,00€	0%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e	0,00€	0,00€	0%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f	7 875,06€	1 324,64€	17%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g	2 720,00€	34,32€	1%

### 2.2.3 Envolvimento dos parceiros

Como pode ser observado na tabela de identificação das atividades em avaliação, bem como nas respetivas fichas que constituem o Anexo A, no período a que o presente documento se reporta houve o envolvimento de todos os parceiros, verificando-se que apenas os parceiros Nordhordland Utviklingsselskap IKS e Icelandic National Commission for UNESCO não tiveram uma participação ativa nas atividades específicas em desenvolvimento. Contudo, regista-se, no caso da Islândia, a informação de que o parceiro incluirá na equipa de Projeto, um representante do Ministério do Ambiente da Islândia, que é o coordenador da primeira candidatura a Reserva da Biosfera neste país e que integrando o Projeto beneficiará da experiência das Reservas da Biosfera portuguesas e da equipa de projeto na preparação dessa candidatura.

Para além da participação em reuniões de coordenação e de apresentação do Projeto às RB, o envolvimento dos parceiros nas diferentes atividades é o registado na tabela seguinte.

**Tabela 2.3 – Envolvimento dos parceiros nas atividades de 12 de novembro 2020 e 28 de fevereiro 2021**

ID	Designação	QP	UC	UNL	PCA	IPN	OBiO	Keep	UiB	Nordh	Iscl
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)										
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB										
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO										
4	História das Reservas da Biosfera										

ID	Designação	QP	UC	UNL	PCA	IPN	OBI	Keep	UiB	Nordh	Iscl
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto										
6	Ausculção/Perceção e identificação do património										
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída										
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera										
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores										
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera										
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB										
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas										
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico										
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB										
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável										
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB										
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)										
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas										
56	Elaboração da Estratégia de Marketing										
57	Conceção do Plano de Comunicação										
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos										
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera										
80	Extensão do conhecimento										
RI 1	Relatório Intercalar 1										

## 2.2.4 Informação relativa aos participantes no Projeto

No presente período de avaliação consideram-se participantes no Projeto as Reservas da Biosfera e o Comité Nacional MaB.

A convite da Presidência do Comité Nacional MaB, a Coordenação Técnica do Projecto participou na 11ª reunião do Comité Nacional MaB, realizada a 20 novembro 2020, com vista a uma primeira apresentação do Projecto às Reservas da Biosfera e demais membros deste Comité (Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Turismo de Portugal e Comissão Nacional da UNESCO). Por seu lado o Comité MaB, representado pela sua Presidente, esteve presente em reuniões do Projeto, designadamente

na discussão de particularidades relativas às diferentes reversas, como é o caso das RB Insulares e tem mantido contactos regulares com a Coordenação Técnica do Projeto.

As RB, representadas pelos membros dos órgãos de gestão, para além da participação em diversas reuniões com a equipa do Projeto, têm disponibilizado um conjunto de informação relevante das RB, bem como têm respondido aos inquéritos já lançados pela equipa na área temática do desenvolvimento económico sustentável. Estão, também, em contacto regular com a Coordenação Técnica do Projeto.

Na tabela seguinte listam-se as interações realizadas.

**Tabela 2.4 – Envolvimento das RB e do Comité Nacional MaB**

Participante	Reuniões	Informação disponibilizada	
		Data	Documentos
RB Paul do Boquilobo	19-11-2020 10-12-2020 19-01-2021	-	Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Ilha do Corvo	03-12-2020 13-01-2021 22-02-2021	14-12-2020 11-01-2021	Declaração Ambiental POOC Corvo DLR_44_2008_A PNC Dossiê original candidatura 2007 RBC DRR nº20-2015-A património Corvo Green island - proj. Corvo sustentável Ilha do Corvo Mapa Livro COR_BIOSFERA_PT Plano Ação_RB_Corvo 22 jun. 020 portaria Plano Gestao Regiao Hidrografica Açores -A_2016-2021 CORVO Planta condicionantes POOC Corvo POOC Corvo DRR 14_2008_A Rede Natura 2000 Ilha do Corvo Relatório periódico RB Corvo PT (Word) Relatorio_PG_PNICorvo_consulta publica Relatorio_RevisaoPeriodica_RBCorvo_2017_EN Reserva da Biosfera da Ilha do Corvo Mapa Zonamento Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Ilha da Graciosa	03-12-2020 12-01-2021 22-02-2021	11-12-2020 08-01-2021 12-01-2021	1. Candidatura de Graciosa a Reserva da Biosfera (RC_2007_04GraciosaV34) 2. Livro candidaturabiosferagraciosa 3. Relatorio_RevisaoPeriodica_RBGraciosa_2017_EN 4. FINAL_EN_Periodic_review_RB Graciosa 2017 vf_19092017 5. Periodic_review_RB Graciosa 2017 (versão PT 2017_08_09) 6. Portaria 27-2011 (Regulamento da marca Biosfera Açores) 7. DLR 15-2012-A (Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade) 8. Portaria 136-2020 (Plano de Ação da Reserva da Biosfera da Ilha da Graciosa) 9. Fuma do Enxofre (Artigo, Pingo de Lava dez 2015) 10. Xarxa illes RdB. Graciosa 11. Catálogo de las Reservas de la Biosfera de la Red IberoMaB (Abril 2020) - Catálogo de las Reservas de la Biosfera de la Red IberoMaB (Abril 2020). (oapn.es) 12. Relatorio_PG_PNI_Graciosa_consulta publica Zonamento 13. PEM_ACORES2.pdf 14. Grater 2015.pdf 15. SGS-GROUP-Estudo-Governo-Acores-A4-PT-17-low.pdf 16. Graciolica Project Summary.pdf 17. DLR 45-2008-A (Cria o Parque Natural da Ilha Graciosa).pdf



Participante	Reuniões	Informação disponibilizada	
		Data	Documentos
			Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Ilha das Flores	03-12-2020 25-01-2021 22-02-2021	11-01-2021 26-02-2021	Altimetria_FLO Limitilha_FLO ZonaNucleo ZonaTampao ZonaTransicao FLO_ReservaBiosfera_vertical FLO_ReservaBiosfera_vertical FLO_ReservaBiosfera_vertical Decreto Legislativo Regional n.º 8.2011.A PNIFLO.pdf DRR n.º6.2013.A Plano de Ordenamento das Bacias Hidrográficas das Lagoas da Ilha das Flores .pdf Ficha informativa de los Humedales de RAMSAR - Planalto Central das Flores (Morro Alto) .pdf FLO_BIOSFERA_PT CANDIDATURA 2009.pdf Relatório RB Flores Periodic review 2019 9.1+GRA_ReservaBiosfera_SemAltimetria 9.1+GRA_ReservaBiosfera_vertical 9.2+Vegetation+map+or+land+cover+map 9.3+List+of+legal+documents 9.4+List+of+land+use+and+management-cooperation+plans 9.5+Species+list+Flores 9.6+List+of+main+bibliographic+references EN_Relatorio+da+Ilha+das+Flores+Periodic_review PA_ReservaBiosfera_Flores_2019 Suporting+Letters Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RBT Grês/ Xurés	02-12-2020 19-01-2021 16-02-2021	16-02-2021	20201209_EEAG_referenciasRB Candidatura MaB anexosreserva_biosfera_trnsf reserva_biosfera_gerês-xures CANDIDATURA MaB_versão portuguesa2 RAtividades RA RBTGX 2013 RA RBTGX 2014 RA RBTGX 2015 RA RBTGX 2016 RA RBTGX 2017 inglês RA RBTGX 2018 inglês RA RBTGX 2019 RBTGX LOGO RBTGX-logo_1 RBTGX-logo_2 RBTGX-logo_3 Relatorio Conjunto RBTGX 10 anos 2019-0918-RBTGX-1Relatorio-Global 2019-0918-RBTGX-3Plan-Valora 2019-0919-RBTGX-2Plan Accion 2019-0919-RBTGX-4Mapa-Zonificacion Plano Ação 2011-2015 Plano Ação 2015-2020 POPNPG Regulamento Reserva Biosfera Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico



Participante	Reuniões	Informação disponibilizada	
		Data	Documentos
RB Berlengas	10-12-2020 13-01-2021 04-02-2021	13-01-2021	Folhetos Berlenga Life - Berlengas - Documentário Lefe Berlengas Pedro Salgado - "Berlengas: Desenho, Ilustração e Fotografia" (Parte 2) Berlenga ilha do farol Berlenga sustentável Trailer - Viagem à Berlenga Programa MAB ICNF Programa "Mesa Nacional" da VI nas Berlengas Artigo Berlengas - Revista Mergulho (Brasil) Artigo "Conhecer Melhor o Mar Português" – revista Notícias do Mar Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Santana	22-02-2021 24-02-2021	05-02-2021 15-02-2021	rel Santana eng Relatório anual 2016 - Santana EN Relatório anual MaB - 2018 Relatório anual MaB - 2018_EN Relatório EN RB Santana AT Relatório Final 2019-inglês Relatório Final 2019-português relatório MaB Madeira 2011 Relatório PT anual RB Santana Santana - pt Santana - relatório anual 2015_EN Santana PT - Relatório anual 2015 Santana pt Candidatura Reserva da Biosfera Santana Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RBT Meseta Ibérica	02-12-2020 15-01-2021 18-02-2021	07-01-2021	20201209_EEAG_referenciasRB_RBTMI T1. Documentação de referências sobre as RB Formulários de candidatura RB - relatório Anexos Anexo1 Mapas zonamento Anexo 2 Carta de ocupação do solo Anexo 3 Lista de documentos jurídicos Anexo 4 Planos de Ordenamento Anexo 4.2 Síntese dos planos de ordenamento dos espaços naturais protegidos transfronteiriços Anexo 5 Flora e Fauna Anexo 6 Bibliografia Anexo 7 Apoios Anexo 8 Municípios Anexo 9 DIA Barragem Foz Tua Anexo 10 AECT-ZASNET Anexo 11 Inquéritos Anexo 12 Plano de Ação Anexo 13 Plano Estratégico Anexo 14 Estatutos AECT-ZASNET Anexo 15 Imprensa RBT - relatório Anexos Anexo 1.1 Carta de localização geral com coordenadas Anexo 1.2 Mapa Zonamento com coordenadas Anexo 2 Plano de Ação Anexo 3 Bibliografia

Participante	Reuniões	Informação disponibilizada	
		Data	Documentos
			Relatórios de atividades Relatórios anuais (2015 - 2020) Relatórios/Estudos de aracterização Formulário da candidatura Síntese PO Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico Elementos Transformteiriços Relatórios mensais Guias Propostas Rotas_PT_2015 Bases de dados Parceiros Contratos Organigrama RBTMI PT T2. Documentação relativa a projetos/eventos Relatórios de projetos realizados pela RB Memoria descritiva do projeto 0202_ZASNET_MESETA_IBERICA_2_P Relatórios de projetos realizados por terceiros 341318-Text de l'article-491940-1-10-20180919 Identificação de redes de RB T3. Documentação de referência relativos aos territórios PDM e pl. Estratégicos - ver excel Plano de ação de adaptação às alterações climáticas_TFT Brochura_PIAAC_TQT T4. Suportes de comunicação e merchandising fotografias folhetos logotipo T5. Outros documentos relevantes 1. RBT Meseta Iberica_Regulamento de uso da marca_2020 2. certificado_auditoria_1499_pt_Certificado BIOSPHERE D 2.a informe_auditoria_1499_6490791e7abf6b29a381288cc23a8223 3. Alterações climáticas 3.a EMAAC_Braganca_re 3.b Plano_integracao_monitorizacao_TQT 4. Plano de atividade_Ed Ambiental 5. Ficha actividad Mujer e Igualdad_atualizado 17Fev LEQUE 6. Apresentacao _Conselhos Municipais Educacao 7. Plan Sinalizacion_RBTMI 8. REGULAMENTO do CONCURSO RECEITAS da Biosfera Meseta Iberica 8.a meseta iberica_Libro_version 1 9. ManifestoViajante_Completo_PT_Print 10. Resumo_LabCol_MI 11. JaT_Tua_Plano Operacional T6. Contactos da RB - ver excel T7. Contactos e redes associadas à RB - ver excel Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Fajãs de São Jorge	03-12-2020 14-01-2021 22-02-2021	06-01-2021 08-01-2021	138-I-Portaria-2020-10-08.pdf Anteprojeto_DRR+Anexo-I_Regulamento_PGPNI_SaoJorge.pdf DLR 10 2011 A.pdf Fajas-Sao-Jorge-en.pdf Fajas-Sao-Jorge-pt.pdf Formulario_S_Jorge_versão FINAL 09-08-2015 alterações.docx Relatorio_PG_PNI_SaoJorge_consulta publica.pdf

Participante	Reuniões	Informação disponibilizada	
		Data	Documentos
			Zonamento Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RBT Tejo/ Tajo Internacional	02-12-2020 14-01-2021 10-02-2021	28-01-2021	Informação Entidades parceiras no Território RBTTT12 Candidatura_RBTTI Espanha Anexo3-PIAção_RB_TT_VEsp_20150917 Anexos_RBT_TT_VEsp_20150917 Anexos1e2_RB_TT_VEsp_20150917 PIAção_RBT_TT_VEsp_20150917 RB_TT_VEsp_20150917 RB_TT_VEsp_20150917 Folhetos descobert-pnti gr29-vead-folh ppf6-cais-malpic-tejo pr1-idn-abutr pr6-idn-rota-do-erges Mapas Mapa1_Localização e Limites_A3 Mapa2_Divisoas Administrativas_A3 Mapa3_Zonamento_A3 Mapa4_Esp_Areas prot_A3 Mapa5_Corine_A3 Portugal Anexo3-PIAção_RB_TT_VEsp_20150917 Anexos_RBT_TT_VPort_20150917 Anexos1e2_RB_TT_VPort-Esp_20150917 PIAção_RBT_TT_VPort_20150917 RB_TT_VPort-Esp_20150917 RBT_TT_VPort_20150917 Shapefiles AP_Jul2014_PNTI Biosfera_PT_ES_" BIOSFERA_TOTAL CLC06_PT_Clip1 Conc_PNTI Cont_AAD_CAOP2015_Distritos Espana_autonomico_Clip1 Freg_PNTI LIC_reserva RNat2000_ZPE2012_PNTI toponimiaPNTI_cortada toponimiaPNTI1 ZEPA_reserva ZONA NUCLEAR_IGEOE ZONA TAMPAO_IGEOE1 ZONA TRANSICAO_IGEOE1 Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Castro Verde	10-12-2020 14-01-2021 18-02-2021	08-02-2021	Menções Biosfera Castro Verde imprensa Vídeos Biosfera application castro verde biosphere english castro verde biosfera candidatura pt english biosphere zonation map a3_annex 3_1

Participante	Reuniões	Informação disponibilizada	
		Data	Documentos
			english land use map a3_annex 3_2 mapa uso solo biosfera castro verde a3 mapa zonamento biosfera castro verde a3 Resposta ao inquérito sobre desenvolvimento económico
RB Porto Santo	03-12-2020	23-12-2020	Candidatura_da_Ilha_do_PortoSanto_pt_leve Planos PDES - Plano de Desenvolvimento Económico e Social PDM - Plano Diretor Municipal PGRH - Plano de Gestão da Região Hidrográfica da RAM PGRIRAM - Plano de Gestão de Risco de Inundações da RAM PIETRAM - Plano Integrado dos Transporte POGRAMP - Plano de Ordenamento e Gestão da Rede de Área Marinhas Protegidas do Porto Santo POT - Programa de Ordenamento Turístico da RAM POTRAM - Plano para o Ordenamento do Território da RAM PRA - Plano Regional da Água da RAM PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural da RAM PROF - RAM - Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM PRPA - Plano Regional da Política do Ambiente PUGR - Plano de Urbanização do Gofe Resort do Porto Santo PUPC - Plano de Urbanização da Frente Mar Campo de Baixo / Ponta da Calheta Fotografias_selecionadas
Comité Nacional MaB	20-11-2020	-	Participação em diversas reuniões do Projecto e 11ª reunião do Comité MaB Nacional Facilitação de contactos e informações com as Reservas da Biosfera

### 3 RESULTADOS ALCANÇADOS

Em termos globais verifica-se que, relativamente à dimensão técnica do Projeto<sup>2</sup>, a taxa global de execução, neste período de avaliação, é de 9,6%, calculada em função do peso relativo de cada atividade no orçamento global<sup>3</sup> do Projeto e do seu cronograma de execução.

De modo a permitir um acompanhamento do Projeto mais detalhado, na sequência do referido no capítulo anterior, os resultados alcançados da dimensão técnica são estruturados em dois eixos, um primeiro dedicado à execução do Projeto e um segundo dedicado à comunicação e divulgação do Projeto.


No que respeita à execução do Projeto caracterizam-se quatro temáticas, a saber:

- Atividades, quer em termos da progressão das atividades iniciadas e executadas, quer em termos de progresso de execução das atividades ativas relativamente ao seu cronograma de desenvolvimento;
- Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento, procedendo-se à identificação do número de atividades que foram ajustadas, ou que são propostas de o serem no âmbito do presente documento, em relação ao contratualizado;
- *Outputs*, onde se dá conta do número de produtos entregues;
- Indicadores de resultados, onde se apresenta o grau de concretização do Projeto relativamente às suas metas.

No tocante à comunicação e divulgação do Projeto pretende-se dar conta do número de iniciativas que foram realizadas, quer tenham sido através de edição de pequenas notícias nas redes sociais e comunicação social, como por participação em eventos onde houve a oportunidade de apresentar o Projeto, como ocorreu no âmbito da 11<sup>a</sup> reunião do Comité Nacional MaB, realizada a 20 de novembro de 2020.

De forma a permitir uma rápida leitura dos resultados alcançados os mesmos são apresentados em forma de gráficos, tal como se pode observar seguidamente.

**Figura 3.1 – Execução do Projeto. Progressão das atividades iniciadas e executadas**

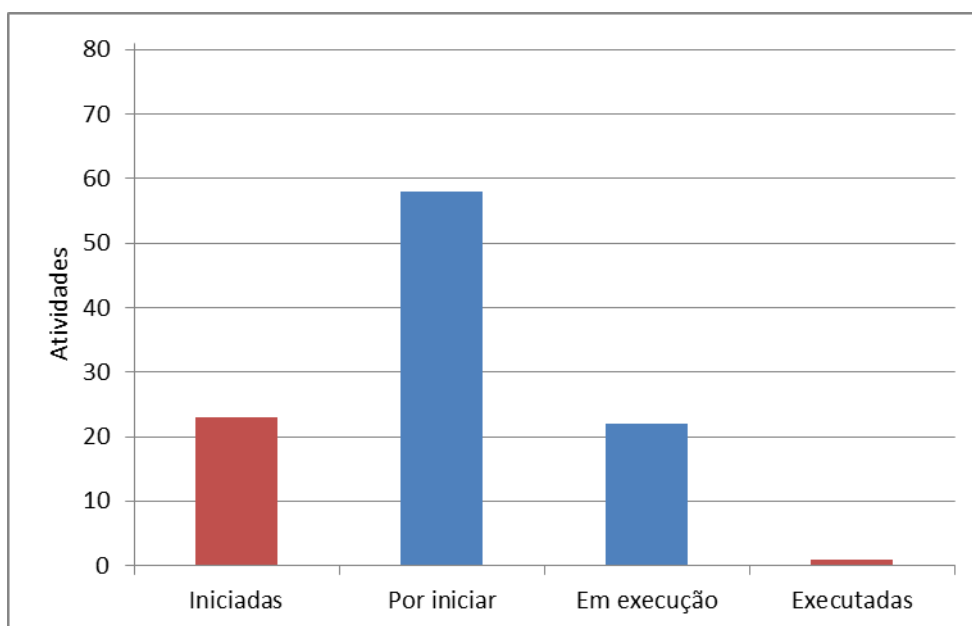


<sup>2</sup> Os resultados da execução financeira são apresentados no capítulo seguinte.

<sup>3</sup> Excluídos os custos de gestão por serem considerados transversais.


Da leitura do gráfico anterior regista-se que as atividades iniciadas entre 12 de novembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021 correspondem a 28,4% do total das atividades do Projeto, que as atividades em execução representam 27,2%, correspondendo a atividade executada a 1,2%. Por sua vez, as atividades a iniciar correspondem a 71,6% do Projeto.

**Figura 3.2 – Execução do Projeto. Progressão de execução das atividades ativas**

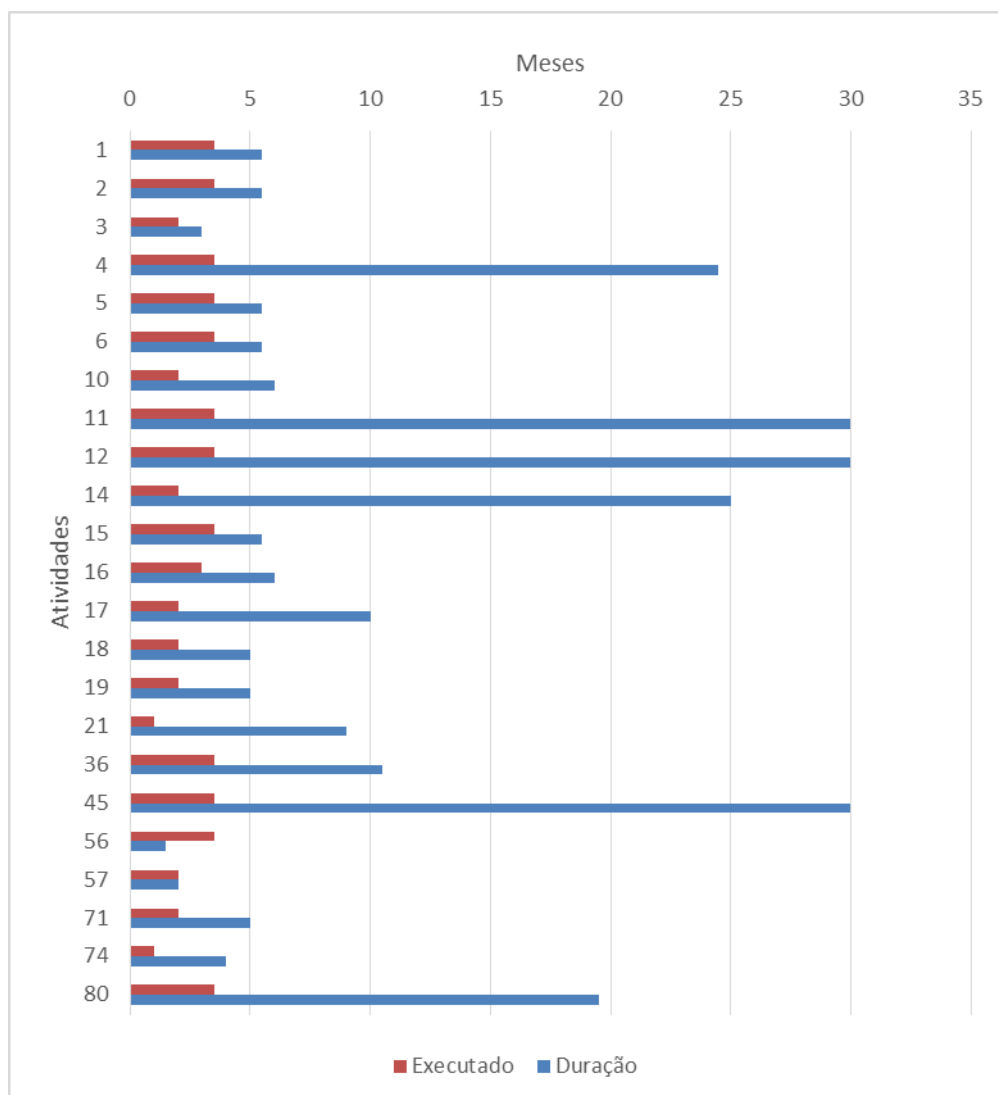


Numa leitura da progressão do cronograma de execução das próprias atividades em desenvolvimento verifica-se que todas se encontram dentro da programação contratualizada, sendo exceção a atividade ID56, atraso justificado pela impossibilidade de se efetuarem deslocações às RB devido à pandemia que, contudo, não comprometeu a entrega do relatório neste período de avaliação. No global, o tempo já dispendido corresponde a 10,86% do tempo previsto para as atividades em apreço.

**Figura 3.3 – Execução do Projeto. Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento**

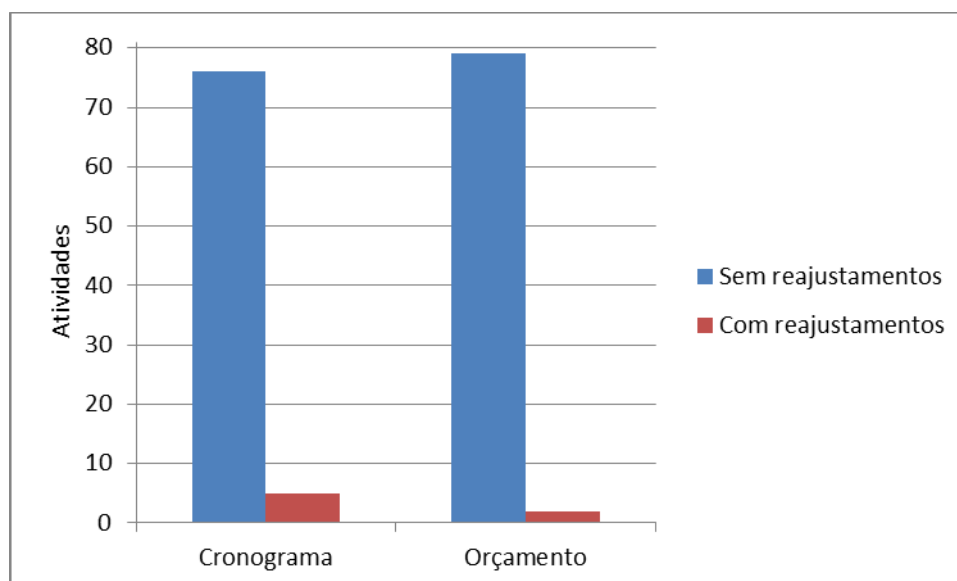


No que respeita a reajustamentos realizados em relação ao contratualizado, verifica-se ter havido a necessidade de se reorçamentar duas atividades que, como referido, se traduziram em realocação de verbas que já obtiveram a aprovação da SGA. Relativamente a ajustamentos ao cronograma inicial apresenta-se, neste documento, a proposta de reajuste temporal de cinco atividades, justificados pela pandemia e impossibilidade de deslocações às RB e pela própria data de início do Projeto e interligação entre atividades. Estes reajustamentos representam 2,5% no caso dos ajustes orçamentais e 6,2% no caso dos ajustes ao cronograma.

**Figura 3.4 – Execução do Projeto. Outputs**

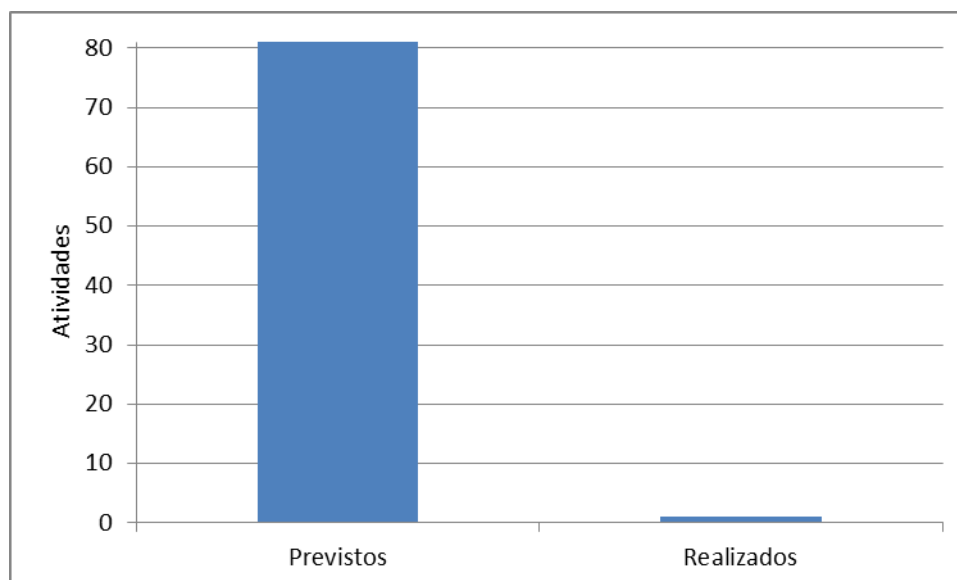


O gráfico anterior ilustra bem a fase inicial em que o Projeto se encontra neste período de avaliação, verificando-se que o produto da atividade ID56, único a ser executado, representa apenas 1,2% dos *outputs* do Projeto.

Figura 3.5 – Execução do Projeto. Indicadores de resultados

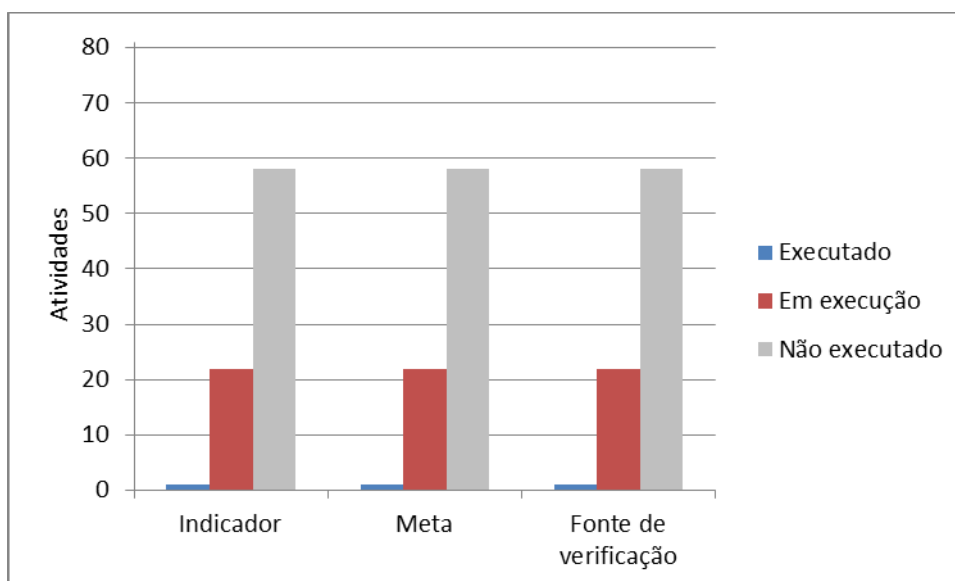

Em consonância, os indicadores de resultados refletem o referido anteriormente. É assim possível verificar que 1,2% se encontra executado, que 27,2% se encontram em execução e que 71,6% ainda não foram iniciados.

Figura 3.6 – Comunicação e divulgação do Projeto

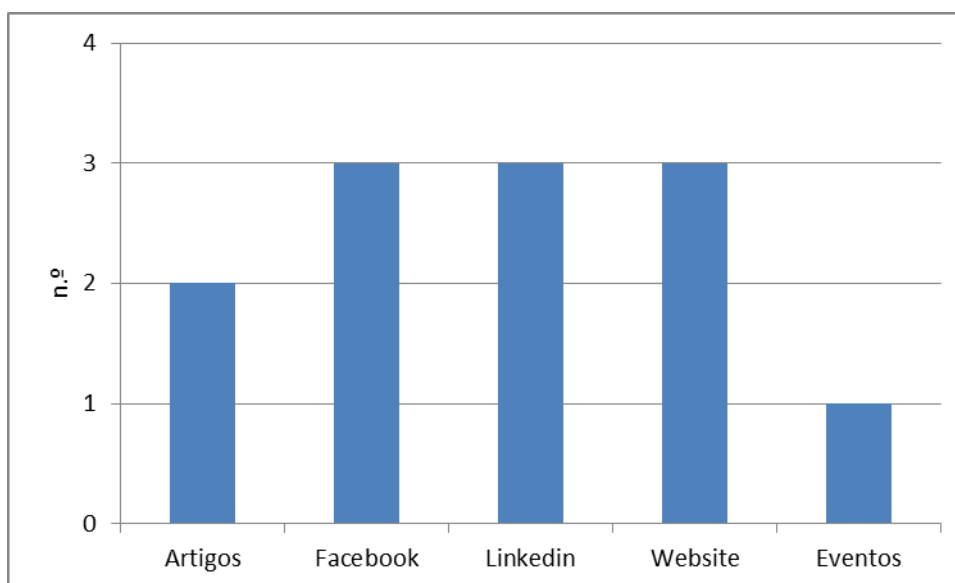

O gráfico acima ilustra o número de iniciativas que foram realizadas em termos de comunicação e divulgação do Projeto, sendo possível verificar que as mesmas se traduzem numa métrica de três ocorrências por mês.



## 4 DESCRIÇÃO DOS CUSTOS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO

Este relatório é acompanhado pelo Anexo 17 - Lista de documentos justificativos de despesa onde estão registadas todas as despesas apresentadas pelo Promotor e Parceiros, cujos documentos justificativos se anexam, e que totalizam o valor de 100.914,43€.

Em termos globais verifica-se que, relativamente às verbas previstas do Projeto, a média dos custos já executados é de 5% do valor total previsto, apresentando-se na tabela seguinte um resumo por rubrica.

**Tabela 4.1 – Progressão financeira. Custos do Projeto**

Rubrica	Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)
Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a	1 069 835,92€	78 673,77€	7%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b	293 714,25€	0,00€	0%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4	4 858,50€	518,94€	11%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2	19 007,90€	4 628,00€	24%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e	12 453,64€	0,00€	0%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f	542 057,06€	1 324,64€	0%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g	2 720,00€	34,32€	1%
Custos indiretos	254 019,18€	15 734,76€	6%

A rubrica **Custos com recursos humanos** representa cerca de 78% do total reportado neste período, principalmente devido ao maior envolvimento da Gestão nesta fase de implementação do Projeto.

Como já referido anteriormente algumas entidades não apresentaram despesa nesta rubrica por considerarem algumas das tarefas desenvolvidas até ao momento como sendo ações da competência da própria entidade, como foi o caso da Universidade Nova de Lisboa e Ordem dos Biólogos.

Ainda relativamente a esta mesma rubrica é de sinalizar que a Universidade de Coimbra devido ao atraso no processamento de contratação, não as incluiu, pelo que as despesas relativas a este período serão incluídas no próximo relatório intercalar.

Relativamente às restantes rubricas e em função da programação das atividades é de mencionar algumas situações relacionadas com a rubrica **Custos com a aquisição de serviços a terceiros** que, apesar de ter sido iniciada no período em análise, apenas originou fluxo financeiro em março pelo que as respetivas despesas farão parte do próximo relatório intercalar.

Destaca-se também o facto de um dos Parceiros, a Universidade de Bergen, ter solicitado a aplicação do ponto 4 do artigo 8.12 do documento Regulation on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021, pelo que por esse motivo a validação das despesas apresentadas realizar-se-á mediante procedimento alternativo, isto é, mediante a apresentação do Mapa de despesas certificado por um funcionário público independente.

*Página deixada propositadamente em branco*

## 5 DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS GERAIS DOS EEA GRANTS E DO PROGRAMA AMBIENTE

No âmbito dos EEA Grants 2014-2021, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, na qualidade de Doadores, financiam em 15 Estados Membros da União Europeia iniciativas e projetos que pretendem reduzir as disparidades sociais e económicas, reforçando as relações bilaterais com os estados beneficiários, sendo que, de acordo com o Memorando de Entendimento assinado com Portugal, em 2017, o Projeto em desenvolvimento enquadra-se nas áreas de “Ambiente, Energia, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono”.

De acordo com o Aviso de Concurso<sup>4</sup>, o projeto selecionado no âmbito deste aviso contribuirá para a execução do objetivo n.º 2 do ‘Programa Ambiente’ “FOMENTO DE MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS RESERVAS DA BIOSFERA PORTUGUESAS.” e do respetivo Output 2.1 “Capacidade de gestão das Reservas da Biosfera aumentada”, através do desenvolvimento de várias tipologias de ações e materiais que servirão de ferramentas de trabalho para uma melhor gestão e implementação das Reservas da Biosfera no território (...).

Na tabela seguinte descrevem-se os indicadores e as metas para os quais o projeto a financiar irá contribuir.

Tabela 5.1 – Programa Ambiente, indicadores e metas

Área Programática (PA)   Objetivo	Resultado esperado	Indicador	Unidade de medida	Fonte de Verificação	Frequência de Reporte	Valor de base	Ano Base	Meta
PA11 Objetivo 2	FOMENTO DE MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS RESERVAS DA BIOSFERA	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Anual (APR)	0	N/A	314967
Output 2.1	Capacidade de gestão das Reservas da Biosfera aumentada.	Número de Reservas da Biosfera onde as medidas foram implementadas.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	6
		Número de profissionais treinados (desagregado por género).	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	22
		Número de planos de desenvolvimento sustentável para Reservas da Biosfera desenvolvidos.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	11

Fonte: Secretaria Geral do Ambiente e da Ação Climática, 2019. Aviso #3 – Projetos para o fomento de modelos de desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas

<sup>4</sup> Secretaria Geral do Ambiente e da Ação Climática, 2019. Aviso #3 – Projetos para o fomento de modelos de desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas

Destaca-se, ainda, do Aviso de Concurso que os grandes desafios que se colocam às Reservas da Biosfera portuguesas são o conhecimento do seu significado e da importância da sua existência, o aumento da sua visibilidade, a necessidade de utilizar novas formas de comunicar, o reforço do envolvimento de todos os atores locais e a promoção da qualidade e atratividade destes territórios. Neste contexto, o Conhecimento, a Capacitação e a Comunicação são os três domínios essenciais à afirmação da identidade das Reservas da Biosfera no sentido de:

- a) Valorizar os territórios que constituem as Reservas da Biosfera como laboratórios vivos de sustentabilidade, promovendo a qualidade de vida dos seus habitantes;
- b) Aumentar a visibilidade, o conhecimento e a capacidade de gestão destes espaços através de instrumentos que promovam a afirmação e a identidade dos 11 territórios classificados como Reservas da Biosfera.

Em resposta ao enunciado, no âmbito da candidatura apresentada, a proposta desenvolvida refere no ponto sobre a demonstração da coerência entre os objetivos, atividades, resultados e impactos esperados (Parte C), o seguinte:

*O projeto está organizado por forma a articular os eixos prioritários do conhecimento, capacitação e comunicação, numa abordagem estratégica coletiva e orientada para a valorização do conjunto dos territórios das Reservas da Biosfera (RB), entendidos como laboratórios vivos de sustentabilidade e modelos da Agenda 2030 e dos seus ODS, visando promover uma maior visibilidade nacional e internacional, e dinamizar um plano de capacitação inovador, abrangente e dirigido à qualidade de vida e prosperidade das comunidades.*

*O racional estratégico dos Planos de Desenvolvimento Sustentável das RB, entendidos como instrumentos de reforço e inovação das estratégias locais de desenvolvimento sustentável, estruturam-se com base nas iniciativas relacionadas com o mapeamento, priorização e valoração dos serviços dos ecossistemas, numa aposta no conhecimento, com o apoio do sistema científico e tecnológico nacional e redes internacionais, incorporando o saber transmitido pelas comunidades. As iniciativas relacionadas com o registo e valorização das memórias das comunidades e dos territórios, contarão com a participação ativa dos atores locais, e serão fundamentais para fomentar uma maior apropriação identitária - os territórios e os seus recursos -, e gerar oportunidades para a economia local. A valorização da identidade e dos recursos endógenos, numa leitura harmoniosa e sinérgica do Homem (cultura) e da Natureza, garante a promoção efetiva dos valores percecionados pelas comunidades e pelos agentes económicos.*

*As iniciativas associadas à criação e desenvolvimento de uma plataforma digital única e versátil, constituirá desde logo uma interface de comunicação e interação privilegiada entre as RB (redes nacional e internacionais), com as populações e com o público em geral. Esta ferramenta de gestão, diálogo e informação terá múltiplas valências, registando a informação coletiva das RB, apoiando o desenvolvimento e monitorização de ações piloto de economia e comércio local e ainda a promoção turística das RB. Permitirá ainda potenciar a capacitação e o conhecimento através de dinâmicas de ciência aberta e ciência cidadã, tornando mais operacional o desígnio de laboratório vivo de sustentabilidade.*

*As iniciativas associadas ao eixo de capacitação, estão inscritas num plano global e coerente, dirigido a todas as RB, e destinam-se aos técnicos, administradores, comunidades, e promotores da economia local. Visam corresponder aos interesses e expectativas das RB e serão asseguradas pelas universidades envolvidas, com o apoio das 3 cátedras Unesco e pelo sistema científico e tecnológico que será chamado a colaborar em iniciativas complementares. A abordagem proposta no domínio da capacitação visa melhorar as competências e as práticas de gestão e cooperação das RB, individualmente e em rede, e ligadas a domínios suscetíveis de impulsionar a economia local, desde o turismo sustentável ao empreendedorismo, com a valorização e promoção dos recursos endógenos dos territórios.*

*O plano global de comunicação proposto para as RB nacionais, visa o reforço da sua visibilidade e uma articulação mais eficaz das iniciativas de promoção da rede de RB, e o fomento das oportunidades de cooperação nacional e internacional. Propõe-se um plano de sensibilização dirigido às populações e aos atores de desenvolvimento local para a importância das RB que no sector escolar se corporiza nas Olimpíadas da Biologia complementado pela criação dos cuidadores das RB.*

*A enorme experiência da coordenação do projeto assegura uma maior visibilidade e presença das RB portuguesas na rede Mundial de RB da UNESCO por via da cooperação com a Noruega e Islândia, o IberoMaB e CPLP, e com a participação ativa de vários peritos internacionais.*

Este preâmbulo, que por si só é demonstrativo do alinhamento do Projeto com os objetivos do EEA Grants e com os grandes desafios lançados às Reservas da Biosfera, foi depois detalhado por atividade, fazendo-se a correspondência com o indicador específico do Programa Ambiente para o qual cada atividade contribui de forma mais direta. A tabela seguinte traduz essa relação para as atividades em avaliação no presente relatório.

**Tabela 5.2 – Relação de cada atividade com os indicadores previstos no Programa Ambiente**

ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
4	História das Reservas da Biosfera	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (íntegra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram

ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
		implementadas
57	Conceção do Plano de Comunicação	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
80	Extensão do conhecimento	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera

Fonte: Candidatura 09/Call#3, maio 2020. Parte C.

Da leitura da tabela anterior, verifica-se que as atividades do Projeto já iniciadas, só não possuem relação com o indicador “número de profissionais treinados (desagregados por género)”. Pode-se igualmente verificar que das 23 atividades em apreço, 12 já estão a contribuir para o indicador “número do planos de desenvolvimento sustentável para as reservas da biosfera desenvolvidos”, 8 para o indicador “número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas” e 3 para o indicador “número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera”.

Contudo, nesta fase, ainda inicial do projeto, não é possível efetuar uma avaliação efetiva do contributo do trabalho já efetuado para as metas estabelecidas. De facto, as tarefas até agora em elaboração são essencialmente, como ficou referido em 2.2, de contactos iniciais com as RB e de recolha e sistematização de informação, de definição de metodologias de abordagem, etc., não se concretizando, ainda, nos indicadores estabelecidos, mas contribuindo para o seu alcance.

## A. Fichas das atividades

---

*Página deixada propositadamente em branco*



ID	Designação da atividade	Início	Fim
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)	12/11/2020	30/04/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Apresentação do Projeto - reuniões com as RB	QP	02-12-2020 - RB Insulares
		03-12-2020 - RB Continentais
		10-02-2020 - RB Transfronteiriças
Identificação da informação de base a solicitar e envio de pedido	QP	-
Sistematização da informação recebida – elaboração de ficha síntese por RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Troca de informações	Ata Registo efetuado no ficheiro “Registo_eventos” Informação disponibilizada na drive do Projeto
Diversa informação recebida	Registo efetuado no ficheiro “Infomecebida_controlo” Informação disponibilizada na drive do Projeto

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Promoção da reunião “think tank”
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

## Progressão financeira

### Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 680,00€	3 882,20€	82,95%	3 882,20€	82,95%

### Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
56,00€	35,64€	63,64%	35,64€	63,64%

### Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB	12/11/2020	30/04/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Reuniões de trabalho com as RB	QP   UC; UNL-FCSH	04-02-2021 - RB Berlengas
	QP   UC	10-02-2021 – RBT Tejo/ Tajo Internacional
	QP   UC; UNL-FCSH	16-02-2021 – RBT Gerês/ Xurés
	QP   UC; UNL-FCSH; Keep	18-02-2021 – RB Castro Verde
	QP   UC; UNL-FCSH; Keep	18-02-2021 – RBT Meseta Ibérica
	QP   UC; UNL-FCSH; Keep	22-02-2021 – RB Insulares
Sistematização da informação recebida – elaboração de ficha síntese por RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Troca de informações; alimentação das bases de dados do Projeto	Ata Registo efetuado no ficheiro “Registo_eventos” Informação disponibilizada na drive do Projeto
Diversa informação recebida	Registo efetuado no ficheiro “Inforecebida_controlo” Informação disponibilizada na drive do Projeto

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Reunião com a RB Paul do Boquilobo	Motivos pessoais do gestor da RB	Agendamento da reunião para meados de abril
Deslocações às RB	Pandemia	Contactos online Reorçamentação

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Promoção da reunião com a RB Paul do Boquilobo
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
13 860,00€	11 311,00€	81,61%	11 311,00€	81,61%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev..2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
110,00€	70,00€	63,64%	70,00€	63,64%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev..2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev..2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO	01/01/2021	31/03/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB para identificação dos modelos de gestão, visão e prioridades, casos de estudos/ projetos/ experiências	QP	-
Consulta de sítios da internet oficiais para enquadramento das RB portuguesas na Rede Mundial das Reservas da Biosfera da UNESCO	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório do Contexto Geoestratégico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de Relatório de Enquadramento Geoestratégico

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 000,00€	2 101,62€	26,27%	2 101,62€	26,27%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
88,00€	58,67€	66,67%	58,67€	66,67%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
4	História das Reservas da Biosfera	12/11/2020	01/11/2022

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Elaboração de roteiro de investigação: identificação de arquivos e acervos	UNL-FCSH	-
Levantamento/diagnóstico do histórico e função das RB – consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB	UNL-FCSH	-
Participação em reuniões introdutórias com as RB	QP  UNL-FCSH; UC; Keep	04-02-2021 - RB Berlengas 16-02-2021 – RBT Gerês/ Xurés 18-02-2021 – RB Castro Verde 18-02-2021 – RBT Meseta Ibérica 22-02-2021 – RB Insulares
Realização de pesquisa bibliográfica em repositórios de teses e artigos científicos sobre produção científica realizada no âmbito das RB	UNL-FCSH	-
Elaboração de Guião de Entrevistas aos Gestores das RB	UNL-FCSH	-
Lançamento de edital e processo de contratação de duas investigadoras	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Documento de parametrização para introdução e sistematização da informação recolhida	Documento
Guião das entrevistas	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Deslocações às RB	Impossibilidade de deslocação em contexto de pandemia	Contactos online

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Publicações		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 568,00€	1 003,00€	10,48%	1 003,00€	10,48%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 900,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 840,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



ID	Designação da atividade	Início	Fim
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto	12/11/2020	30/04/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Auscultação dos parceiros com vista à identificação dos dados	UNL_FCSH   QP; UC; IPN; Keep	
Definição de uma estratégia e cronograma com base na análise dos dados recolhidos, tendo em conta questões tipológicas	UNL_FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Documento de parametrização para introdução e sistematização da informação recolhida	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Disponibilização do Plano de Gestão de Dados		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Conclusão da realização das tarefas em curso
		Elaboração de uma proposta de documento com vista à recolha de contributos dos parceiros

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	12/11/2020	30/04/2021

### Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Análise de informação acerca do património vernacular cultural e natural constante da documentação consultada (candidaturas, relatórios, entrevistas)	UNL-FCSH	
Consulta e análise dos questionários elaborados pelos parceiros	UNL-FCSH	
Preparação de inquérito acerca da perceção, identificação e caracterização do património vernacular cultural e natural a dirigir às Reservas e entidades locais	UNL-FCSH	
Lançamento de edital e processo de contratação de duas investigadoras	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Documento de parametrização para introdução e sistematização da informação recolhida	Documento
Inquérito	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Deslocações às RB	Impossibilidade de deslocação em contexto de pandemia	Contactos online

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Inquéritos aplicados		x	
Meta	300		x	
Fonte de verificação	Relatório de Análise		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 480,00	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
10	Infraestrutura Digital - Modelo de gestão distribuída	01/01/2021	30/06/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Análise de necessidades a partir da identificação tipológica dos dados recolhidos e a gerar pelo projeto	UNL-FCSH   UC	
Desenho de necessidades técnicas a partir de diagnóstico previamente realizado	UNL-FCSH	
Reuniões com parceiros tecnológicos	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Documento com identificação e caracterização de dados a recolher e gerar pelo projeto	Documento
Sistematização da informação recebida dos parceiros tecnológicos	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Orientação/ Manual de procedimentos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de relatório orientador e de manual de procedimentos

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	12/11/2020	11/05/2023

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Participação em reunião de parceiros – análise de benchmark internacional	UNL-FCSH   QP	
Proposta de estrutura com vista à elaboração da versão beta do website de apresentação, valorização e promoção das reservas da biosfera no seu conjunto	UNL-FCSH	
Reunião com webdesigner para avaliar hipóteses de execução	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Informação acerca de hipóteses de layout, organização de conteúdos e usabilidade	Documento
Estrutura de website (proposta)	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lançamento de Website		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso.
		Recolha de contributos dos parceiros.
		Discussão de proposta com base em protótipo de website (wireframes).

## Progressão financeira

### Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
64 575,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

### Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



ID	Designação da atividade	Início	Fim
12	Infraestrutura Digital - Dashboard de gestão de indicadores	12/11/2020	11/05/2023

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Levantamento de informação para seleção de indicadores	UNL-FCSH   UC	
Identificação de plataformas e infraestruturas científicas para recolha de indicadores - dados	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Organização e sistematização da informação recolhida	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Disponibilização de dashboard de indicadores		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
24 600,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	01/01/2021	30/01/2023

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Mapeamento e caracterização do património cultural e natural associado a cada Reserva e desenvolvimento de investigação junto de arquivos, bibliotecas, outros recursos locais e nacionais (documentação, objetos, fotografias e outras coleções).	UNL-FCSH	
Organização, tratamento e produção de conteúdos para divulgação nas plataformas e canais do projeto, salientando-se a criação de guias/roteiros do património natural das RB. Os resultados da atividade articulam com as ações relacionadas com a preparação e desenvolvimentos dos PDS, bem como com a preparação de Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Documento de parametrização para introdução e sistematização da informação recolhida.	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Deslocações a arquivos e a bibliotecas	Impossibilidade de deslocação em contexto de pandemia	Consulta online

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Guias/ roteiros realizados		x	
Meta	15		x	
Fonte de verificação	Website ou Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Mapeamento/ roteiro de fontes e documentos

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 568,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
15	Mapeamento da diversidade de ecossistemas das RB	12/11/2020	30/04/2021

### Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Reunião de arranque interna	CFE-UC	
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	
Análise da informação relativa às Reservas da Biosfera compilada na Act. 1	CFE-UC	
Elaboração da base de dados SIG e download de todas as informações cartográficas disponíveis: COS, Áreas protegidas, Imagens de satélite, etc	CFE-UC   Universidade de Bergen	
Identificação e download de informação espacialmente explícita (mapas, cartografia, dados de satélite) para obter proxies de diversidade, e variáveis relacionadas com a capacidade potencial dos ecossistemas em fornecerem diferentes serviços dos ecossistemas	CFE-UC   Universidade de Bergen	

Resultados obtidos	Evidências
Definição da estratégia de execução da atividade e interligação entre os elementos da equipa na execução das tarefas planeadas	Pdf da apresentação da reunião Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) <a href="https://drive.google.com/file/d/1s96nH8hfLz9amvu2xRJNAsJrEgdfu9Pw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1s96nH8hfLz9amvu2xRJNAsJrEgdfu9Pw/view?usp=sharing</a>
Estrutura de definição dos ecossistemas das RBs	Excel "MAES-EUNIS (under development)" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) <a href="https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxyZI5RG7MoksqL8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxyZI5RG7MoksqL8/view?usp=sharing</a>
Identificação das informações cartográficas e dados espacialmente explícitos incluídos na GIS database	Excel "Weighting factors (under development)" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) <a href="https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxyZI5RG7MoksqL8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxyZI5RG7MoksqL8/view?usp=sharing</a>

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma de atividade	Atendendo à data de início efetivo do projeto, e à interligação desta atividade a atividades comuns a todo o consórcio de compilação da informação, e ao tempo necessário para os processos de contratação de recursos humanos, considerou-se necessário adiar a sua conclusão.	Adiar a conclusão da Act. nº 15 para 30 de junho de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Mapas de composição de ecossistemas / habitats		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de Relatório de Atividades

## Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 261,82€	* Não é possível apurar o valor dos RH por atraso no processo de contratação, pelo que se reporta em substituição os PM (pessoa-mês) de cada investigador contratado: Jorge Durán Humia – Dezembro: 0,57PM; Janeiro: 0,50 PM; Fevereiro: 0,50 Catarina Fernandes Moura - Dezembro: 0,26PM; Janeiro: 0,20 PM; Fevereiro: 0,15			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 628,00€	4 628,00€	100,00%	4 628,00€	100,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev..2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

## Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	901,75€	35,15%	901,75€	35,15%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 985,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	v
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



ID	Designação da atividade	Início	Fim
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	01/12./2021	31/05/2021

### Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Reunião geral de equipa	CFE-UC   Universidade de Bergen	
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	
Análise da estrutura analítica do MAES, CICES e IPBES	CFE-UC	
Identificação dos serviços dos ecossistemas potenciais associados a cada habitat EUNIS em termos gerais	CFE-UC   Universidade de Bergen	

Resultados obtidos	Evidências
Definição da estratégia de execução da atividade e interligação entre os elementos da equipa na execução das tarefas planeadas	<p>PDF da apresentação da reunião</p> <p>Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências)</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1QvCB8LqkeNOh6i02HlfD4TVFwBe2gwt/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1QvCB8LqkeNOh6i02HlfD4TVFwBe2gwt/view?usp=sharing</a></p>
Estrutura analítica do MAES	<p>Excel "MAES-EUNIS (under development)"</p> <p>Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências)</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxYZI5RG7Moksql8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxYZI5RG7Moksql8/view?usp=sharing</a></p>
Lista de serviços de ecossistemas potenciais providenciados por cada habitat EUNIS segundo a estrutura analítica do MAES	<p>Excel "MAES-EUNIS (under development)"</p> <p>Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências)</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxYZI5RG7Moksql8/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Lkx4eg98FFmjcsPcqxYZI5RG7Moksql8/view?usp=sharing</a></p>

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma de atividade	Atendendo à data início do projeto, e à interligação desta atividade à atividade 15, e ao tempo necessário para os processos de contratação de recursos humanos, considerou-se necessário adiar o início desta atividade e a sua finalização.	Adiar o início da Act. Nº 16 para 1 de janeiro de 2021 e a conclusão para 31 de julho de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de serviços de ecossistema potenciais		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
1 jan 2021 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso e planeadas

## Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 698,42€	* Não é possível apurar o valor dos RH por atraso no processo de contratação, pelo que se reporta em substituição os PM (pessoa-mês) de cada investigador contratado: Jorge Durán Humia – Janeiro: 0,50 PM; Fevereiro: 0,50PM Catarina Fernandes Moura - Janeiro: 0,25 PM; Fevereiro: 0,30PM			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

## Progressão financeira – Universidade de Bergen

### Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	901,75€	35,15%	901,75€	35,15%

### Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

*Página deixada propositadamente em branco*

ID	Designação da atividade	Início	Fim
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	01/01/2021	31/10/2021

### Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB e demais informação recebida	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Tomada de conhecimento da informação disponível	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização da tarefa em curso
		Pesquisa de informação
		Realização de entrevistas e inquérito on-line

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 254,50€	252,08€	4,03%	252,08€	4,03%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 283,80	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
80,00	16,00€	20,00%	16,00€	20,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas Reservas da Biosfera (RB)	01/01/2021	30/06/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Elaboração de um questionário com o objetivo de conhecer as principais características de cada RB e identificar os atores locais de cada RB mais qualificados / predispostos a explorar as oportunidades de conservação e uso sustentável dos recursos nos territórios.	IPN   António Domingos Abreu (Quatenaire Portugal) – Revisão do Questionário	
O questionário foi enviado para 11 RB, acompanhado por um email onde se explicavam os objetivos desta recolha de informação e se agradecia a colaboração das RB.	IPN	
10 BR responderam ao questionário	IPN	RB Paul do Boquilobo, RB Ilha do Corvo, RB Ilha da Graciosa, RB Ilha das Flores, RBT Gerês/ Xúres, RB Berlengas, RB Santana, RBT Meseta Ibérica, RB Fajãs de São Jorge e RBT Tejo/ Tajo Internacional
A informação recolhida foi analisada e foi elaborado um relatório com as respostas obtidas.	IPN	

Resultados obtidos	Evidências
Questionário	Questões, respostas, relatório O Questionário está disponível na drive do Projeto na pasta "Info_base/Inqueritos"

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

## Relatório Intercalar n.º 1

09\_CALL#3 - Reservas da Biosfera: territórios sustentáveis, comunidades resilientes

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 572,53€	6 083,77€	32,76%	6 083,77€	32,76%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
953,52€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



ID	Designação da atividade	Início	Fim
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	01/01/2021	30/06/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Pesquisa exploratória para identificar as melhores práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável.	IPN	

Resultados obtidos	Evidências
Documento de trabalho	Documento de trabalho em fase inicial de preparação onde se começaram a identificar boas práticas (I&DT, Inovação e Empreendedorismo)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso e serão iniciadas novas tarefas
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 572,53€	311,95€	1,68%	311,95€	1,68%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
953,52 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	01/02/2021	31/10/2021

### Progressão técnica – Universidade de Coimbra, Universidade de Bergen e Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Reunião geral de equipa	CFE-UC	
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	
Identificação de aspetos identitários, objetivos e prioridades das RB (em curso)	CFE-UC	
Desenvolvimento da metodologia multi-ator para identificação de SE chave (em curso)	CFE-UC   Universidade de Bergen	
Elaboração de questionários (em curso)	CFE-UC   Universidade de Bergen	

Resultados obtidos	Evidências
Definição da estratégia de execução da atividade e interligação entre os elementos da equipa na execução das tarefas planeadas	<p>Pdf da apresentação da reunião</p> <p>Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências)</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1Goxqirg5s4UwqgurgZJQW4JPPzvg0CTb/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Goxqirg5s4UwqgurgZJQW4JPPzvg0CTb/view?usp=sharing</a></p>
Questionário para as equipas de coordenação das RB	<p>Questionário em google forms disponível no seguinte link:</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/1rQDMUMtFZEtuixALulfjQHLIEyzopHnW7GD35EHZGmM/edit">https://docs.google.com/forms/d/1rQDMUMtFZEtuixALulfjQHLIEyzopHnW7GD35EHZGmM/edit</a></p>

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma de atividade	Atendendo à data início do projeto, e à interligação desta atividade à atividade 16, e ao tempo necessário para os processos de contratação de recursos humanos, considerou-se necessário adiar o início desta atividade e a sua finalização.	Adiar o início da Act. Nº 21 para 1 de março de 2021 e a conclusão para 30 de novembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de serviços de ecossistema chave para as RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

## Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 638,68€	* Não é possível apurar o valor dos RH por atraso no processo de contratação			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
23 141,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev..2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 100,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

## Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 832,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 045,52€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	v
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

## Progressão financeira – Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	v
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 - 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)	12/11/2020	30/09/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Preparação e agendamento de entrevistas com os responsáveis das RB	UNL-FCSH   Keep	
Lançamento de edital e processo de contratação de duas investigadoras	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Convite à recolha e partilha de testemunhos e memórias – envolvimento de parceiros locais	Impossibilidade de deslocação em contexto de pandemia	Atividades online e concentração meses
Apresentação local do projeto de registo de memórias a Reservas e Comunidades – ações de sensibilização e demonstração.		
Planificação da realização dos Dias da memória das RB		

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Entrevistas realizadas		x	
Meta	165		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Convite à recolha de memórias
		Apresentação local do projeto de registo de memórias
		Realização de Dias da Memória

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 568,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
53 625,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 429,90	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
44 157,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



ID	Designação da atividade	Início	Fim
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	12/11/2020	11/04/2023

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Levantamento/diagnóstico das atividades desenvolvidas nas RB - consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB	QP	-
Participação em reuniões de trabalho com as RB	QP   UC; UNL-FCSH	04-02-2021 - RB Berlengas
	QP   UC	10-02-2021 - RB Tejo/ Tajo Internacional
	QP   UC; UNL-FCSH	16-02-2021 - RB Gerês
	QP   UC; UNL-FCSH; Keep	18-02-2021 - RB Castro Verde
	QP   UC; UNL-FCSH; Keep	18-02-2021 - RB Meseta Ibérica
	QP   UC; UNL-FCSH; Keep	22-02-2021 - RB das Regiões Autónomas
Análise de benchmarking sobre as RB com o objetivo de analisar as melhores práticas utilizadas nas RB mundiais, nomeadamente ao nível da sustentabilidade e de sistemas de certificação em turismo sustentável	QP	-
Elaboração de um inquérito sobre Turismo nas RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Diversa informação recolhida através da consulta de documentação enviada pelas RB	Compilação da informação consultada
Informação recolhida através da análise de benchmark em curso	Registos em formato Excel sobre a análise de benchmark
Inquérito sobre Turismo nas RB	Formulário do inquérito

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Deslocações às RB para inventários e entrevistas	Pandemia	Contactos online

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Referencial e respetivo quadro normativo		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório Referencial Normativo e Manuais de Boas Práticas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Deslocações às RB

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 064,14	3 337,45	27,66%	3 337,45	27,66%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 422,18	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	12/11/2020	31/12/2020

### Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Enquadramento do projeto com equipa coordenadora	PC&A	-
Seleção de parceiros da equipa operacional permanente do projeto	PC&A	-
Estrutura e metodologia de trabalho	PC&A	
Reuniões de contacto e partilha do projeto de comunicação com as 11 RB	PC&A	19-11-2020 - RB Paul Boquilobo 12-01-2021 - RB Ilha da Graciosa 13-01-2021 - RB Berlengas 13-01-2021 - RB Ilha do Corvo 14-01-2021 - RB Tejo/ Tajo Internacional 14-01-2021 - RB Castro Verde 14-01-2021 - RB Fajãs São Jorge 15-01-2021 - RB Meseta Ibérica 19-01-2021 - RB Gerês/ Xúres 19-01-2021 - RB Boquilobo 25-01-2021 - RB Ilha das Flores 24-02-2021 - RB Santana
Recolha e análise dos contributos das RB para o plano de comunicação	PC&A	27-2-2021
Reuniões individuais com cada parceiro para partilha de ações de comunicação	PC&A   Parceiros	18-11-2020 – QP 20-01-2021 – QP 20-01-2021 – IPN 22-01-2021 – UC-CFE 25-01-2021 – UNL_FCSH e Keep 01-02-2021 – UNL_FCSH e Keep 08-02-2021 – UNL_FCSH e Keep 11-02-2021 – OBio 19-02-2021 - QP
Análise de benchmarking de outras RB e fontes de informação Oficiais para definição da estratégia	PC&A	-
Elaboração do documento da Estratégia de Marketing	PC&A	-
Reuniões de Mecanismo e Programa	PC&A   Parceiro	26-11-2020 – EEA Grants 14-01-2021 – EEA Grants

Resultados obtidos	Evidências
Documento de Estratégia de Marketing	Registo no ficheiro "Index"
Diversa informação recebida	Informação disponibilizada na drive do Projeto (info_recebida/parceiros)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Deslocações às RB	Pandemia	Contactos online Reagendamento das deslocações
Revisão do Relatório da Estratégia de Marketing	Na sequência das visitas às RB previstas na atividade, é previsível surgir a necessidade de rever o documento entregue	Prolongar a atividade até 31 de julho de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório da Estratégia de Marketing	x		

Observações: Considera-se que com a entrega do relatório da Estratégia de Marketing o indicador e a meta se encontram executados, apesar da previsível necessidade de se rever o documento após as visitas às RB.

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Executado	Em revisão	Visitas às RB assim que possível face à pandemia (previstas para o 2º trimestre)
		Revisão do Relatório da Estratégia de Marketing

## Progressão financeira

### Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 275,00€	6 922,63€	83,66%	6 922,63€	83,66%
Nota: Parte das horas previstas transita para 2º trimestre por impossibilidade de visitas as Reservas da Biosfera devido à pandemia				

### Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 944,36€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Transita para 2º trimestre por impossibilidade de visitas as Reservas da Biosfera devido à pandemia				

### Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

### Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 000,00€				
Nota: O recurso a serviços de terceiros foi realizado na sua plenitude face ao orçamento. Contudo, os respetivos pagamentos e documentação de suporte ocorreram no mês de março de 2021. Constarão do próximo relatório				

### Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

*Página deixada propositadamente em branco*

ID	Designação da atividade	Início	Fim
57	Conceção do Plano de Comunicação	01/01/2021	28/02/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Identificação das fases do Plano de Comunicação	PC&A	-
Recolha e análise do contributo das RB para o plano de comunicação	PC&A	-
Recolha e análise do contributo dos Parceiros para o plano de comunicação	PC&A	-
Criação de uma identidade visual para o projeto	PC&A	-
Criação do manual de normas gráficas da identidade visual do projeto	PC&A	-
Apresentação das normas gráficas do projeto	PC&A	14-01-2021 – EEA Grants
Redação da versão draft do Plano de Comunicação	PC&A	-

Resultados obtidos	Evidências
Documento de Estratégia de Comunicação (versão draft)	Registo no ficheiro "Index"
Diversa informação recebida	Informação disponibilizada na drive do Projeto (Info_recebida/Parceiros)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Deslocações às RB	Pandemia	Contactos online Reagendamento das deslocações
Reprogramação da atividade	Necessidade de se efetuarem visitas às RB	Adiar a conclusão da atividade para 30 de junho de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Plano de Comunicação		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Visitas às RB assim que possível face à pandemia (previstas para o 2º trimestre)
		Elaboração e edição do Plano de Comunicação

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 612,50€	3 239,75€	57,72%	3 239,75€	57,72%
Nota: Parte das horas previstas transita para 2º trimestre por impossibilidade de visitas as Reservas da Biosfera devido à pandemia				
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 829,75€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Transita para 2º trimestre por impossibilidade de visitas as Reservas da Biosfera devido à pandemia				
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 000,00€	Nota: O recurso a serviços de terceiros foi realizado na sua plenitude face ao orçamento. Contudo, os respetivos pagamentos e documentação de suporte ocorreram no mês de março de 2021. Constarão do próximo relatório			
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



ID	Designação da atividade	Início	Fim
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	01/01/2021	30/06/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB e demais informação recebida	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Tomada de conhecimento das práticas locais ao nível da sensibilização e educação ambiental	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório do Plano de Sensibilização		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Recolha e análise documental
		Afinação metodológica
		Elaboração dos instrumentos de recolha de informação práticas locais ao nível da sensibilização e educação ambiental (guiões de entrevista com especialistas em comunicação de ciência nas reservas)
		Elaboração e edição de relatório Plano de Sensibilização

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 228,30	64,29€	5,23%	64,29€	5,23%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	01/02/2021	31/05/2021

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Reuniões preparatórias do Regulamento das Olimpíadas das RB	OBio	-
Reuniões de preparação de conteúdos para o website	OBio	-
Preparação de abertura do concurso para a construção do site	OBio	-
		-

Resultados obtidos	Evidências
Afinação metodológica em termos de condições de inscrição; número de participantes por equipa; tipo de provas a realizar; locais de realização das eliminatórias; logística e suporte informático; etc.	.

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Contratação de bolseiro (final de 2021 e início de 2022)	Melhor aproveitamento dos recursos humanos previstos no Projeto	Pedido de realocação de verbas em abril

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Olimpíadas das RB realizada		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Inscrição efetuadas de alunos e de escolas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev. 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Elaboração do Regulamento das Olimpíadas das RB
		Lançamento do concurso para a construção do site

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 581,67€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID	Designação da atividade	Início	Fim
80	Extensão do conhecimento	12/11/2020	30/05/2022

## Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor   envolvidos	Participantes
Levantamento/diagnóstico das atividades desenvolvidas nas RB - consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB	KEEP	-
Participação em reuniões introdutórias com as RB	QP   KEEP, UC, UNL-FCSH	16-02-2021 – RB Gerês/ Xúres 18-02-2021 – RB Castro Verde 18-02-2021 – RB Meseta Ibérica
Realização de contactos com todos os responsáveis das RB com vista à recolha de informação acerca das atividades das RB.	KEEP	Todos os responsáveis das RB
Participação na elaboração do guião de entrevistas a realizar com responsáveis das RB. Os registos dos testemunhos constituirão fontes fundamentais para a futura elaboração de uma estratégia integrada de extensão e envolvimento.	UNL-FCSH   KEEP	-

Resultados obtidos	Evidências
Diversa informação recolhida	Elaboração de documento parametrizado onde se introduz e sistematiza a informação recolhida.

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Agendamento de entrevistas	Pendente resposta dos responsáveis das RB: Ilha das Flores, Paul do Boquilobo, Tejo/ Tajo Internacional e Berlengas.	Aguarda resposta
Deslocações às RB	Pandemia	Contactos online

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Ações de formação		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
12 nov 2020 – 28 fev 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 mar 2021 – 30 jun 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Benchmark internacional
		Discussão em sede de Comité Nacional MaB envolvendo todas as RB

## Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. .2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
27 000,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 410,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 400,00€	Nota: a execução no período em avaliação só foi concretizada em março			
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 12 nov. 2020 – 28 fev. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

*Página deixada propositadamente em branco*

## Parceria e Equipa



### Promotor

Quatenaire Portugal.  
Rua Tomás Ribeiro n.º 412 - 2º andar 4450-295  
Matosinhos  
Rua Duque de Palmela n.º 25 - 2º andar 1250-097 Lisboa  
Tel. (+351) 229 399 159 / (+351) 213 513 200  
Email [geral@quatenaire.pt](mailto:geral@quatenaire.pt)

[www.quatenaire.pt](http://www.quatenaire.pt)

### Operador do Programa

