

**Programa
Ambiente, Alterações
Climáticas e Economia
de Baixo Carbono**

'Programa Ambiente'
Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu
2014 – 2021



Relatório Intercalar n.º 2

09#3_período: 12 março 2021 a 11 julho 2021
julho 2021

09_CALL#3

Reservas da Biosfera

Territórios sustentáveis, comunidades resilientes.

*De acordo com os Artigos 25º, nº 2, alínea j) e 29º, nº 4
do 'Guia para os Candidatos ao Financiamento de Projetos de Ambiente,
sobre Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono.*

Organização geral do Projeto

Composição	Coordenador geral – António Abreu
	Coordenadora científica – Helena Freitas
	Promotor – Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.
	8 Parceiros

Organização funcional	Conselho de Orientação e Acompanhamento (COA)		
	Promotor	+	Parceiros

Promotor e Parceiros - Representantes	
Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.	Ana Barroco
Universidade de Coimbra	Helena Freitas
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas	Maria Fernanda Rollo
Instituto Pedro Nunes – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia	Carlos Cerqueira
Ordem dos Biólogos	Maria de Jesus Fernandes
Keep – Associação para a Paz, as Pessoas e o Planeta	Inês Castão
University of Bergen	Terje Restad
Nordhordland Utviklingsselskap IKS	Kari Natland
Icelandic National Commission for UNESCO	Aslaug Dora Eyjólfsdóttir



Técnicos que colaboraram no presente relatório	Formação	Funções
Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.		
António Domingos Abreu	Biólogo Doutorado em Biologia Marinha	Coordenador geral do Projeto
Ana Barroco	Arquitetura Paisagista	Coordenadora executiva do Projeto
Cláudia Mendes	Gestão de Empresas	Responsável pela Gestão do Projeto
Elisa Pérez Babo	Economia Mestre em Planeamento do Território Inovação e Políticas de Desenvolvimento	Coordenação da Área do Conhecimento Responsável pelo tema Sistema Socioeconómico
Madalena Coutinho	Arquitetura Paisagista	Apoio à Coordenação Executiva do Projeto Trabalho técnico especializado
Margarida Ramos	Lic. em Tradução	Apoio à Gestão do Projeto
Cristina Abreu	Bióloga Pós-graduada em Global Change and Biodiversity: implications for ecosystem services Mestre em Destinos Turísticos Sustentáveis e Planificação Turística Territorial	Responsável pelo tema do Turismo
Leonor Rocha	Ciências Sociais/ História Mestre em Educação, com especialização em Formação e Aprendizagem ao Longo da Vida	Responsável pelo tema da Formação
Universidade de Coimbra		
Helena Freitas	Doutorada em Ecologia Catedrática de Ecologia e Biodiversidade Coordenadora do CFE	Coordenadora científica do Projeto
Joana Alves	Doutorada em Biologia	Coordenadora executiva. Área: Serviços dos ecossistemas
António Gouveia	Doutorado em Ecologia	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Miguel Moreira	Doutorado em Eng. do Ambiente	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
António Alves da Silva	Mestre em Ecologia	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Filipe Martinho	Doutorado em Ecologia	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Leonor Silva	Lic. Economia Pós-graduação em Contabilidade e Finanças	Execução financeira do Projeto
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas		
Fernanda Rollo	História, Doutoramento Prof. Catedrática NOVA FCSH, Investigadora	Coordenação atividades NOVA FCSH, investigação
Filipe G. Silva	História, Mestrado Investigador	Investigação, Gestão de dados, infraestrutura

Técnicos que colaboraram no presente relatório	Formação	Funções
Luísa Seixas	Filosofia, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação, co-coordenação
Pedro Lucas	Ciências da Informação e Estudos Culturais, Mestrado	Investigação, Gestão de dados
Sofia Diniz	História, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação
Maria João Martins	Ecologia, Mestrado Técnica Superiora Investigadora, Doutoranda	Investigação (SIGS, infraestrutura, dados)
Rosário Jorge	Sociologia, Doutoramento Prof. NOVA FCSH, Investigadora	Investigação
Katia Favilla	Desenvolvimento sustentável, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação
Raquel Pereira	Antropologia, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação
Carla Pereira	Edição de texto, Mestrado Técnica Superior	Execução financeira do Projeto
Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia		
Carlos Cerqueira	Marketing e Gestão de Empresas Mestre em Economia	Responsável pelo tema da Inovação e do Empreendedorismo
M. Clara Luxo Correia	Economista, Mestre em Marketing Pós-graduada em Digital Marketing and Analytics e em Marketing e Direção Comercial	Trabalho técnico especializado
Daniela Pinheiro	Lic. Contabilidade Mestrado em Análise Financeira (em curso)	Execução financeira do Projeto
Ordem dos Biólogos		
José Matos	Biólogo Doutorado em Genética Molecular	Responsável pelas Olimpíadas da Biosfera
Daniela Casimiro	Bióloga Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental	Responsável pelas Olimpíadas da Biosfera
Pedro Oliveira	Biólogo	Colaborador das Olimpíadas da Biosfera
Margarida Roque	Bióloga	Colaborador das Olimpíadas da Biosfera
Keep - Associação para a Paz, as Pessoas e o Planeta		
Inês Castaño	Museologia, Mestrado	Coordenação geral. Investigação
Luís Marreiros	Produção	Gestão operacional do Projeto
Adelaide Andrade Siva	Lic. Direito	Execução financeira do Projeto
University of Bergen		
Inger Elisabeth Måren	Bióloga Doutorada em Vegetation Ecology Professora Associada em Ecologia Aplicada do Departamento de Ciências Biológicas da UiB Cátedra UNESCO para o Património Sustentável e a Gestão Ambiental	Responsável pela participação da University of Bergen
Alicia Donnellan Barraclough	Bióloga Doutorada em Applied Environmental Science Investigadora de pós-doutoramento associada à Cátedra UNESCO da Universidade de Bergen.	Investigadora. Área: Serviços dos ecossistemas

Técnicos que colaboraram no presente relatório	Formação	Funções
Jarrood Cusens	Biólogo Doutorando em Biological Sciences Investigador	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Nordhordland Utviklingsselskap IKS		
Kari Natland	Lic.Travel and tourism business, com especialização em planeamento e desenvolvimento territorial	Responsável pela participação da Responsável da Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Icelandic National Commission for UNESCO		
Sæunn Stefánsdóttir	Gestão de Empresas, a concluir mestrado em Administração Pública Presidente da Comissão Nacional da UNESCO da Islândia	Responsável pela participação da Icelandic National Commission UNESCO

Página deixada propositadamente em branco

O Promotor do Projeto

Nome

Ana Maria Moreira Freire de Morais Barroco Parreira do Amaral

Data e Assinatura

Posição

Administração da Quaternaire Portugal

O Operador do Programa – Secretaria Geral do Ambiente

Nome

Alexandra Carvalho

Data e Assinatura

Posição

Secretária Geral

Página deixada propositadamente em branco

Índice

1	Introdução	1
2	Descrição detalhada.....	3
2.1	Identificação das atividades.....	3
2.2	Resumo das atividades desenvolvidas.....	4
2.2.1	Progressão técnica.....	5
2.2.2	Progressão financeira	7
2.2.3	Envolvimento dos parceiros	8
2.2.4	Informação relativa aos participantes no Projeto.....	10
3	Resultados alcançados.....	13
4	Descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro	19
5	Descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente.....	21

Tabelas

Tabela 2.1 – Atividades abrangidas no período entre 12 de novembro 2020 e 30 de junho 2021	3
Tabela 2.2 – Progressão financeira. Custos de Gestão do Projeto.....	7
Tabela 2.3 – Envolvimento dos parceiros nas atividades entre 1 de março e 30 de junho 2021	8
Tabela 4.1 – Progressão financeira. Custos do Projeto	19
Tabela 5.1 – Programa Ambiente, indicadores e metas	21
Tabela 5.2 – Relação de cada atividade com os indicadores previstos no Programa Ambiente	23

Figuras

Figura 3.1 – Execução do Projeto. Progressão das atividades iniciadas e executadas	14
Figura 3.2 – Execução do Projeto. Progressão de execução das atividades ativas	15
Figura 3.3 – Execução do Projeto. Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento	16
Figura 3.4 – Execução do Projeto. <i>Outputs</i>	17
Figura 3.5 – Execução do Projeto. Indicadores de resultados	18
Figura 3.6 – Comunicação e divulgação do Projeto.....	18
Figura 5.1 – Contribuição do Projeto para o alcance dos indicadores do Programa Ambiente.....	25

Anexos

A. Fichas das atividades.....	27
ID1_Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)	29
ID2_Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB)	31
ID3_Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO.....	33
ID4_História das Reservas da Biosfera.....	35
ID5_Elaboração de um plano de gestão de dados:FAIR data – acesso aberto	37
ID6_Auscultação/Perceção e identificação do património.....	39
ID7_Deenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento sustentável (PDS) das RB	41
ID8_Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS	43
ID10_Infraestrutura Digital – Modelo de gestão distribuída.....	45
ID11_Infraestrutura Digital – Website das Reservas da Biosfera.....	47
ID12_Infraestrutura Digital – Dashboard de gestão de indicadores	49
ID13_Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera.....	51
ID14_Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	53
ID15_Mapeamento da diversidade de ecossistemas das RB	55
ID16_Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	59
ID17_Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	63
ID18_Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas Reservas da Biosfera (RB)	65
ID19_Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	67
ID20_Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade	69
ID21_Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB.....	71
ID22_Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE.....	75
ID35_Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)	79
ID36_Memórias e identidades – registo sistematizado de memórias – (integra catálogo de ações piloto).....	81
ID37_Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto).....	85
ID45_Referencial de certificação em sustentabilidade – Reservas da Biosfera Portuguesas.....	87
ID46_Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento	89
ID48_Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS	91
ID56_Elaboração da Estratégia de Marketing	93
ID57_Conceção do Plano de Comunicação.....	95
ID58_Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)	97
ID59_Deenvolvimento Criativo Genérico.....	99
ID60_Deenvolvimento Criativo da Comunicação Digital	101

ID61_Produções e Materiais de divulgação - Offline.....	103
ID62_Produções e Materiais de divulgação - Online.....	105
ID71_Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos.....	107
ID74_Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	109
ID75_Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB	111
ID77_Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera	113
ID80_Extensão do conhecimento.....	115

Página deixada propositadamente em branco

1 INTRODUÇÃO

O presente documento corresponde ao 2º Relatório Intercalar do projeto **09#CALL3 – Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes** e tem como objetivo apresentar informação sobre o progresso de execução técnica e financeira do Projeto, sendo a avaliação efetuada reportada ao período entre 01 de março de 2021 e 30 de junho de 2021¹.

Pretendendo-se a sua rápida leitura e perceção clara do estado de evolução do Projeto, o documento encontra-se organizado, seguindo a estrutura modelo proposto pelo Programa EEA Grants:

- O capítulo 2 é dedicado à descrição detalhada das atividades, no qual se inclui:
 - a identificação das atividades em curso no período em apreço e a apresentação do seu cronograma de desenvolvimento, revisto de acordo com a 3ª revisão ao Anexo I, parte integrante do contrato;
 - o resumo das atividades desenvolvidas, focalizando-se na progressão técnica e financeira, bem como no envolvimento dos parceiros e de outros participantes;
- O capítulo 3 é dedicado aos resultados alcançados;
- O capítulo 4 é dedicado à descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro;
- O capítulo 5 é dedicado à descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente.

No Anexo A encontram-se as fichas das atividades, onde é sistematizada, em formato de tabela, toda a informação de caracterização da progressão técnica e financeira considerada relevante.

Importa destacar, como uma particularidade deste período de avaliação, o facto de ter ocorrido a cessação de participação no Projeto do parceiro PC&A – Consultores de Marketing Estratégico, Lda, a qual ocorreu no passado dia 30 de abril. No âmbito deste processo, a avaliação da progressão da execução técnica e financeira das atividades ativas (atividades ID56, ID57 e ID58), da responsabilidade da PC&A no período entre 1 de março e 30 de abril de 2021, consta do Relatório de Execução da PC&A submetido à SGA, no passado mês de junho.

Neste contexto, no que respeita a essas mesmas atividades, que passaram para a responsabilidade do Promotor do Projeto, a avaliação da execução técnica e financeira reporta-se exclusivamente ao período entre 1 de maio e 30 de junho de 2021, da responsabilidade da Quaternaire Portugal.

¹ Deixa-se a nota de que o período de avaliação difere do quadrimestre do Projeto de modo a reportar meses completos, de acordo com a informação recebida da SGA a 5 de março de 2021.

Página deixada propositadamente em branco

2 DESCRIÇÃO DETALHADA

2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Segundo a identificação das atividades contratualizadas, apresenta-se na tabela seguinte as atividades iniciadas e ativas no período entre 12 de novembro 2020 e 30 de junho de 2021, destacando-se as datas previstas para o seu desenvolvimento, atualizadas de acordo com a 3ª revisão ao Anexo I, parte integrante do contrato, bem como os parceiros responsáveis pela sua execução.

As atividades associadas à gestão geral do Projeto, na qual se inclui a elaboração do presente relatório, são consideradas tarefas regulares ao longo de todo o Projeto pelo que, face à sua natureza, assumem-se como atividades transversais.

Tabela 2.1 – Atividades abrangidas no período entre 12 de novembro 2020 e 30 de junho 2021

ID	Designação	Data início	Data fim	Parceiro responsável
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)	12-11-2020	30-04-2021	QP
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB	12-11-2020	30-04-2021	QP
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO	01-01-2021	31-03-2021	QP
4	História das Reservas da Biosfera	12-11-2020	01-11-2022	UNL-FCSH
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto	12-11-2020	30-06-2021	UNL-FCSH
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
7	Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB	01-03-2021	31-10-2021	QP
8	Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS	01-05-2021	31-07-2021	QP
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída	01-01-2021	30-06-2021	UNL-FCSH
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
13	Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera	01-05-2021	11-05-2023	UNL-FCSH
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	01-01-2021	30-01-2023	UNL-FCSH
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB	12-11-2020	30-09-2021	UC/ Univ Bergen
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	01-01-2021	30-11-2021	UC/ Univ Bergen
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	01-01-2021	31-10-2021	QP
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB	01-01-2021	31-12-2021	IPN
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	01-01-2021	31-12-2021	IPN
20	Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade	01-05-2021	31-12-2021	QP
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	01-03-2021	30-04-2022	UC/ Univ. Bergen/ RB de Nordhordland
22	Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE	01-06-2021	30-04-2022	UC/ Univ. Bergen
35	Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)	01-06-2021	31-10-2022	QP
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)	12-11-2020	30-09-2022	UNL-FCSH

ID	Designação	Data início	Data fim	Parceiro responsável
37	Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)	01-05-2021	11-05-2023	UNL-FCSH
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	12-11-2020	11-04-2023	QP
46	Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento	01-04-2021	31-10-2021	QP
48	Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS	01-05-2021	31-10-2022	QP
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	12-11-2020	31-07-2021	PC&A/ QP
57	Conceção do Plano de Comunicação	01-01-2021	31-07-2021	PC&A/ QP
58	Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)	01-03-2021	31-07-2021	PC&A/ QP
59	Desenvolvimento Criativo Genérico	01-06-2021	30-09-2021	QP
60	Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital	01-06-2021	30-09-2021	QP
61	Produções e Materiais de divulgação - Offline	01-06-2021	30-09-2021	QP
62	Produções e Materiais de divulgação - Online	01-06-2021	30-09-2021	QP
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	01-01-2021	31-07-2021	QP
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	01-02-2021	31-07-2021	OBio
75	Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB	01-03-2021	30-09-2021	OBio
77	Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera	01-04-2021	30-09-2022	QP
80	Extensão do conhecimento	12-11-2020	30-05-2022	Keep
	Gestão do projeto	12-11-2020	11-05-2023	QP
RI 2	Relatório Intercalar 2	01-03-2021	30-06-2021	QP

Fonte: Contract_09_CALL#3_Anexo I_Rev.03

2.2 RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Todas as atividades são descritas através de um conjunto de indicadores que permitem uma leitura síntese dos respetivos níveis de execução técnica e financeira, possibilitando a apreensão do estado de execução do Projeto de uma forma objetiva, integrada e consistente, passível de ser monitorizada. Assim, cada atividade é sistematizada em duas componentes essenciais da sua execução – progressão técnica e progressão financeira – com os seguintes campos descritivos (veja-se Anexo A):

- Progressão técnica:
 - Tarefas realizadas – onde se identificam as ações desenvolvidas, o parceiro responsável e os parceiros envolvidos, bem como os participantes nomeadamente as Reservas da Biosfera e outras entidades;
 - Resultados obtidos – onde se enuncia o que foi conseguido com as tarefas realizadas e se listam os documentos, ações e outras formas de evidência dos resultados obtidos;
 - Reorientações e ajustamentos – onde se evidenciam as tarefas/ ações que, por qualquer motivo, não foram realizadas, se justifica a sua não realização e se apresentam medidas corretivas no sentido de resolver eventuais lacunas, atrasos, etc.;

- Barómetro de execução - onde se recuperam os indicadores, metas e fontes de verificação associados a cada atividade, tal como apresentados na candidatura/ contrato e se regista o seu estado de execução (executado, em execução, não executado);
- Cronograma de execução – onde se regista o estado de execução da atividade no período de avaliação do Relatório Intercalar em apreço e se projeta a sua evolução para o próximo relatório, com a enunciação de tarefas previstas a realizar.
- Progressão financeira:
 - Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a;
 - Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b;
 - Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4;
 - Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2;
 - Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e;
 - Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f;
 - Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g.

Todos estes campos especificam os seguintes parâmetros:

- Total previsto: valores contratados de acordo com o documento “Contract_09_CALL#3_Anexo I_Rev.3_2021_06_15”, parte integrante do contrato;
- Executado entre: valor do que foi executado no período de avaliação a que o relatório intercalar diz respeito;
- % do que foi executado no período de avaliação a que o relatório intercalar diz respeito em relação ao total previsto;
- Executado acumulado: somatório do valor do que foi executado nos diferentes períodos de avaliação/ relatórios intercalares;
- % do executado acumulado em relação ao total previsto.

Em adicional considera-se a atividade transversal de “Gestão” do Projeto.

2.2.1 Progressão técnica

No geral verifica-se que todas as 39 atividades em avaliação neste relatório iniciaram a sua atividade, como previsto.

Como seria de esperar, as **tarefas realizadas** associam-se ao cronograma das atividades em avaliação, pelo que no período em apreço a tipificação das tarefas realizadas pode ser agrupada em 3 grandes grupos:

- Tarefas de continuidade das atividades iniciadas durante o período do Relatório Intercalar 1 (de 12 de novembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021), num total de 23 atividades;

- Tarefas típicas da fase inicial das atividades que agora se iniciaram, num total de 16 atividades;
- Tarefas de fecho de atividades, num total de 4.

No primeiro grupo enquadram-se as tarefas relacionadas com a continuidade de sistematização da informação recebida das RB, mas também de definição e consolidação de metodologias e de tratamento de resultados de inquéritos e entrevistas efetuadas às RB. São também de realçar as primeiras deslocações das equipas ao terreno, realizadas com os objetivos de reunir pessoalmente com os gestores das RB (ID7, ID35 e ID45), de apresentar e lançar atividades que envolvem diretamente a população local (ID36), bem como a realização de levantamentos de campo (ID21).

No segundo grupo identificam-se as tarefas de recolha e sistematização de informação, incluindo a recebida das RB e identificada no relatório anterior, a pesquisa de informação, a preparação de base de dados e de entrevistas e inquéritos, sendo de salientar o cruzamento e interação entre os Parceiros de modo a reduzir a duplicação de tarefas, nomeadamente em termos de pedidos de informação e inquéritos.

No último grupo destaca-se a tarefa de elaboração e edição dos relatórios associados às atividades ID1, ID2, ID3 e ID5.

Na sua sequência, os **resultados obtidos** incluem a troca e recolha de informações, a realização de inquéritos e entrevistas, a definição de metodologias, o tratamento de informação e a elaboração de conteúdos para os relatórios, bem como a criação da linha gráfica do Projeto e da produção de peças de comunicação, entre outros, com **evidências** em registos próprios, em atas das reuniões, nas respostas aos inquéritos e na produção de diversos documentos de trabalho de tratamento de dados, bem como na impressão de peças de comunicação (postais e *flyers*).

A diversidade do tipo de atividades e do seu cronograma de execução, que justifica diferentes estágios de desenvolvimento, leva a que sejam destacadas as atividades “Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera” (ID1), “Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB” (ID2), “Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO” (ID3) e “Elaboração de um plano de gestão de dados : FAIR data -acesso aberto” (ID5), por serem as únicas com a edição de relatório como produto.

Justificado pela situação pandémica e pela necessidade de alinhamento de algumas atividades relacionadas com a produção de materiais de comunicação com o próprio Plano de Comunicação das RB, são propostas **reorientações e ajustamentos** à programação de algumas atividades e tarefas (ID10, ID59, ID60, ID61, ID62, ID74, ID75 e ID80), as quais apresentam como **medidas corretivas** o prolongamento temporal da sua execução e a reprogramação dos agendamentos das deslocações.

A análise do campo **barómetro de execução** demonstra que todas as atividades se encontram em desenvolvimento, com todos os indicadores, metas e fontes de verificação “em execução”, com exceção das 4 atividades já referidas como tendo *outputs* entregues as quais são consideradas como “executadas”.

No contexto do que tem sido referido, o **cronograma de execução** evidencia que, no período de 1 de março a 30 de junho do corrente ano, todas as atividades se encontram “em execução” com a exceção das 4 atividades que possuem *outputs*, consideradas como “executadas”. É ainda possível reter que no próximo período de avaliação (1 de julho a 31 de outubro de 2021), a continuação da realização das tarefas em curso constitui-se como a principal tarefa prevista para o próximo quadrimestre.

Importa, ainda, destacar que entre as 35 atividades que continuarão para o próximo período de avaliação 8 deverão ser concluídas durante o mesmo.

Por último, numa breve referência à atividade transversal de **Gestão do Projeto**, refere-se o envolvimento constante da Coordenação do Projeto, quer com todos os parceiros da equipa (nacionais e internacionais), quer com as próprias Reservas da Biosfera, bem como com o Comité Nacional MaB, traduzindo-se no acompanhamento contínuo do desenvolvimento das atividades técnicas e dos procedimentos administrativos que um Projeto desta natureza tem associado, mas também na procura de oportunidades de parcerias, divulgação e de participação do Projeto em eventos,

com destaque para conferências e exposições no âmbito das comemorações dos 50 anos do Programa MaB, que contaram com a participação de vários elementos dos diferentes Parceiros do Projeto e de representantes das Reservas da Biosfera portuguesas e dos países da CPLP.

2.2.2 Progressão financeira

A análise da progressão financeira das atividades em avaliação permite evidenciar 4 atividades com uma percentagem de execução em termos de afetação de **recursos humanos**, igual ou superior a 100%, o que reflete a fase de fecho das atividades já referenciada na análise da progressão técnica (ID1, ID2, ID3 e ID5).

Em relação aos “recursos humanos” destaca-se também o facto de haver 2 atividades que ainda não afetaram qualquer despesa a esta rubrica (ID11 e ID12) e outras 5 atividades que também não o fizeram por considerarem as tarefas desenvolvidas até ao momento como sendo ações decorrentes de competências e capacidades endógenas das próprias entidades (ID10, ID14, ID37, ID74 e ID75). Salienta-se, igualmente, o facto de haver 3 atividades que, por dificuldades de contratação no período de avaliação anterior, reportam agora os custos referentes aos dois períodos (ID15, ID16 e ID21). Por outro lado, realça-se que a Universidade de Bergen optou por só vir a apresentar as despesas ocorridas neste período de avaliação no próximo Relatório Intercalar.

É igualmente possível verificar que, das 18 atividades que possuem verbas atribuídas à rubrica **custos com transporte**, apenas 5 apresentam despesas associadas (ID4, ID6, ID21, ID36 e ID80), o que reflete as limitações impostas pela pandemia e o respetivo adiamento das deslocações às RB.

Destaca-se também que das 2 atividades com verba para **equipamentos** apenas 1 já utilizou a totalidade da verba disponível (ID15), e o facto de 15 atividades preverem a **aquisição de serviços** das quais 2 já esgotaram a verba disponível (ID58 e ID80).

Em termos de **Gestão do Projeto** verifica-se que, relativamente ao total das verbas previstas, o total dos custos já verificados no período em avaliação é de cerca de 14% do valor total previsto, aumentando para cerca de 26% relativamente ao executado acumulado, apresentando-se na tabela seguinte um resumo por rubrica.

Tabela 2.2 – Progressão financeira. Custos de Gestão do Projeto

Total previsto	Executado entre 1 mar. 2021 – 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
275 714,10€	35 091,87€	12,73%	73 452,39€	26,64%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
22 578,50€	1 819,42€	8,06%	1 819,42€	8,06%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
2 902,50€	387,00€	13,33%	725,63€	25,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
4 950,00€	3 871,34€	78,21%	3 871,34€	78,21%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Total previsto	Executado entre 1 mar. 2021 – 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
7 875,06€	985,36€	12,51%	2 310,00€	29,33%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
2 720,00€	645,20€	23,72%	679,52€	24,98%

2.2.3 Envolvimento dos parceiros

Como pode ser observado na tabela de identificação das atividades em avaliação, bem como nas respetivas fichas que constituem o Anexo A, no período a que o presente documento se reporta houve o envolvimento de todos os parceiros, verificando-se que apenas os parceiros Nordhordland Utviklingsselskap IKS e Icelandic National Commission for UNESCO não tiveram participação ativa nas atividades específicas em desenvolvimento. Contudo, regista-se, no caso da Islândia, a entrada na equipa do Projeto do coordenador da primeira candidatura a Reserva da Biosfera desse país, representante do Ministério do Ambiente da Islândia, o qual beneficiará da experiência das Reservas da Biosfera portuguesas e da equipa de Projeto na preparação dessa candidatura.

Para além da participação em reuniões de coordenação, o envolvimento dos parceiros nas diferentes atividades é o registado na tabela seguinte.

Tabela 2.3 – Envolvimento dos parceiros nas atividades entre 1 de março e 30 de junho 2021

ID	Designação	QP	UC	UNL	IPN	OBiO	Keep	UiB	Nordh	Iscl
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)									
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB									
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO									
4	História das Reservas da Biosfera									
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto									
6	Auscultação/Perceção e identificação do património									
7	Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB									
8	Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS									
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída									
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera									
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores									
13	Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera									

ID	Designação	QP	UC	UNL	IPN	OBiO	Keep	UiB	Nordh	Iscl
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera									
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB									
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas									
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico									
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB									
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável									
20	Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade									
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB									
22	Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE									
35	Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)									
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)									
37	Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)									
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas									
46	Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento									
48	Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS									
56	Elaboração da Estratégia de Marketing									
57	Conceção do Plano de Comunicação									
58	Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)									
59	Desenvolvimento Criativo Genérico									
60	Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital									
61	Produções e Materiais de divulgação - Offline									
62	Produções e Materiais de divulgação - Online									
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos									
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera									

ID	Designação	QP	UC	UNL	IPN	OBiO	Keep	UiB	Nordh	Iscl
75	Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB									
77	Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera									
80	Extensão do conhecimento									
RI 2	Relatório Intercalar 2									

2.2.4 Informação relativa aos participantes no Projeto

No presente período de avaliação consideram-se participantes no Projeto as Reservas da Biosfera e o Comité Nacional MaB.

O envolvimento das RB, representadas por membros dos órgãos de gestão, verificou-se de forma mais evidente na participação em diversas reuniões de trabalho diretamente relacionadas com algumas das atividades em curso, as quais tiveram objetivos distintos, a saber:

- Atividade ID7 - apresentar e discutir o conceito desenhado pela equipa da QP para os Plano de Desenvolvimento Sustentáveis (PDS), permitindo a troca de ideias, a incorporação de contributos e a consolidação do conceito a ser desenvolvido;
- Atividade ID18 - conhecer o trabalho da Reserva, os mais importantes atores locais e as dinâmicas de interação entre a RB e os seus principais “*stakeholders*”;
- Atividade ID19 - identificar boas práticas de I&DT, Inovação e Empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável;
- Atividade ID21 – consolidar a estratégia participativa para a seleção de serviços de ecossistemas chave para o desenvolvimento sustentável das RB;
- Atividades ID35 e ID45 – trocar informações sobre biodiversidade, paisagem, património cultural e histórico, infraestruturas, acessibilidades e serviços;
- Atividade ID36 – apresentar o Projeto e a atividade recolha de memórias.

É de destacar o envolvimento e apoio da RB de Castro Verde e da Câmara Municipal aos trabalhos desenvolvidos no território concelhio, no período entre 24 e 29 de maio, os quais juntaram elementos das equipas da UNL-FCSH, Keep, UC e QP.

Para além destas participações, as RB continuaram a responder a questionários e a acompanhar o desenvolvimento do Projeto.

Neste período de avaliação também se manteve o acompanhamento do desenvolvimento do Projeto por parte do Comité Nacional MaB, tendo a Coordenação Técnica do Projeto assegurado contactos regulares com a Sra. Presidente.

Apesar de não diretamente promovida pelo Projeto, importa salientar a realização da Conferência Internacional “Reservas da Biosfera Territórios sustentáveis, comunidades resilientes – Diálogos lusófonos”, promovida pela Fundação de Serralves, integrada nas celebrações do programa global da UNESCO – MaB 50º aniversário, a qual ocorreu nos passados dias 28 e 29 de junho, na Fundação de Serralves, Porto. Este evento que decorreu em modalidade mista (presencial e online) contou com a participação da Presidente do Comité MaB de Portugal, do Diretor da Divisão de

Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO, de representantes das Reservas da Biosfera do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e S. Tomé, bem como de vários elementos da equipa do Projeto, nomeadamente o Coordenador Técnico, o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em paralelo com esta Conferência, foi promovido um seminário de formação em metodologias relativas à identificação e registo de memórias em Reservas da Biosfera, coordenado pelo Parceiro do Projeto Universidade Nova de Lisboa.

Página deixada propositadamente em branco

3 RESULTADOS ALCANÇADOS

Relativamente à dimensão técnica do Projeto², a taxa global de execução, neste período de avaliação, é de 20,0%, calculada em função do peso relativo de cada atividade no orçamento global³ do Projeto e do seu cronograma de execução atualizado de acordo com a 3ª revisão ao Anexo I.

De modo a permitir um acompanhamento do Projeto mais detalhado, na sequência do referido no capítulo anterior, os resultados alcançados na dimensão técnica são estruturados em dois eixos, um primeiro dedicado à execução do Projeto e um segundo dedicado à comunicação e divulgação do Projeto.

No que respeita à execução do Projeto caracterizam-se quatro variáveis, a saber:

- Atividades, quer em termos da progressão das atividades iniciadas e executadas, quer em termos de progresso de execução das atividades ativas relativamente ao seu cronograma de desenvolvimento;
- Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento, procedendo-se à identificação do número de atividades que foram ajustadas, ou que são propostas de o serem no âmbito do presente documento, em relação ao contratualizado;
- *Outputs*, onde se dá conta do número de produtos entregues;
- Indicadores de resultados, onde se apresenta o grau de concretização do Projeto relativamente às suas metas.


No tocante à comunicação e divulgação do Projeto pretende-se dar conta do número de iniciativas que foram realizadas, quer tenham sido através de edição de pequenas notícias nas redes sociais e comunicação social, como por via da participação em eventos onde houve a oportunidade de fazer referência ao Projeto e às Reservas da Biosfera portuguesas, como ocorreu no âmbito da participação da Universidade de Coimbra e da Universidade de Bergen no Congresso EGU 2021, onde foi apresentado o modelo conceptual para a avaliação dos SE.

De forma a permitir uma rápida leitura dos resultados alcançados os mesmos são apresentados em forma de gráficos, tal como se pode observar seguidamente.

² Os resultados da execução financeira são apresentados no capítulo seguinte.


³ Excluídos os custos de gestão por serem considerados transversais.

Figura 3.1 – Execução do Projeto. Progressão das atividades iniciadas e executadas

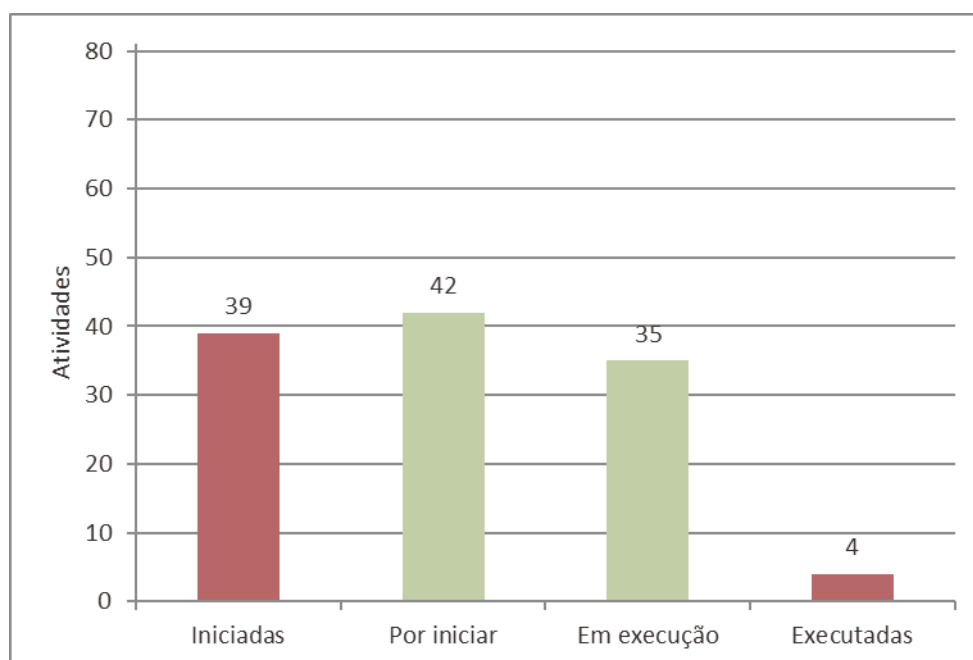

Da leitura do gráfico anterior regista-se que as atividades iniciadas e ativas entre 12 de novembro de 2020 e 30 de junho de 2021 correspondem a 48,1% do total das atividades do Projeto, que as atividades em execução representam 45,7%, correspondendo as atividades executadas a 4,9% (ID1, ID2, ID3 e ID5). Por sua vez, as atividades a iniciar correspondem a 51,9% do Projeto.


Figura 3.2 – Execução do Projeto. Progressão de execução das atividades ativas

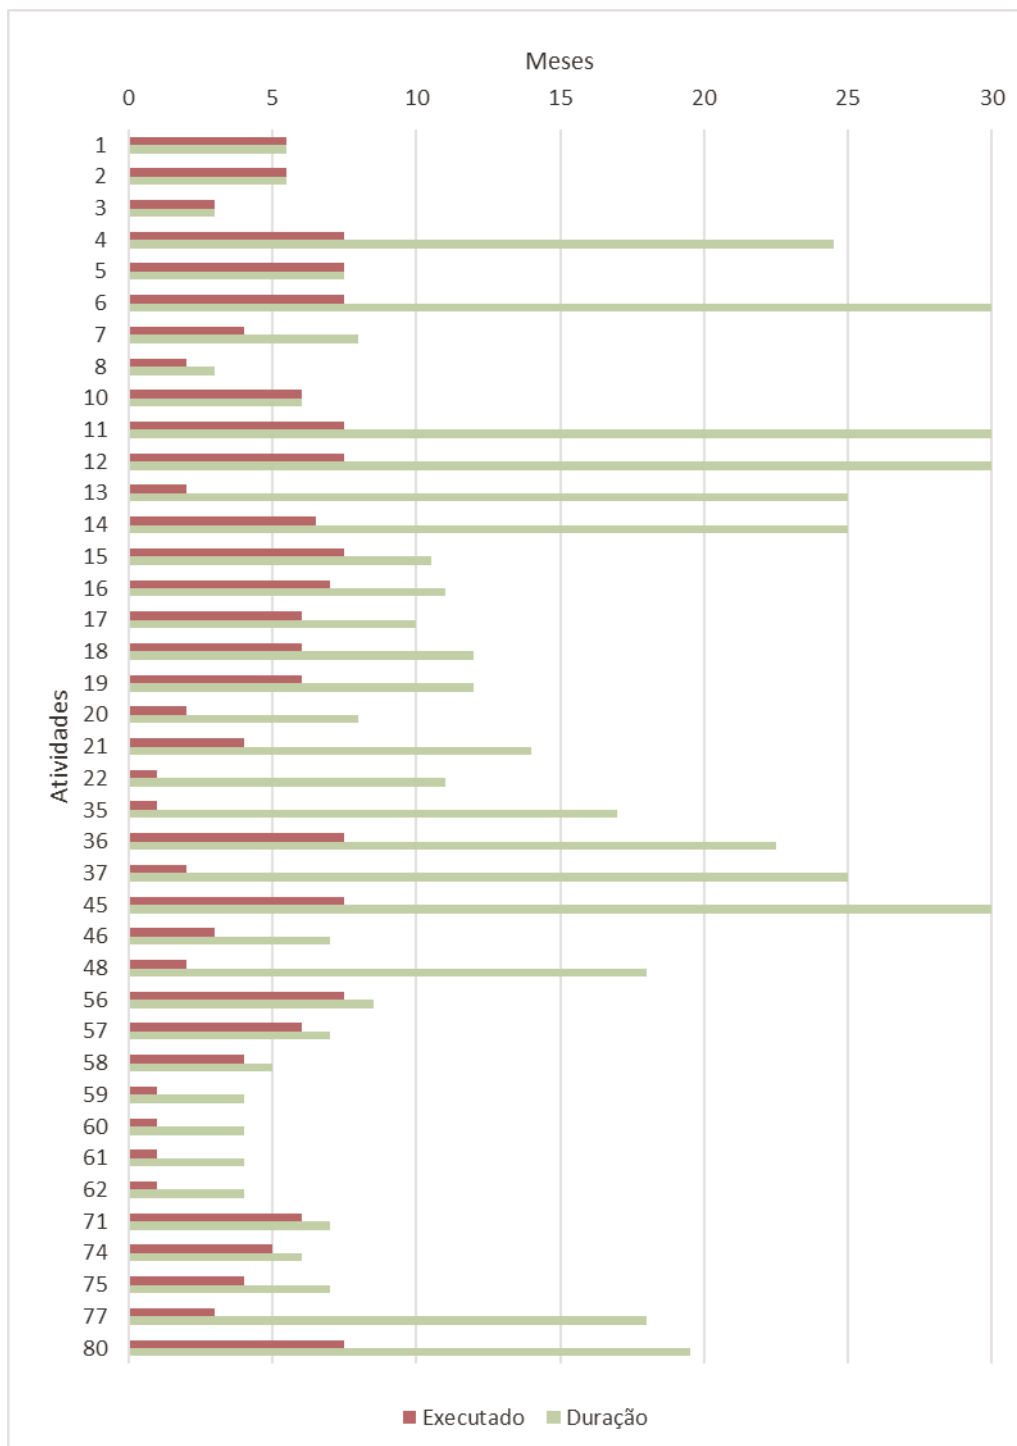

A leitura da progressão do cronograma de execução das atividades em desenvolvimento, refletindo a recalendarização aprovada pela SGA⁴, permite verificar que todas as atividades se encontram dentro da programação prevista. No global, o tempo já despendido corresponde a 18,75% do tempo previsto para as atividades em apreço.

Contudo, justificado pelo adiamento do diálogo com as escolas e de visita às RB devido à situação pandémica e pela necessidade de alinhamento de algumas atividades relacionadas com a produção de materiais de comunicação com o próprio Plano de Comunicação das RB, o qual se encontra em fase final de execução, verifica-se a necessidade de, neste documento, propor o prolongamento do tempo de execução de 7 atividades (ID10, ID59, ID60, ID61, ID62, ID74 e ID75), como registado nas respetivas fichas, o que se traduz na redução do tempo já execução despendido, que passa a representar 17,5% do tempo previsto para as atividades em apreço.

Figura 3.3 – Execução do Projeto. Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento

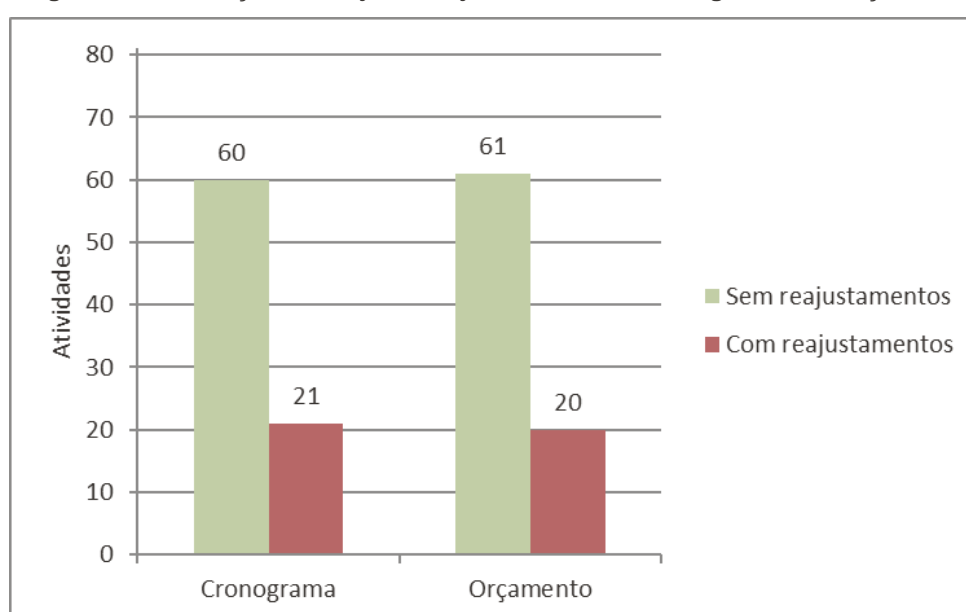


No que respeita a reajustamentos realizados em relação ao contratualizado, já aprovados pela SGA⁵, verifica-se ter havido a necessidade de se reorçamentar 20 atividades, tendo-se procedido à realocação de verbas entre atividades e rubricas. Relativamente a ajustamentos ao cronograma inicial a alteração abrange 21 atividades justificada pela situação epidemiológica que impossibilitou a realização de deslocações às RB, por um melhor alinhamento entre atividades e pela saída do parceiro PC&A e consequente contratação de nova equipa para assessoria à comunicação. Estes reajustamentos representam 24,7% no caso dos ajustes orçamentais e 25,9% no caso dos ajustes ao cronograma.

Importa ainda registar que a proposta de prolongamento temporal das atividades referida anteriormente, apenas procede ao reajuste do cronograma de uma nova atividade (ID10), verificando-se que os restantes prolongamentos se tratam de revisões a reajustes já efetuados, passando a percentagem dos ajustes ao cronograma a ser de 27,2%.

⁴ Contract_09_CALL#3_Anexo I_Rev.03

⁵ idem


Figura 3.4 – Execução do Projeto. *Outputs*

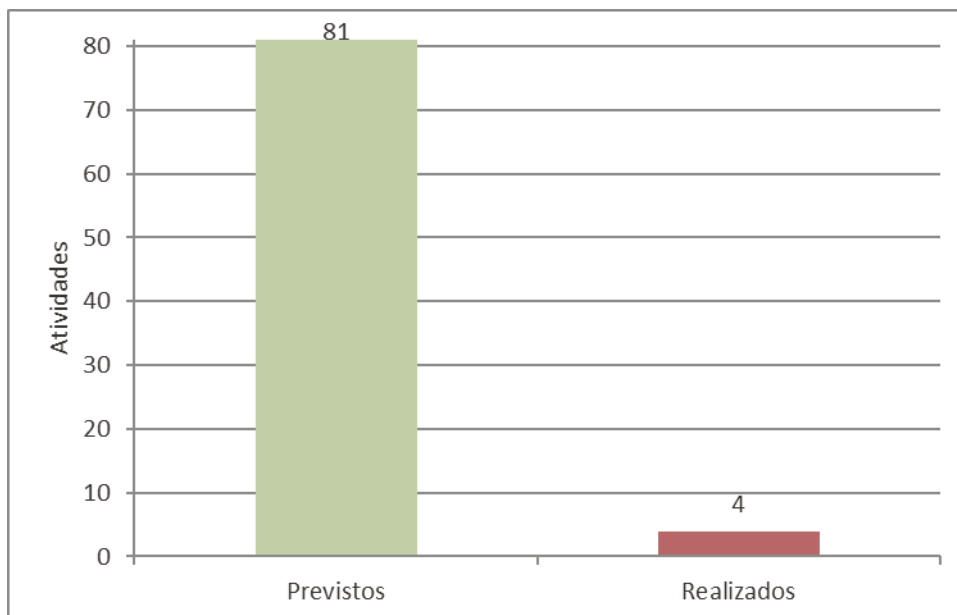

O gráfico anterior ilustra bem a fase ainda inicial em que o Projeto se encontra neste período de avaliação, na qual há um acréscimo de atividades iniciadas que se prolongam para além de 30 de junho, pelo que, naturalmente, ainda são poucos os produtos finalizados, correspondendo os mesmos às atividades ID1, ID2, ID3 e ID5, o que representa 4,9% dos *outputs* do Projeto.


Apesar de não ser formalmente uma atividade do Projeto, considera-se igualmente importante salientar a entrega efetuada do “Plano de Comunicação do Projeto”, o qual especifica a estratégia e objetivos de comunicação do Projeto, os públicos-alvo e canais de comunicação, bem como fornece exemplos de planeamento e de ações de comunicação a levar a cabo. Trata-se de um documento dinâmico a ser atualizado sempre que necessário.

Figura 3.5 – Execução do Projeto. Indicadores de resultados

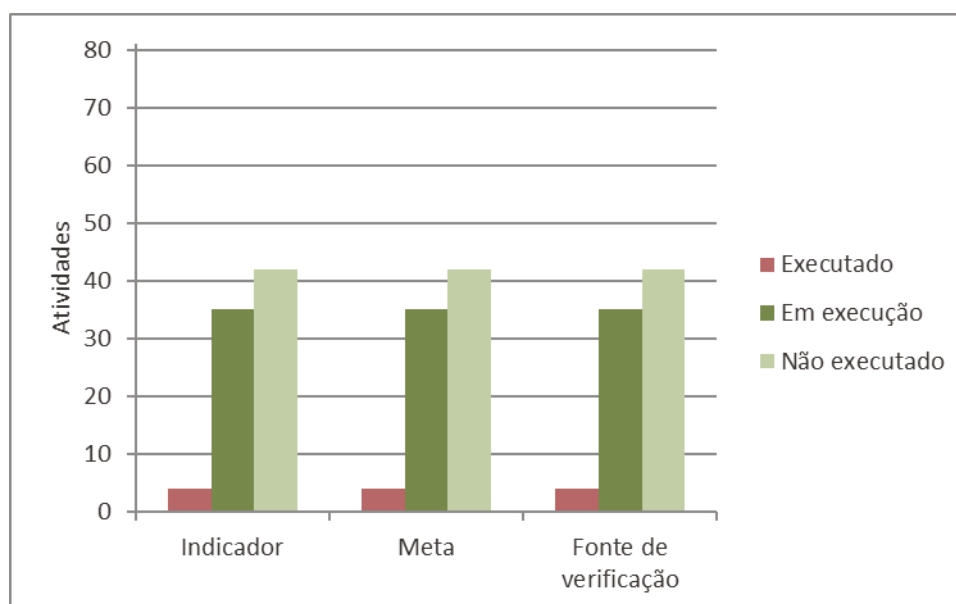

Em consonância, os indicadores de resultados refletem o referido anteriormente. É assim possível verificar que 4,9% se encontra executado, que 43,2% se encontram em execução e que 51,9% ainda não foram iniciados.

Figura 3.6 – Comunicação e divulgação do Projeto

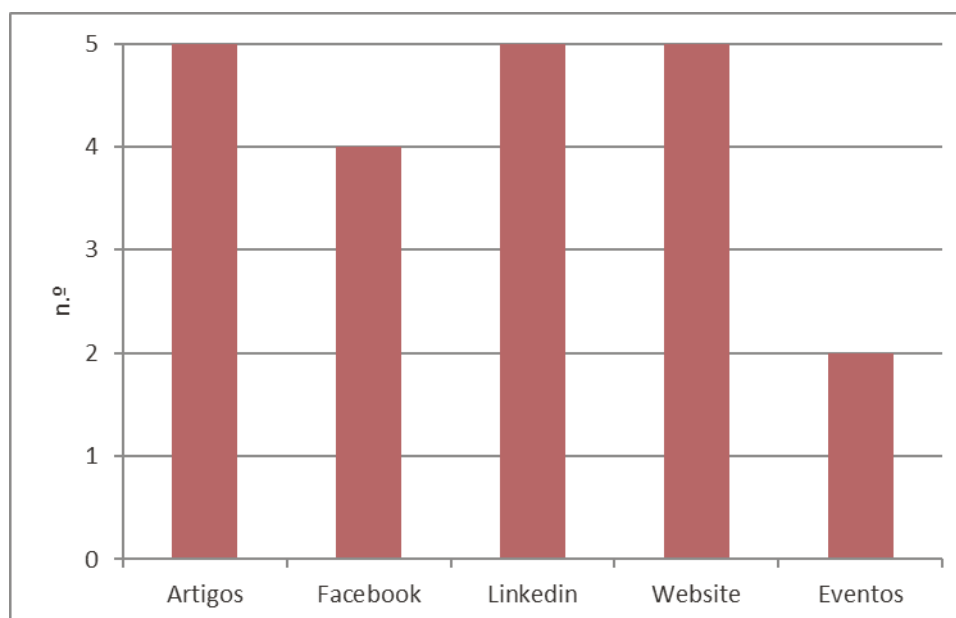

O gráfico acima ilustra o número de iniciativas que foram realizadas em termos de comunicação e divulgação do Projeto, sendo possível verificar que as mesmas se traduzem numa métrica de cinco ocorrências por mês.

4 DESCRIÇÃO DOS CUSTOS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO

Este relatório é acompanhado pelo Anexo 17 - Lista de documentos justificativos de despesa onde estão registadas todas as despesas apresentadas pelo Promotor e Parceiros, cujos documentos justificativos se anexam, e que totalizam o valor de 164 818,53€. Salienta-se que este valor global inclui os Custos Indiretos, mas não inclui as verbas do Parceiro PC&A correspondentes às despesas efetuadas entre 1 de março e 30 de abril de 2021, data de cessação da sua participação no Projeto, as quais foram apresentadas em relatório específico.

Em termos globais verifica-se que, relativamente às verbas previstas do Projeto, o total dos custos já executados representa de 13,1% do valor total previsto, apresentando-se na tabela seguinte um resumo por rubrica.

Tabela 4.1 – Progressão financeira. Custos do Projeto

Total previsto	Executado entre 1 mar. 2021 – 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
1 127 932,04€	127 544,19€	11,3%	206 217,96€	18,3%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
254 460,14€	4 117,50€	1,6%	4 117,50€	1,6%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
4 858,50€	757,87€	15,6%	1 276,81€	26,3%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
19 007,90€	7 369,67€	38,8%	11 997,67€	63,1%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
12 453,64€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
523 215,06€	22,185,36€	4,2%	23 510,00€	4,5%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
2 720,00€	645,20€	23,7%	679,52€	25,0%
Custos indiretos				
254 019,17€	25,368,43€	10,0%	41 103,19€	16,2%

Nota: Os montantes apresentados incluem as verbas do Parceiro PC&A, refletindo a totalidade do Projeto.

A rubrica **Custos com recursos humanos** representa cerca de 68% do total reportado neste período, principalmente devido ao maior envolvimento da Gestão nesta fase de implementação do Projeto, em particular no processo de cessação da participação e parceria do Parceiro PC&A..

Como já referido anteriormente algumas entidades não apresentaram despesa nesta rubrica por considerarem algumas das tarefas desenvolvidas até ao momento como sendo ações da competência da própria entidade, como se verifica com a Universidade Nova de Lisboa e Ordem dos Biólogos. Também não se encontram ainda contabilizadas as despesas desta rubrica da Universidade de Bergen, as quais serão recortadas no próximo relatório Intercalar.

Por outro lado, ainda nesta rubrica, é de sinalizar que, pelo facto de no anterior período de avaliação o processamento de contratação não estar concluído, as despesas com recursos humanos agora apresentadas pela Universidade de Coimbra se reportam ao acumulado desde o início do Projeto.

Relativamente às restantes rubricas é de destacar a relacionada com **Custos com a aquisição de serviços a terceiros**, a qual neste período de avaliação representa 12% do total das despesas apresentadas, verificando-se que as demais rubricas possuem um peso inferior a 5%.

5 DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS GERAIS DOS EEA GRANTS E DO PROGRAMA AMBIENTE

No âmbito dos EEA Grants 2014-2021, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, na qualidade de Doadores, financiam em 15 Estados Membros da União Europeia iniciativas e projetos que pretendem reduzir as disparidades sociais e económicas, reforçando as relações bilaterais com os estados beneficiários, sendo que, de acordo com o Memorando de Entendimento assinado com Portugal, em 2017, o Projeto em desenvolvimento enquadra-se nas áreas de “Ambiente, Energia, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono”.

De acordo com o Aviso de Concurso⁶, o projeto selecionado no âmbito deste aviso contribuirá para a execução do objetivo n.º 2 do ‘Programa Ambiente’ “FOMENTO DE MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS RESERVAS DA BIOSFERA PORTUGUESAS.” e do respetivo Output 2.1 “Capacidade de gestão das Reservas da Biosfera aumentada”, através do desenvolvimento de várias tipologias de ações e materiais que servirão de ferramentas de trabalho para uma melhor gestão e implementação das Reservas da Biosfera no território (...).

Na tabela seguinte descrevem-se os indicadores e as metas para os quais o projeto a financiar irá contribuir.

Tabela 5.1 – Programa Ambiente, indicadores e metas

Área Programática (PA) Objetivo	Resultado esperado	Indicador	Unidade de medida	Fonte de Verificação	Frequência de Reporte	Valor de base	Ano Base	Meta
PA11 Objetivo 2	FOMENTO DE MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS RESERVAS DA BIOSFERA	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Anual (APR)	0	N/A	314967
Output 2.1	Capacidade de gestão das Reservas da Biosfera aumentada.	Número de Reservas da Biosfera onde as medidas foram implementadas.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	6
		Número de profissionais treinados (desagregado por género).	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	22
		Número de planos de desenvolvimento sustentável para Reservas da Biosfera desenvolvidos.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	11

Fonte: Secretaria Geral do Ambiente e da Ação Climática, 2019. Aviso #3 – *Projetos para o fomento de modelos de desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas*

⁶ Secretaria Geral do Ambiente e da Ação Climática, 2019. Aviso #3 – *Projetos para o fomento de modelos de desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas*

Destaca-se, ainda, do Aviso de Concurso que os *grandes desafios que se colocam às Reservas da Biosfera portuguesas* são o conhecimento do seu significado e da importância da sua existência, o aumento da sua visibilidade, a necessidade de utilizar novas formas de comunicar, o reforço do envolvimento de todos os atores locais e a promoção da qualidade e atratividade destes territórios. Neste contexto, o Conhecimento, a Capacitação e a Comunicação são os três domínios essenciais à afirmação da identidade das Reservas da Biosfera no sentido de:

- a) *Valorizar os territórios que constituem as Reservas da Biosfera como laboratórios vivos de sustentabilidade, promovendo a qualidade de vida dos seus habitantes;*
- b) *Aumentar a visibilidade, o conhecimento e a capacidade de gestão destes espaços através de instrumentos que promovam a afirmação e a identidade dos 11 territórios classificados como Reservas da Biosfera.*

Em resposta ao enunciado, no âmbito da candidatura apresentada, a proposta desenvolvida refere no ponto sobre a demonstração da coerência entre os objetivos, atividades, resultados e impactos esperados (Parte C), o seguinte:

O projeto está organizado por forma a articular os eixos prioritários do conhecimento, capacitação e comunicação, numa abordagem estratégica coletiva e orientada para a valorização do conjunto dos territórios das Reservas da Biosfera (RB), entendidos como laboratórios vivos de sustentabilidade e modelos da Agenda 2030 e dos seus ODS, visando promover uma maior visibilidade nacional e internacional, e dinamizar um plano de capacitação inovador, abrangente e dirigido à qualidade de vida e prosperidade das comunidades.

O racional estratégico dos Planos de Desenvolvimento Sustentável das RB, entendidos como instrumentos de reforço e inovação das estratégias locais de desenvolvimento sustentável, estruturam-se com base nas iniciativas relacionadas com o mapeamento, priorização e valoração dos serviços dos ecossistemas, numa aposta no conhecimento, com o apoio do sistema científico e tecnológico nacional e redes internacionais, incorporando o saber transmitido pelas comunidades. As iniciativas relacionadas com o registo e valorização das memórias das comunidades e dos territórios, contarão com a participação ativa dos atores locais, e serão fundamentais para fomentar uma maior apropriação identitária - os territórios e os seus recursos -, e gerar oportunidades para a economia local. A valorização da identidade e dos recursos endógenos, numa leitura harmoniosa e sinérgica do Homem (cultura) e da Natureza, garante a promoção efetiva dos valores percebidos pelas comunidades e pelos agentes económicos.

As iniciativas associadas à criação e desenvolvimento de uma plataforma digital única e versátil, constituirá desde logo uma interface de comunicação e interação privilegiada entre as RB (redes nacional e internacionais), com as populações e com o público em geral. Esta ferramenta de gestão, diálogo e informação terá múltiplas valências, registando a informação coletiva das RB, apoiando o desenvolvimento e monitorização de ações piloto de economia e comércio local e ainda a promoção turística das RB. Permitirá ainda potenciar a capacitação e o conhecimento através de dinâmicas de ciência aberta e ciência cidadã, tornando mais operacional o desígnio de laboratório vivo de sustentabilidade.

As iniciativas associadas ao eixo de capacitação, estão inscritas num plano global e coerente, dirigido a todas as RB, e destinam-se aos técnicos, administradores, comunidades, e promotores da economia local. Visam corresponder aos interesses e expectativas das RB e serão asseguradas pelas universidades envolvidas, com o apoio das 3 cátedras Unesco e pelo sistema científico e tecnológico que será chamado a colaborar em iniciativas complementares. A abordagem proposta no domínio da capacitação visa melhorar as competências e as práticas de gestão e cooperação das RB, individualmente e em rede, e ligadas a domínios suscetíveis de impulsionar a economia local, desde o turismo sustentável ao empreendedorismo, com a valorização e promoção dos recursos endógenos dos territórios.

O plano global de comunicação proposto para as RB nacionais, visa o reforço da sua visibilidade e uma articulação mais eficaz das iniciativas de promoção da rede de RB, e o fomento das oportunidades de cooperação nacional e internacional. Propõe-se um plano de sensibilização dirigido às populações e aos atores de desenvolvimento local para a importância das RB que no sector escolar se corporiza nas Olimpíadas da Biologia complementado pela criação dos cuidadores das RB.

A enorme experiência da coordenação do projeto assegura uma maior visibilidade e presença das RB portuguesas na rede Mundial de RB da UNESCO por via da cooperação com a Noruega e Islândia, o IberoMaB e CPLP, e com a participação ativa de vários peritos internacionais.

Este preâmbulo, que por si só é demonstrativo do alinhamento do Projeto com os objetivos do EEA Grants e com os grandes desafios lançados às Reservas da Biosfera, foi depois detalhado por atividade, fazendo-se a correspondência com o indicador específico do Programa Ambiente para o qual cada atividade contribui de forma mais direta. A tabela seguinte traduz essa relação para as atividades em avaliação no presente relatório.

Tabela 5.1 – Relação de cada atividade com os indicadores previstos no Programa Ambiente


ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
1	Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
2	Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
3	Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
4	História das Reservas da Biosfera	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
5	Elaboração de um plano de gestão de dados: FAIR data - acesso aberto	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
7	Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
8	Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
13	Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
20	Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos

ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
22	Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
35	Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
37	Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
46	Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento	Número de profissionais treinados (desagregados por género)
48	Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS	Número de profissionais treinados (desagregados por género)
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
57	Conceção do Plano de Comunicação	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
58	Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
59	Desenvolvimento Criativo Genérico	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
60	Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
61	Produções e Materiais de divulgação - Offline	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
62	Produções e Materiais de divulgação - Online	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
75	Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
77	Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
80	Extensão do conhecimento	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera

Fonte: Candidatura 09/Call#3, maio 2020. Parte C.

Da leitura da tabela anterior, verifica-se que as atividades do Projeto já iniciadas, possuem relação com todos os indicadores estabelecidos no Programa Ambiente, ao contrário do que acontecia no período de avaliação anterior. Pode-se igualmente verificar que das 39 atividades em avaliação, o indicador “número dos planos de desenvolvimento sustentável para as reservas da biosfera desenvolvidos” já possui 16 atividades, de um total de 27, a contribuírem para o alcance da sua meta (59%), destacando-se, logo de seguida, o indicador “número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas”, o qual também já possui 16 das atividades, de um total de 32, a contribuírem para a sua concretização (50%). A contribuir para os outros dois indicadores estão apenas 7 atividades, de um total de 22, pelo que as percentagens de execução dos mesmos ainda se encontram abaixo dos 50%, tal como pode ser observado na figura seguinte.

Figura 5.1 – Contribuição do Projeto para o alcance dos indicadores do Programa Ambiente

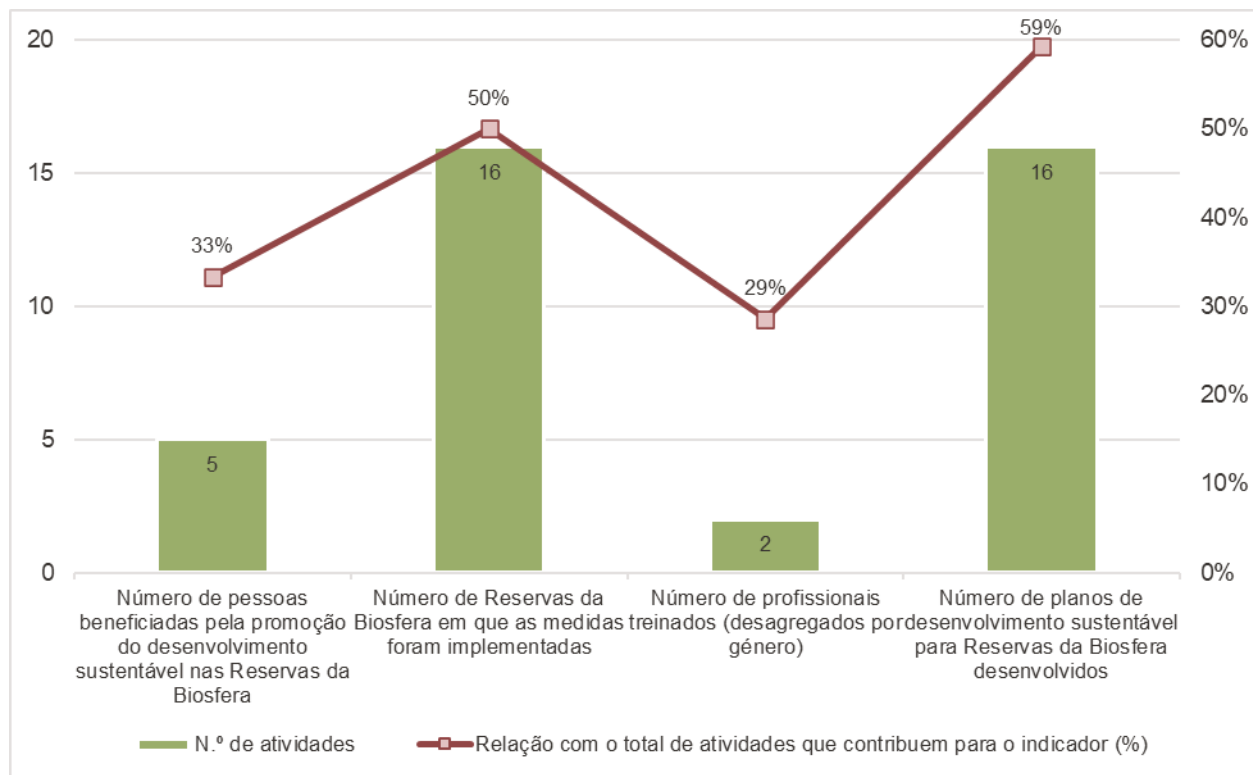

Ressalva-se que, pela natureza do Projeto (decomposto em 81 atividades) e das próprias metas associadas a cada indicador, a avaliação do real contributo para a concretização de cada indicador apenas poderá ser efetuada aquando da conclusão do Projeto ou do conjunto de atividades que contribuem para cada indicador, sendo a leitura atualmente possível apenas a de contribuição para o seu alcance.

Página deixada propositadamente em branco

A. FICHAS DAS ATIVIDADES

Página deixada propositadamente em branco

ID1_Recolha e organização da informação relativa à criação do conjunto das Reservas da Biosfera (RB)

Início | 12/11/2020

Fim | 30/04/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Sistematização da informação recebida – elaboração de ficha síntese por RB	QP	-
Elaboração de relatório	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Diversa informação recebida	Registo efetuado no ficheiro “Inforecebida_controlo” Informação disponibilizada na drive do Projeto
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico	x		

Observações: Relatório editado e entregue

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Executado	-	

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 680,00€	806,55€	17,23%	4688,75€	100,19%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
56,00€	20,36€	36,36%	56,00€	100,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID2_Levantamento dos planos de ação, objetivos e prioridades das RB)

Início | 12/11/2020

Fim | 30/04/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Sistematização da informação recebida	QP	-
Pesquisa e sistematização de informação sobre regimes de proteção	QP	-
Pesquisa e sistematização de informação referencial de base regional e local	QP	-
Elaboração de relatório		

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico	x		

Observações: Relatório editado e entregue

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Executado		

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
13 860,00€	2 642,14€	19,06%	13 953,14€	100,67%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
110,00€	40,00€	36,36%	110,00€	100,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID3_Enquadramento no contexto geoestratégico das RB nas redes UNESCO

Início | 01/01/2021

Fim | 31/03/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB para identificação dos modelos de gestão, visão e prioridades, casos de estudos/ projetos/ experiências	QP	-
Consulta de sítios da internet oficiais para enquadramento das RB portuguesas na Rede Mundial das Reservas da Biosfera da UNESCO	QP	-
Elaboração de relatório	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório do Contexto Geoestratégico	x		

Observações: Relatório editado e entregue

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Executado		

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 000,00€	5 877,28€	73,74%	7 978,90€	99,74%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
88,00€	29,33€	33,33%	88,00€	100,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID4_História das Reservas da Biosfera

Início | 12/11/2020

Fim | 01/11/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Desenho de roteiro de investigação	UNL-FCSH	-
Realização de entrevistas com os responsáveis das RB – fase 1	UNL-FCSH	-
Elaboração de textos resumidos acerca das RB a integrar no site do projeto.	UNL-FCSH	-
Análise dos processos de candidatura das RB	UNL-FCSH	-
Levantamento da legislação relativa às RB	UNL-FCSH	-
Levantamento bibliográfico e inscrição em tabelas Excel e BD	UNL-FCSH	-
Pesquisa bibliográfica em bibliotecas nacionais	UNL-FCSH	-
Realização de pesquisa bibliográfica em repositórios de teses e artigos científicos sobre produção científica realizada no âmbito das RB	UNL-FCSH	-
Pesquisa de iconografia em arquivos de fotografia	UNL-FCSH	-
Pesquisa em arquivos audiovisuais	UNL-FCSH	-
Investigação em arquivos e bibliotecas em Castro Verde	UNL-FCSH	-

Resultados obtidos	Evidências
Resumos das RB para site	Texto-síntese referente a cada RB.
Relatório trabalho de campo Castro Verde (24 a 29 de maio de 2021)	Documento
Conteúdos em bases de dados e folhas de cálculo	Base de dados
Resumos críticos das entrevistas realizadas online	Documento e base de dados
Resumos críticos das entrevistas realizadas em Castro Verde	Documento / Relatório Castro Verde e Bases de dados
Entrevistas	Registo audiovisual

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Publicações		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Relatório Intercalar n.º 2

09_CALL#3 - Reservas da Biosfera. Territórios sustentáveis, comunidades resilientes.

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
15 718,00€	3 010,32€	19,15%	4 013,32€	25,53%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 900,00€	366,02€	4,63%	366,02€	4,63%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID5_Elaboração de um plano de gestão de dados:FAIR data – acesso aberto

Início | 12/11/2020 Fim | 30/06/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação e seleção das ferramentas de plano de gestão de dados	UNL-FCSH	-
Elaboração de ficha / template	UNL-FCSH	-
Preenchimento das fichas pelos parceiros	UNL-FCSH QP; UC; IPN; OBio; Keep	-
Reunião de definição estratégica para elaboração plano de dados	UNL-FCSH QP; UC; IPN; OBio; Keep	-
Webinar de apoio ao preenchimento das fichas	UNL-FCSH QP; UC; IPN; OBio; Keep	-
Normalização e validação técnica das fichas	UNL-FCSH	-
Definição de prioridade de revisão e de funções dos parceiros	UNL-FCSH QP; UC; IPN; OBio; Keep	-
Reuniões bilaterais com os parceiros	UNL-FCSH	-
Elaboração e disponibilização da primeira versão do plano de gestão de dados	UNL-FCSH	-
Sessão de reflexão para a definição de uma política e manual de acesso aberto para o projeto	UNL-FCSH	-

Resultados obtidos	Evidências
Apresentação do plano de dados	Documento + powerpoint
Fichas de caracterização de dados individual e por equipa	Folhas Excel
Plano de gestão de dados	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Disponibilização do Plano de Gestão de Dados	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Website	x		

Observações: Relatório editado e entregue

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Executado	-	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	2.532,85€	105,88%	2.532,85€	105,88%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID6_Ausculção/Perceção e identificação do património

Início | 12/11/2020

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Definição das infraestruturas, bases de dados e outros recursos de recolha de informação sobre património cultural	UNL-FCSH	-
Lançamento de edital de contratação de um investigador	UNL-FCSH	-
Produção do inquérito aos visitantes - papel e online	UNL-FCSH Keep; UC	-

Resultados obtidos	Evidências
Inquérito aos visitantes	Documento
Inquérito aos parceiros locais	Documento
Inquérito aos visitantes - formulário on-line	form online

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Inquéritos aplicados		x	
Meta	300		x	
Fonte de verificação	Relatório de Análise		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	1 187,56€	49,64%	1.187,56€	49,64%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 480,00€	366,02€	3,86%	366,02€	3,86%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID7_Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento sustentável (PDS) das RB

Início | 01/03/2021 Fim | 31/10/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Pesquisa de PDS (análise de benchmarking)	QP	-
Contacto com gestores de RB da Rede Mundial das Reservas da Biosfera da UNESCO	QP	RB de Fuerteventura, Espanha RB da Ilha do Príncipe
Desenho do modelo de elaboração dos PDS (conceito)	QP	-
Apresentação do conceito aos gestores das RB	QP	11-05-2021 – RB do Corvo, Flores, Graciosa e Fajãs de S. Jorge
		18-05-2021 – RB Santana
		24-05-2021 – RB Castro Verde
		23-06-2021 – RB Gerês/ Xurés

Resultados obtidos	Evidências
Troca de informações/ contributos	Ata Registo efetuado no ficheiro "Registo_eventos" Informação disponibilizada na drive do Projeto
Consolidação do conceito de PDS	Integração dos contributos no conceito/ relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	PDS consultados		x	
Meta	10		x	
Fonte de verificação	Relatório do Conceito dos PDS		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização dos contactos com os gestores das RB
		Consolidação do conceito de PDS
		Elaboração e edição de Relatório do Conceito dos PDS

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 040,00€	3 323,78€	41,34%	3 323,78€	41,34%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
84,00€	84,00€	100,00%	84,00€	100,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID8_Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS

Início | 01/05/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação das atividades com metodologias participativas e das práticas participativas previstas	QP	-
Identificação de práticas participativas utilizadas nas RB	QP	-
Desenvolvimento da metodologia participativa para os PDS	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para o relatório	Contributos para relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Metodologia desenvolvida		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório do Modelo Participativo		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Realização de encontro com os parceiros nacionais para estabilização e consolidação da metodologia participativa a propor
		Elaboração e edição de Relatório do Modelo Participativo

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 780,00€	3 243,30€	56,11%	3 243,30€	56,11%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
62,00€	41,33€	66,66%	41,33€	66,66%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID10_Infraestrutura Digital – Modelo de gestão distribuída

Início | 01/01/2021 Fim | 30/06/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de fontes de informação e de contribuição de dados	UNL-FCSH	
Identificação e análise comparada de soluções tecnológicas	UNL-FCSH	
Elaboração de arquitetura de informação	UNL-FCSH	
Modelo de gestão da infraestrutura - Manual de procedimentos	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Análise e organização da informação recolhida sobre fontes de informação e recolha de dados	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Ajustamento na análise de soluções tecnológicas por adiamento do diálogo e visita às reservas para recolha de informação relativa às respetivas infraestruturas / portais	Adiamento da conclusão da atividade para 30 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Orientação/ Manual de procedimentos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação do processo de auscultação e recolha de informação junto das RB e outras entidades

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID11_Infraestrutura Digital – Website das Reservas da Biosfera

Início | 12/11/2020

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Desenho da estrutura de site de apresentação do Projeto	UNL-FCSH	
Produção e organização de conteúdos para site de apresentação do Projeto	UNL-FCSH	
Acompanhamento da produção do site de apresentação do Projeto	UNL-FCSH	
Conclusão do site de apresentação do Projeto	UNL-FCSH	
Agregação de conteúdos gráficos para integração do website	UNL-FCSH QP; UC; IPN; OBio; Keep	Todas as RB

Resultados obtidos	Evidências
Sítio de apresentação do projeto - www.reservasdabiosfera.pt	Website

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lançamento de Website		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 490,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
64 575,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID12_Infraestrutura Digital – Dashboard de gestão de indicadores

Início | 12/11/2020

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Lançamento de edital e processo e contratação de um bolsheiro de investigação	UNL-FCSH	
Reuniões entre parceiros para identificação e seleção de indicadores e harmonização de fornecedores de conteúdos	UNL-FCSH	
Definição de indicadores	UNL-FCSH QP; UC; Keep	

Resultados obtidos	Evidências
Identificação e análise de infraestruturas, bases de dados e outros recursos de recolha de dados	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Disponibilização de dashbaord de indicadores		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Estabilização da definição de indicadores e recolha de informação / dados.
		Definição de metodologias de análise e interpretação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 490,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
24 600,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID13_Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera

Início | 01/05/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de repositórios de dados / infraestruturas de investigação	UNL-FCSH	
Identificação de projetos de investigação promovidos ou associados às RB	UNL-FCSH	
Identificação e análise de dados produzidos pelo Projeto	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Conteúdos em bases de dados e folhas de cálculo	Base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Catálogo online criado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	552,32€	23,09%	552,32€	23,09%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID14_Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera

Início | 01/01/2021

Fim | 30/01/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de conteúdos nas plataformas e instituições culturais e integração em base de dados	UNL-FCSH	
Reuniões de articulação com Atividade 35	UNL-FCSH QP	
Identificação de conteúdos nas plataformas e instituições património natural e integração em base de dados	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Conteúdos em folhas de dados e bases de dados	Documento base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Guias/ roteiros realizados		x	
Meta	15		x	
Fonte de verificação	Website ou Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Mapeamento / roteiro de fontes e documentos

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
16 333,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID15_Mapeamento da diversidade de ecossistemas das RB

Início | 12/11/2020 Fim | 30/09/2021

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	-
Análise da informação de base sobre as Reservas da Biosfera	CFE-UC	-
Comunicação oral no congresso EGU em que se apresentou o modelo conceptual para a avaliação dos SE	CFE-UC Universidade de Bergen	-
Definição do sistema de classificação dos ecossistemas/habitats	CFE-UC Universidade de Bergen	-
Identificação dos habitats/ecossistemas a delimitar e/ou reclassificar (em curso)	CFE-UC	-

Resultados obtidos	Evidências
Apresentação do modelo conceptual para a avaliação dos SE no EGU	Pdf "Alves et al_EGU" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1Qvuhlgiv4ruK1a6F8c-sEI-qQ4oqHeBK/view?usp=sharing
Lista de habitats do Anexo I da directiva habitats presentes em cada RB	Excel "Habitats Directive_Annex I listed habitats" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1Z3L-f4nm8t_ZBzIVNO0vr-O9O2nsjkW/view?usp=sharing
Elaboração das "crosswalks" entre os habitats da diretiva e o EUNIS e MAES-COS	Excel "Crosswalks_HD_MAES_EUNIS_COS" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1VZ4PINyGOcoq4ulmj54a-Z1rKedodDK/view?usp=sharing
Lista de elementos constante na GeoDatabase	Excel "GeoDatabase elements" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/10_qzwujf3boIO39abWLLNCjgcJAF7YsX/view?usp=sharing

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Mapas de composição de ecossistemas / habitats		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de Relatório de Atividades

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 261,82€	13 483,28€	78,11%	13 483,28€	78,11%
Nota: Dado não terem sido reportados custos com recursos humanos no Relatório Intercalar 1 o montante agora apresentado reporta-se aos dois períodos de avaliação.				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 628,00€	0,00€	0,00%	4 628,00€	100,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	0,00€	0,00%	901,75€	35,15%
Nota: As despesas ocorridas neste período de avaliação serão apresentadas no próximo Relatório Intercalar.				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 985,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	v

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID16_Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas

Início | 01/01/2021

Fim | 30/11/2021

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	
Análise da estrutura analítica do MAES, CICES e IPBES e sua interligação com o COS e ecossistemas MAES	CFE-UC	
Identificação dos serviços dos ecossistemas potenciais associados a cada habitat EUNIS em termos gerais	CFE-UC Universidade de Bergen	

Resultados obtidos	Evidências
Lista de serviços de ecossistemas potenciais providenciados por cada habitat/ecossistema COS - MAES/EUNIS e Diretiva Habitats segundo a estrutura analítica do MAES	Excel "ES_potential_identification_COS" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1cKvQwT2lYQgGCukQQJls33fVTy1gO6x/view?usp=sharing

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de serviços de ecossistema potenciais		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 698,42€	8 432,68€	57,37%	8 432,68€	57,37%
Nota: Dado não terem sido reportados custos com recursos humanos no Relatório Intercalar 1 o montante agora apresentado reporta-se aos dois períodos de avaliação.				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	0,00€	0,00%	901,75€	35,15%
Nota: As despesas ocorridas neste período de avaliação serão apresentadas para o próximo Relatório Intercalar.				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID17_Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico

Início | 01/01/2021 Fim | 31/10/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Recolha e tratamento de informação estatística	QP	-
Análise documental – Informação disponibilizada pelas entidades gestoras das 11 RB	QP	
Elaboração de grelha de informação qualitativa e de guião de inquérito por questionário on-line	QP	
Reuniões com equipas de parceiros	QP UC; UNL-FCSH; IPN	

Resultados obtidos	Evidências
Painel de indicadores estatísticos para cada uma das RB	Contributo para Relatório final da atividade
Guião de inquérito por questionário on-line	Inquérito por questionário on-line

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Aplicação de inquérito por questionário online
		Análise e tratamento dos resultados dos inquéritos por questionário
		Integração de diversa informação quantitativa e qualitativa recolhida
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 254,50€	1 679,32€	26,85%	1 931,40€	30,88%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 283,80	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
80,00	32,00€	40,00%	48,00€	46,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID18_Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas Reservas da Biosfera (RB)

Início | 01/01/2021 Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Foram identificadas as RB com as quais fazer as primeiras reuniões de trabalho (em formato remoto) bem como os participantes nas respetivas reuniões	IPN QP	
Compilação e análise de informação relativa às RB Meseta Ibérica e Santana;	IPN	
Reunião formato remoto com RB Meseta Ibérica e RB Santana com o objetivo de conhecer o trabalho da Reserva, os mais importantes atores locais e as dinâmicas de interação entre a RB e os seus principais "stakeholders";	IPN	RB Meseta Ibérica - Ana Carvalho e Joana Branco RB Santana - Isabel Caldeira
Reunião formato remoto com QP com o objetivo de identificar a complementaridade entre tarefas das atividades ID17 e ID20 (QP) e ID18 (IPN);	IPN QP	

Resultados obtidos	Evidências
Reuniões com RB (Meseta Ibérica e Santana)	Troca de mails para marcação das reuniões, fotos das reuniões e relatório pós-reunião
Reunião com parceiro do projeto (QP)	Troca de mails para marcação da reunião e foto da reunião

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização de reuniões com as RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 572,53€	5 493,63€	29,58%	11 577,40€	62,34%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
953,52€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID19_ Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável

Início | 01/01/2021 Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Foram identificadas as RB com as quais fazer as primeiras reuniões de trabalho (em formato remoto) bem como os participantes nas respetivas reuniões;	IPN QP	
Compilação e análise de informação relativa às RB Meseta Ibérica e Santana;	IPN	
Reuniões em formato remoto com RB Meseta Ibérica e RB Santana, com o objetivo de identificar boas práticas de I&DT, Inovação e Empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável;	IPN	RB Meseta Ibérica - Ana Carvalho e Joana Branco RB Santana - Isabel Caldeira
Reunião formato remoto com QP com o objetivo de identificar a complementaridade entre tarefas das atividades 17 e 20 (QP) e 19 (IPN);	IPN QP	

Resultados obtidos	Evidências
Reuniões com RB (Meseta Ibérica e Santana)	Troca de mails para marcação das reuniões, fotos das reuniões e relatório pós-reunião;
Reunião com parceiro do projeto (QP)	Troca de mails para marcação da reunião e foto da reunião;

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização de reuniões com as RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 572,53€	6 574,78€	35,40%	6 886,73€	37,08%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
953,52 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID20_Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade

Início | 01/05/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Análise documental – documentação disponibilizada pelas entidades gestoras das 11 RB	QP	-
Reunião com outros parceiros	QP UC; UNL-FCSH; IPN	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação aprofundada sobre estratégia e prospetiva relativamente às 11 RB	Contributos para relatório da atividade

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Entrevistas com Gestores das 11 Reservas da biosfera
		Análise e tratamento dos resultados das entrevistas
		Integração de diversa informação recolhida

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 840,00€	550,92€	8,05%	550,92€	8,05%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 979,75€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
126,00€	31,50€	25,00%	31,50€	25,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID21_Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB

Início | 01/03/2021

Fim | 30/04/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra, Universidade de Bergen e Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	-
Desenvolvimento da metodologia multi-ator para identificação de SE chave	CFE-UC Universidade de Bergen	-
Elaboração de questionários (em curso)	CFE-UC Universidade de Bergen	-
Saída de campo a Castro Verde para desenvolvimento da estratégia participativa, reunião com a entidade gestora e participação nas entrevistas conduzidas pela UNL-FCSH	CFE-UC UNL-FCSH; Keep	RB Castro Verde

Resultados obtidos	Evidências
Identificação de aspetos identitários, objetivos e prioridades das RB	Excel "Identification of identity aspects, objectives and priorities of BRs". Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1QFaYDLR0JV4LPpF38qXJPSLjvKmqE6aj/view?usp=sharing
Metodologia multi-ator para identificação de SE chave	Pdf "Portuguese RBs project - participatory methodology" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1Eo51HW02opls867U9awyYIKMU_yCKLHb/view?usp=sharing
Metodologia para a execução de um workshop participativo	Pdf "Guiao_Workshop_participativo" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1GPcArgucJsc0AGxTCi5eatZcB7Qc6BS7/view?usp=sharing
Revisão bibliográfica sobre metodologias participativas	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de serviços de ecossistema chave para as RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 638,68€	9 065,75€	51,40%	9 065,75€	51,40%
Nota: Dado não terem sido reportados custos com recursos humanos no Relatório Intercalar 1 o montante agora apresentado reporta-se aos dois períodos de avaliação				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
23 141,00€	128,01€	0,55%	128,01€	0,55%
Nota: O valor do executado será pago nos vencimentos de julho e agosto				

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 100,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73,00€	Nota: As despesas ocorridas neste período de avaliação serão apresentadas no Próximo Relatório Intercalar.			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	v
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 832,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 045,52€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	v
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID22_ Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE

Início | 01/06/2021

Fim | 30/04/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	CFE-UC	-
Revisão bibliográfica de indicadores de avaliação da condição/estado dos SE	CFE-UC Universidade de Bergen	-

Resultados obtidos	Evidências
Definição da estratégia de execução da atividade e interligação entre os elementos da equipa na execução das tarefas planeadas	Pdf "May meeting internal" Informação disponibilizada na drive do Projeto (UC/Evidências) https://drive.google.com/file/d/1erqwQU85rnZhMR7iMDfpooEalgP0kn8n/view?usp=sharing
Revisão bibliográfica de indicadores de avaliação da condição/estado dos SE	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de indicadores e Metodologia para a avaliação da condição dos SE		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividade		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
19 103,59€	1 404,74€	7,35%	1 404,74€	7,35%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	Nota: As despesas ocorridas neste período de avaliação serão apresentadas no Próximo Relatório Intercalar.			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID35_Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)

Início | 01/06/2021 Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Participação em reuniões de trabalho com as RB	QP	24-05-2021 - RB Castro Verde 23-06-2021 – RB Gerês/ Xurés
Deslocações às RB para inventários e entrevistas	QP	RB Castro Verde RB Gerês/ Xurés
Compilação de informação geral sobre os territórios onde estão localizadas as RB	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Informação recolhida através das reuniões realizadas com os gestores das RB	Registos das informações recolhidas
Informação recolhida relativa às RB de Castro Verde e Gerês/ Xurés, nomeadamente: biodiversidade, paisagem, património cultural e histórico, infraestruturas, acessibilidades e serviços	Compilação da informação obtida Registos fotográficos disponíveis na drive do Projeto
Diversa informação recolhida através da consulta de documentação disponível em publicações e em websites	Compilação da informação consultada

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Roteiros criados		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Roteiros Turísticos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso Deslocações às RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 307,86€	465,47€	3,78%	465,47€	3,78%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 567,60	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID36_Memórias e identidades – registo sistematizado de memórias – (integra catálogo de ações piloto)

Início | 12/11/2020

Fim | 30/09/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Seleção e aquisição software audiovisual (Riverside): recolha de entrevistas fase 1 - online	UNL-FSCH Keep	
Realização de entrevistas com os responsáveis das RB - fase 1	UNL-FSCH Keep	Todas as RB
Edição de entrevistas com os responsáveis das RB - fase 1	UNL-FSCH Keep	
Validação das entrevistas com os responsáveis das RB - fase 1	UNL-FSCH Keep	Todas as RB
Preparação e organização do projeto piloto - Castro Verde	UNL-FSCH Keep	RB Castro Verde
Produção de materiais de apresentação atividade recolha de memórias em Castro Verde	UNL-FSCH Keep	
Sessão de apresentação do Projeto às RB e Comunidades: Castro Verde	UNL-FSCH Keep	RB Castro Verde
Recolha local de entrevistas - Dias da Memória: Castro Verde	UNL-FSCH Keep	RB Castro Verde
Recolha de testemunhos materiais - fotografias e objetos - Reserva de Castro Verde	UNL-FSCH Keep	RB Castro Verde
Trabalho de Campo na RB Castro Verde: auscultação e reuniões com comunidade local	UNL-FSCH Keep	RB Castro Verde
Ação de formação junto das RB e Comunidades - Training actions: Castro Verde	UNL-FSCH Keep	RB Castro Verde
Caracterização e integração em base de dados de elementos relativos às entidades de Castro Verde	UNL-FSCH Keep	
Tratamento e edição das entrevistas Castro Verde	UNL-FSCH Keep	
Relatório Trabalho de Campo em Castro Verde I (24 a 29 de maio de 2021)	UNL-FSCH Keep	
Validação das entrevistas Castro Verde	UNL-FSCH Keep	
Preparação e realização de ação de formação em história oral e recolha de memórias e testemunhos na conferência dedicada às Reservas da Biosfera realizada em Serralves	UNL-FSCH Keep	Todas as RB

Resultados obtidos	Evidências
Guião das entrevistas aos agricultores - Castro Verde	Documento
Guião das entrevistas RB Berlengas	Documento
Relatório anexo trabalho de campo Castro Verde (24 a 29 de maio de 2021)	Documento
Guião das entrevistas RB Castro verde	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Entrevistas realizadas		x	
Meta	165		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Convite à recolha de memórias
		Apresentação local do projeto de registo de memórias.
		Realização de Dias da Memória

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
28 510,00€	1 582,07€	5,54%	1 582,07€	5,54%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
28 645,00€	732,03€	2,55%	732,03€	2,55%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 429,90	3 498,33€	37,10%	3 498,33€	37,10%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 450,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID37_Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)

Início | 01/05/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Apresentação proposta de projeto piloto em Castro Verde	UNL-FCSH Keep	

Resultados obtidos	Evidências
Definição de estratégia com RB Castro Verde	Documento
Diversa informação recolhida e inscrita em tabelas e base de dados	Folhas de calculo e base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Centros de memória criados		x	
Meta	3		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
		Desenvolvimento da proposta e implementação em Castro Verde
		Apresentação de propostas noutras RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID45_Referencial de certificação em sustentabilidade – Reservas da Biosfera Portuguesas

Início | 12/11/2020 Fim | 11/04/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Lançamento do inquérito sobre Turismo nas RB	QP	-
Continuação dos trabalhos relacionados com a análise de benchmarking sobre as RB com o objetivo de analisar as melhores práticas utilizadas nas RB mundiais, nomeadamente ao nível da sustentabilidade e de sistemas de certificação em turismo sustentável	QP	-
Participação em reuniões de trabalho com as RB	QP	24-05-2021 - RB Castro Verde 23-06-2021 – RB Gerês/ Xurés
Participação em workshop com as RB	QP UC; UNL-FCSH	RB Castro Verde
Deslocações às RB para inventários e entrevistas	QP	RB Castro Verde RB Gerês/ Xurés
Compilação de informação geral sobre os territórios onde estão localizadas as RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação recolhida através das reuniões realizadas com os gestores das RB	Registos das informações recolhidas
Discussão presencial com a sociedade civil sobre o projeto RB	Registos fotográficos disponíveis na drive do Projeto
Informação recolhida através da análise de consulta de documentação disponível e consulta a websites de RB mundiais	Registos em formato excel sobre a análise de benchmark
Compilação e início do trabalho de análise dos dados recolhidos no inquérito sobre Turismo nas RB	Formulário do inquérito Respostas aos inquéritos
Informação recolhida relativa às RB de Castro Verde e Gerês/ Xurés, nomeadamente: biodiversidade, paisagem, património cultural e histórico, infraestruturas, acessibilidades e serviços	Compilação da informação obtida Registos fotográficos disponíveis na drive do Projeto
Diversa informação recolhida através da consulta de documentação disponível em publicações e em websites	Compilação da informação consultada

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Referencial e respetivo quadro normativo		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório Referencial Normativo e Manuais de Boas Práticas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso Deslocações às RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 064,14	3 510,43	29,10%	6 847,87€	56,76%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 422,18	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID46_Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento

Início | 01/04/2021

Fim | 31/10/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Afinação metodológica	QP	-
Análise documental	QP	-
Construção dos instrumentos de recolha de informação	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Recolha e análise documental	-
Afinação metodológica	Quadro metodológico
Seleção de documentos-chave	Listagem de documentação a analisar
Instrumentos de inquirição para validação	Primeira versão do guião de entrevista e do inquérito aos gestores das reservas

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da recolha e análise documental
		Afinação metodológica
		Elaboração dos instrumentos de recolha de informação relativamente ao diagnóstico de necessidade de competências e de formação para os grupos de destinatários
		Elaboração e edição de Relatório do Diagnóstico de necessidades

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
19 140,00€	857,24€	4,48%	857,24€	4,48%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 433,27€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
174,00€	74,58€	42,86%	74,58€	42,86%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID48_Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS

Início | 01/05/2021

Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB e demais informação recebida	QP	
Recolha e análise documental sobre metodologias participativas	QP	
Análise de boas práticas	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Identificação das formações realizadas destinadas aos gestores das reservas	Listagem das formações realizadas
Identificação dos documentos-chave a consultar	Listagem de documentos chave a consultar
Instrumentos para análise de boas práticas	Ficha de recolha de boas práticas

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Pessoas abrangidas na formação		x	
Meta	100		x	
Fonte de verificação	Relatório de Execução da Formação e Certificados Emitidos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração do esboço de planeamento de formações articulado com a atividade ID46

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 900,00€	203,18€	2,05%	203,18€	2,05%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 794,36€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
70,00€	7,78€	11,11%	7,78€	11,11%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID56_Elaboração da Estratégia de Marketing

Início | 12/11/2020 Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Análise e integração dos contributos recebidos das RB	QP	RB Corvo RB Flores RB Santana RBT Tejo/ Tajo Internacional RB Castro Verde
Elaboração da revisão da Estratégia e Marketing	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Contributos das RB para o documento	Registo de correspondência
Revisão do documento de Relatório da Estratégia de Marketing	Relatório em alteração

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório da Estratégia de Marketing	x		

Observações: Considera-se que com a entrega do relatório da Estratégia de Marketing o indicador e a meta se encontram executados, apesar do documento se encontrar em revisão após consulta às RB e entrada de um novo consultor para a área da comunicação.

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Revisão e edição de Relatório da Estratégia de Marketing

Progressão financeira

Nota: O "Executado" durante o período de avaliação do presente relatório reporta-se exclusivamente às verbas das despesas da QP ocorridas no período entre 1 de maio e 30 de junho, sendo que o valor apresentado no "Executado acumulado" engloba as verbas das despesas globais da atividade, incluindo por isso as despesas executadas pelo parceiro PC&A entre 12 de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021.

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 322,63€	898,44€	10,80%	7 821,07€	93,97%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 500,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 500,00€	0,00€	0,00%	1 000,00€	28,57%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID57_Conceção do Plano de Comunicação

Início | 01/01/2021 Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Revisitação dos contributos dos Parceiros para o Plano de Comunicação do Projeto	QP UC; UNL-FCSH; IPN; OBio; Keep	-
Conceção e entrega do Plano de Comunicação do Projeto	QP	-
Definição de conteúdos chave para o Plano de Comunicação das RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Plano de Comunicação do Projeto	Informação disponibilizada na drive do Projeto (Comunicação_imagem)
Conceção da estrutura e conteúdos do Plano de Comunicação das RB	Contributos para o relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Plano de Comunicação		x	

Observações: Apesar de não considerado um produto formal do Projeto regista-se a entrega do Plano de Comunicação do Projeto

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Atualização do Plano de Comunicação do Projeto
		Elaboração e edição de Plano de Comunicação das RB
		Consulta às RB sobre o Plano de Comunicação das RB
		Revisão do Plano de Comunicação das RB

Progressão financeira

Nota: O "Executado" durante o período de avaliação do presente relatório reporta-se exclusivamente às verbas das despesas da QP ocorridas no período entre 1 de maio e 30 de junho, sendo que o valor apresentado no "Executado acumulado" engloba as verbas das despesas globais da atividade, incluindo por isso as despesas executadas pelo parceiro PC&A entre 12 de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021.

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 028,01€	859,81€	12,23%	6 487,82€	92,31%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 500,00€	1 400,00€	18,68%	5 400,00€	72,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID58_Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)

Início | 01/03/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Desenvolvimento criativo da identidade de marca	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Definição de estratégia para a identidade de marca	Contributos para o relatório
Esboço de brandbook	

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	2		x	
Fonte de verificação	Manual de Identidade Corporativa		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Apresentação de proposta de identidade de marca
		Elaboração e edição do relatório Manual de Identidade Corporativa

Progressão financeira

Nota: O "Executado" durante o período de avaliação do presente relatório reporta-se exclusivamente às verbas das despesas da QP ocorridas no período entre 1 de maio e 30 de junho, sendo que o valor apresentado no "Executado acumulado" engloba as verbas das despesas globais da atividade, incluindo por isso as despesas executadas pelo parceiro PC&A entre 12 de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021.

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 035,15€	981,72€	10,84%	8 234,87€	90,96%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 095,95€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 600,00€	0,00€	0,00%	6 600,00€	100,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID59_Desenvolvimento Criativo Genérico

Início | 01/06/2021

Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Criação da linha gráfica do Projeto	QP	-
Criação do manual de normas da linha gráfica do Projeto	QP	-
Criação de conteúdos para aplicações diversas	QP UC; UNL-FCSH; IPN; OBio; Keep	+

Resultados obtidos	Evidências
Linha gráfica do Projeto	Informação disponibilizada na drive do Projeto (Comunicação_imagem)
Conceção de base da imagem e tipo de mensagens-chave a utilizar em aplicações diversas	Exercícios efetuados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o Plano de Comunicação em fase final de execução	Adiamento da conclusão da atividade para 31 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	25		x	
Fonte de verificação	Metas finais		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Edição de artes finais

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 400,00€	172,62€	2,33%	172,62€	2,33%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 095,95€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 600,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID60_Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital

Início | 01/06/2021

Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Conceção da Estratégia e Gestão de Redes Sociais	QP	
Criação de conteúdos	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Preparação do lançamento das redes sociais do Projeto	Facebook; LinkedIn; Instagram
Criação de Comunidade	

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o Plano de Comunicação em fase final de execução	Adiamento da conclusão da atividade para 31 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	10		x	
Fonte de verificação	Artes finais		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
		Elaboração e edição da Estratégia e Gestão de Redes Sociais
		Continuação da realização das tarefas em curso
		Edição de artes finais

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 100,00€	172,62€	2,83%	172,62€	2,83%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
438,38€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 400,00€	1 400,00€	21,88%	1 400,00€	21,88%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID61_Produções e Materiais de divulgação - Offline

Início | 01/06/2021

Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Produção de conteúdos para materiais de divulgação (postais e flyers)	QP UNL-FCSH; UC	
Criação de maquete gráfica	QP UNL_FSCH	

Resultados obtidos	Evidências
Edição de postais e flyers	Coleção de postais "Reservas da Biosfera. Territórios sustentáveis, comunidades resilientes", postal "Memórias das RB (ID36) e flyers "Memória para todos" – Informação disponibilizada na drive do Projeto (Comunicação_imagem)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o Plano de Comunicação em fase final de execução	Adiamento da conclusão da atividade para 31 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	14		x	
Fonte de verificação	Manual; livro		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação de criação, produção e edição de peças de comunicação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 300,00€	172,62€	3,26%	172,62€	3,26%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
84 125,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID62_Produções e Materiais de divulgação - Online

Início | 01/06/2021

Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Aplicação da linha gráfica do Projeto ao website	QP UC; UNL-FSCH; IPN; OBio; Keep	
Criação de conteúdos	QP UC; UNL-FSCH; IPN; OBio; Keep	

Resultados obtidos	Evidências
Lançamento do website do Projeto em associação com a ID11	Website

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o Plano de Comunicação em fase final de execução	Adiamento da conclusão da atividade para 31 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	4		x	
Fonte de verificação	Website, Mapas, Roteiros, Concursos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação de criação, produção e edição de peças de comunicação
		Inserção de conteúdos nas redes sociais e website

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 600,00€	172,62€	3,08%	172,62€	3,08%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
57 625,00€	1 400,00€	2,43%	1 400,00€	2,43%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID71_Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos

Início | 01/01/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Continuação da consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB e demais informação recebida	QP	-
Continuação da análise documental	QP	-
Análise de boas práticas	QP	-
Elaboração da primeira versão do Plano de Sensibilização	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Identificação das práticas locais ao nível da sensibilização e educação ambiental	Listagem de práticas identificadas nas reservas
Instrumentos para análise de boas práticas	Ficha de recolha de boas práticas
Elaboração do Plano de Sensibilização – versão preliminar	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório do Plano de Sensibilização		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
		Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de relatório Plano de Sensibilização

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 228,30	321,47€	26,17%	385,76€	31,41%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID74_Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera

Início | 01/02/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões para a escolha das comissões de organização e científica das Olimpíadas das Reservas da Biosfera	OBio	
Elaboração do primeiro rascunho de Regulamento das Olimpíadas das Reservas da Biosfera	OBio	
Reunião com equipa de comunicação para seleção do layout do site	OBio restantes Parceiros	
Definição da estrutura do website para divulgação	OBio	

Resultados obtidos	Evidências
Regulamento das Olimpíadas da Biosfera	Documento - Regulamento
Listagem da Comissão Organizadora	Documento
Listagem da Comissão Científica	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Design e criação do website	Não foi possível reunir com empresas para a auscultação do serviço, sendo que será necessário tempo para cumprir os trâmites legais financeiros.	Aumentar o tempo previsto para a execução da tarefa, até 30 de setembro
Divulgação junto das escolas e sociedade civil	Pandemia alterou o calendário escolar, assim como a disponibilidade para reunir e divulgar as olimpíadas RB junto das escolas	Aumentar o tempo previsto para a execução da tarefa, até 30 de setembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Olimpíadas das RB realizada		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Inscrição efetuadas de alunos e de escolas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Construção do website
		Divulgação do evento junto das escolas, do website do projeto e da sociedade civil
		Elaboração e edição de Relatório de Planeamento das Olimpíadas

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 581,67€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto.			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID75_Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB

Início | 01/03/2021

Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação dos parceiros para a divulgação	OBio restantes Parceiros	

Resultados obtidos	Evidências
Informação à DGE sobre a realização da Olimpíada no próximo ano letivo	Contactos realizados por telefone
Informação através da rede de parceiros do Projeto	Informação presente no site do Projeto

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Divulgação, comunicação e disseminação das olimpíadas RB	A pandemia afetou e alterou o calendário escolar e disponibilidade de divulgação presencial	Alterar a data de conclusão da tarefa para 30 de novembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Entidades/ pessoas contactadas		x	
Meta	1000		x	
Fonte de verificação	Site do Projeto: consulta da "área" específica das Olimpíadas / inscrições efetuadas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Divulgação do evento através do site do Projeto
		Divulgação do evento através do website das Olimpíadas das reservas da Biosfera
		Divulgação do evento através dos contactos de professores do Centro de Formação da Ordem dos Biólogos
		Divulgação do Evento através da Direção-Geral de Educação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
500,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 000,0€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID77_Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera

Início | 01/04/2021

Fim | 30/09/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Análise documental – documentação disponibilizada pelas entidades gestoras das 11 RB	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Informação relativa às 11 RB	Contributos para preparação da atividade

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Eventos realizados		x	
Meta	3		x	
Fonte de verificação	Relatório de realização da 1ª edição da Rede de Festivais de Artes e Cultura das Reservas da Biosfera de Portugal/ Dossier de clipping		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Recolha de informação sobre dinâmica de eventos nas 11 RB (questionário on-line aplicado na atividade ID17 e entrevistas aplicadas na atividade ID20)
		Tratamento de informação qualitativa

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
10 400,00€	382,42€	3,68%	382,42€	3,68%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 422,18€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
60,00€	9,99€	16,65%	9,99€	16,65%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID80_Extensão do conhecimento

Início | 12/11/2021 Fim | 30/05/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Definição de estratégia integrada para a extensão do conhecimento.	Keep	-
Identificação, caracterização e envolvimento de parceiros - local, regional, nacional.	Keep UNL-FCSH	-
Diagnóstico atividades e estratégia RB portuguesas	Keep UNL-FCSH	Todas as RB
Levantamento/diagnóstico e benchmark internacional	Keep	-
Roadmap para estratégia colaborativa de extensão do conhecimento (estratégia da ação)	Keep	-
Trabalho de Campo na RB Castro Verde	Keep UNL-FCSH	24 a 30 -05-2021 - RB de Castro Verde
Caracterização sociodemográfica, económica e cultural.	Keep UNL-FCSH	24 a 30 -05-2021 - RB de Castro Verde
Apresentação da ação em cada RB - objetivos e metodologia	Keep	-
Definição de estratégia integrada para a extensão do conhecimento.	Keep	-

Resultados obtidos	Evidências
Levantamento de atividades das RB (fontes: plano de ação das RB, Entrevistas aos responsáveis RB, relatórios anuais).	12 documentos parametrizados onde se introduz e sistematiza a informação recolhida
Participação em entrevistas on-line com responsáveis das RB e outros parceiros locais.	14 entrevistas com 11 RB: Castro Verde, Santana, Paul do Boquilobo, Tejo/ Tajo Internacional, Berlengas, Flores, Graciosa, Corvo, Fajãs de S. Jorge, Gerês/ Xurés, Meseta Ibérica (plano detalhado na ficha de contributos)
Participação em entrevistas no âmbito a atividade 36 da UNL-FCSH "Memórias das reservas das RB"	26 entrevistas na semana de trabalho de campo em Castro Verde (plano detalhado na ficha de contributos)
Benchmark internacional - exemplos internacionais de desenvolvimento de projetos e iniciativas de extensão do conhecimento no âmbito das Reservas da Biosfera da Unesco realizada sobretudo com recurso à pesquisa online.	Documento parametrizado onde se introduz e sistematiza a informação recolhida.
Elaboração de um documento / planificação de atividades	Documento com cronograma.
Reunião de trabalho com Agrupamento de Escolas de Castro Verde	Plano de ação e atividades a desenvolver no ano letivo 2021/22 (em elaboração).
Reunião de trabalho com a Universidade Sénior de Castro Verde	Plano de ação e atividades a desenvolver no ano letivo 2021/22 (em elaboração).
Planificação, organização e execução de atividades para o trabalho de campo na RB Castro Verde	Relatório do Trabalho de Campo de Castro Verde (RTC_CV_0.1.0)
Contributos para realização do relatório do trabalho de campo em Castro Verde	Relatório do Trabalho de Campo de Castro Verde (RTC_CV_0.1.0)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Trabalho de campo nas RB	Devido à atual situação pandémica só foi possível iniciar estes trabalhos em maio com RB de Castro Verde (24 a 30). Este atraso não implica alteração do cronograma da atividade.	Estão agendadas: 23 de julho - Paul do Boquilobo 13 a 18 de setembro – Meseta Ibérica Restantes RB pendente agendamento.

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Ações de formação		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 mar 2021 – 30 jun 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021	01 jul 2021 – 31 out 2021
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso.
		Discussão em sede de Comité MaB Nacional envolvendo todas as RB.
		Deslocação às RB: Paul do Boquilobo, Berlengas e Meseta Ibérica
		Definição de estratégia integrada para a extensão do conhecimento
		Envio de informação detalhada para a RB Castro Verde.

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
27 000,00€	2 196,98€	8,14%	2 196,98€	8,14%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 410,00€	706,00€	4,90%	706,00€	4,90%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%



Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 400,00€	5 400,00€	100,00%	5 400,00€	100,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 mar. 2021 - 30 jun.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco



**Promotor****Quatenaire Portugal**

Rua Tomás Ribeiro n.º 412 - 2º andar | 4450-295 Matosinhos
Rua Duque de Palmela n.º 25 - 2º andar | 1250-097 Lisboa

Tel. (+351) 229 399 159 | (+351) 213 513 200
Email geral@quatenaire.pt

www.quatenaire.pt

Operador do Programa

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

AMBIENTE E
AÇÃO CLIMÁTICA
