

**Programa
Ambiente, Alterações
Climáticas e Economia
de Baixo Carbono**

'Programa Ambiente'
Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu
2014 – 2021



Relatório Intercalar n.º 3

09#3_período: 12 julho 2021 a 11 novembro 2021
novembro 2021

09_CALL#3

Reservas da Biosfera

Territórios sustentáveis, comunidades resilientes.

*De acordo com os Artigos 25º, nº 2, alínea j) e 29º, nº 4
do 'Guia para os Candidatos ao Financiamento de Projetos de Ambiente,
sobre Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono.*

Organização geral do Projeto

Composição	Coordenador geral – António Abreu
	Coordenadora científica – Helena Freitas
	Promotor – Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.
	8 Parceiros

Organização funcional	Conselho de Orientação e Acompanhamento (COA)		
	Promotor	+	Parceiros

Promotor e Parceiros - Representantes		
Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.		Ana Barroco
Universidade de Coimbra		Helena Freitas
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas		Maria Fernanda Rollo
Instituto Pedro Nunes – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia		Carlos Cerqueira
Ordem dos Biólogos		Maria de Jesus Fernandes
Keep – Associação para a Paz, as Pessoas e o Planeta		Inês Castão
University of Bergen		Terje Restad
Nordhordland Utviklingsselskap IKS		Kari Natland
Icelandic National Commission for UNESCO		Aslaug Dora Eyjólfsdóttir



Técnicos que colaboraram no presente relatório	Formação	Funções
Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.		
António Domingos Abreu	Biólogo Doutorado em Biologia Marinha	Coordenador geral do Projeto
Ana Barroco	Arquitetura Paisagista	Coordenadora executiva do Projeto
Cláudia Mendes	Gestão de Empresas	Responsável pela Gestão do Projeto
Elisa Pérez Babo	Economia Mestre em Planeamento do Território Inovação e Políticas de Desenvolvimento	Coordenação da Área do Conhecimento Responsável pelo tema Sistema Socioeconómico
Madalena Coutinho	Arquitetura Paisagista	Apoio à Coordenação Executiva do Projeto Trabalho técnico especializado
Carlos Fontes	Gestão de Empresas (frequência) Análise Estatística de Dados, em Gestão Documental, em Access e em Digital Strategy (formação complementar)	Apoio técnico à Gestão do Projeto
Margarida Ramos	Lic. em Tradução	Apoio técnico à Gestão do Projeto
Cristina Abreu	Bióloga Pós-graduada em Global Change and Biodiversity: implications for ecosystem services Mestre em Destinos Turísticos Sustentáveis e Planificação Turística Territorial	Responsável pelo tema do Turismo
Leonor Rocha	Ciências Sociais/ História Mestre em Educação, com especialização em Formação e Aprendizagem ao Longo da Vida	Responsável pelo tema da Formação
Andreia Leite	Lic. Geologia Aplicada do Ambiente Mestre em Urbanismo e Ordenamento do Território	Trabalho técnico especializado
José Portugal	Antropólogo Pós-graduado em Gestão e Políticas Culturais Curso de Extensão Universitária “Desenho e Gestão de Rotas e Itinerários Culturais” (frequência)	Trabalho técnico especializado
Pedro Mendes	Arquiteto Mestre em Arquitectura	Trabalho técnico especializado
Pedro Quintela	Sociólogo Mestre em Sociologia – Cidades e Culturas Urbanas Doutorando em Sociologia	Trabalho técnico especializado
Sofia Henriques	Economia Mestre em Energia e Políticas Ambientais Doutorada em Economic History, School of Economics and Management	Trabalho técnico especializado
Susana Magalhães	Arquiteta de Planeamento Urbano e Regional	Trabalho técnico especializado
Universidade de Coimbra – Centro de Ecologia Funcional		
Helena Freitas	Doutorada em Ecologia Catedrática de Ecologia e Biodiversidade Coordenadora do CFE	Coordenadora científica do Projeto

Técnicos que colaboraram no presente relatório	Formação	Funções
Joana Alves	Doutorada em Biologia	Coordenadora executiva. Área: Serviços dos ecossistemas
António Gouveia	Doutorado em Ecologia	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Miguel Moreira	Doutorado em Eng. do Ambiente	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
António Alves da Silva	Mestre em Ecologia	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Filipe Martinho	Doutorado em Ecologia	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Leonor Silva	Lic. Economia Pós-graduação em Contabilidade e Finanças	Execução financeira do Projeto
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas		
Fernanda Rollo	História, Doutoramento Prof. Catedrática NOVA FCSH, Investigadora	Coordenação atividades NOVA FCSH, investigação
Filipe G. Silva	História, Mestrado Investigador	Investigação, Gestão de dados, infraestrutura
Luísa Seixas	Filosofia, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação, co-coordenação
Pedro Lucas	Ciências da Informação e Estudos Culturais, Mestrado	Investigação, Gestão de dados
Sofia Diniz	História, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação
Maria João Martins	Ecologia, Mestrado Técnica Superiora Investigadora, Doutoranda	Investigação (SIGS, infraestrutura, dados)
Rosário Jorge	Sociologia, Doutoramento Prof. NOVA FCSH, Investigadora	Investigação
Katia Favilla	Desenvolvimento sustentável, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação
Raquel Pereira	Antropologia, Mestrado Investigadora, Doutoranda	Investigação
Carla Pereira	Edição de texto, Mestrado Técnica Superior	Execução financeira do Projeto
Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia		
Carlos Cerqueira	Marketing e Gestão de Empresas Mestre em Economia	Responsável pelo tema da Inovação e do Empreendedorismo
M. Clara Luxo Correia	Economista, Mestre em Marketing Pós-graduada em Digital Marketing and Analytics e em Marketing e Direção Comercial	Trabalho técnico especializado
Daniela Pinheiro	Lic. Contabilidade Mestrado em Análise Financeira (em curso)	Execução financeira do Projeto
Ordem dos Biólogos		
Daniela Casimiro	Bióloga Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental	Responsável pelas Olimpíadas da Biosfera
Pedro Oliveira	Biólogo	Colaborador das Olimpíadas da Biosfera
Pedro Ré	Biólogo	Colaborador das Olimpíadas da Biosfera
Margarida Roque	Bióloga	Colaborador das Olimpíadas da Biosfera

Técnicos que colaboraram no presente relatório	Formação	Funções
Keep - Associação para a Paz, as Pessoas e o Planeta		
Inês Castaño	Museologia, Mestrado	Coordenação geral. Investigação
Luís Marreiros	Produção	Gestão operacional do Projeto
Adelaide Andrade Siva	Lic. Direito	Execução financeira do Projeto
University of Bergen		
Inger Elisabeth Måren	Bióloga Doutorada em Vegetation Ecology Professora Associada em Ecologia Aplicada do Departamento de Ciências Biológicas da UiB Cátedra UNESCO para o Património Sustentável e a Gestão Ambiental	Responsável pela participação da University of Bergen
Alicia Donnellan Barraclough	Bióloga Doutorada em Applied Environmental Science Investigadora de pós-doutoramento associada à Cátedra UNESCO da Universidade de Bergen.	Investigadora. Área: Serviços dos ecossistemas
Jarrold Cusens	Biólogo Doutorando em Biological Sciences Investigador	Investigador. Área: Serviços dos ecossistemas
Nordhordland Utviklingsselskap IKS		
Kari Natland	Lic.Travel and tourism business, com especialização em planeamento e desenvolvimento territorial	Responsável pela participação da Responsável da Nordhordland Utviklingsselskap IKS
Icelandic National Commission for UNESCO		
Sæunn Stefánsdóttir	Gestão de Empresas, a concluir mestrado em Administração Pública Presidente da Comissão Nacional da UNESCO da Islândia	Responsável pela participação da Icelandic National Commission UNESCO

Página deixada propositadamente em branco

O Promotor do Projeto

Nome

Ana Maria Moreira Freire de Morais Barroco Parreira do Amaral

Data e Assinatura

Posição

Administração da Quaternaire Portugal

O Operador do Programa – Secretaria-Geral do Ambiente

Nome

Alexandra Carvalho

Data e Assinatura

Posição

Secretária-Geral

Página deixada propositadamente em branco

Índice

1	Introdução	1
2	Descrição detalhada	3
2.1	Identificação das atividades	3
2.2	Resumo das atividades desenvolvidas	5
2.2.1	Progressão técnica	6
2.2.2	Progressão financeira	8
2.2.3	Envolvimento dos parceiros	9
2.2.4	Informação relativa aos participantes no Projeto	12
3	Resultados alcançados	15
3.1	Execução do Projeto	15
3.2	Comunicação e divulgação	21
4	Descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro	23
5	Descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente	25

Tabelas

Tabela 2.1 – Atividades ativas no período entre 1 de julho 2021 e 31 de outubro 2021	3
Tabela 2.2 – Progressão financeira. Custos de Gestão do Projeto	9
Tabela 2.3 – Envolvimento dos parceiros nas atividades entre 1 de julho e 31 de outubro 2021	10
Tabela 4.1 – Progressão financeira. Custos do Projeto	23
Tabela 5.1 – Programa Ambiente, indicadores e metas	25
Tabela 5.2 – Relação de cada atividade em avaliação com os indicadores previstos no Programa Ambiente	27

Figuras

Figura 3.1 – Execução do Projeto. Progressão das atividades iniciadas/ ativas e executadas	16
Figura 3.2 – Execução do Projeto. Progressão de execução das atividades ativas	17
Figura 3.3 – Execução do Projeto. Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento	19
Figura 3.4 – Execução do Projeto. <i>Outputs</i>	20
Figura 3.5 – Execução do Projeto. Indicadores de resultados	20
Figura 3.6 – Exemplos de publicações nos órgãos de comunicação social	21
Figura 3.7 – Métricas de performance das redes sociais	22

Figura 3.8 – Comunicação e divulgação do Projeto.....	22
Figura 5.1 – Contribuição do Projeto para o alcance dos indicadores do Programa Ambiente.....	30

Anexos

A. Fichas das atividades.....	31
ID4_História das Reservas da Biosfera.....	33
ID6_Auscultação/Perceção e identificação do património.....	37
ID7_Deenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento sustentável (PDS) das RB	39
ID8_Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS	41
ID9_Consertação e validação da estrutura metodológica dos PDS	43
ID10_Infraestrutura Digital – Modelo de gestão distribuída.....	45
ID11_Infraestrutura Digital – Website das Reservas da Biosfera.....	47
ID12_Infraestrutura Digital – Dashboard de gestão de indicadores	49
ID13_Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera.....	51
ID14_Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	53
ID15_Mapeamento da diversidade de ecossistemas das RB	55
ID16_Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	59
ID17_Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	63
ID18_Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas Reservas da Biosfera (RB)	65
ID19_Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	67
ID20_Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade	69
ID21_Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB.....	71
ID22_Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE.....	75
ID23_Avaliação da condição/ estado dos SE.....	79
ID24_Proposta de valorização dos SE (adicional valor).....	83
ID25_Valoração dos SE (atribuir valor) e sua interligação com os setores económicos associados – (integra catálogo das ações piloto)	87
ID26_Mapeamento dos SE das RB.....	89
ID34_Seleção das 11 ações piloto	93
ID35_Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)	95
ID36_Memórias e identidades – registo sistematizado de memórias – (integra catálogo de ações piloto)	97
ID37_Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto).....	101
ID38_Rede de Lojas das Reservas da Biosfera e loja virtual – (integra catálogo de ações piloto).....	103
ID45_Referencial de certificação em sustentabilidade – Reservas da Biosfera Portuguesas.....	105

ID46_Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento	109
ID47_Programa de reforço de competências em governance para responsáveis das entidades gestoras das RB, de parceiros e de agentes locais.....	111
ID48_Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS	113
ID49_Formação associada à implementação das ações piloto	115
ID54_Programa de visitas e de transferência de experiências entre as RB portuguesas e os países doadores	117
ID56_Elaboração da Estratégia de Marketing	119
ID57_Conceção do Plano de Comunicação.....	121
ID58_Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook) ..	123
ID59_Desenvolvimento Criativo Genérico.....	125
ID60_Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital	127
ID61_Produções e Materiais de divulgação - Offline.....	129
ID62_Produções e Materiais de divulgação - Online.....	131
ID63_Produções e Materiais de divulgação – Materiais Audiovisuais.....	133
ID64_Ativações de marca	135
ID65_Relações públicas.....	137
ID66_Estratégia e planeamento de meios	141
ID67_Estratégia e planeamento de meios - Imprensa	143
ID68_Estratégia e planeamento de meios - Rádio	145
ID69_Estratégia e planeamento de meios - Digital	147
ID71_Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos.....	149
ID72_Sessões de apresentação local do Projeto em cada Reserva da Biosfera incluindo ações de sensibilização e demonstração envolvendo parceiros locais	151
ID74_Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	153
ID75_Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB	155
ID76_Realização das Olimpíadas das RB	157
ID77_Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera	159
ID78_BioKeepers: Clube de Amigos e cuidadores das RB – (integra catálogo de ações piloto)	161
ID80_Extensão do conhecimento.....	163
ID81_Exposição itinerante	167

Página deixada propositadamente em branco

1 INTRODUÇÃO

O presente documento corresponde ao 3º Relatório Intercalar do projeto **09#CALL3 – Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes** e tem como objetivo apresentar informação sobre o progresso de execução técnica e financeira do Projeto, correspondendo ao período entre 01 de julho de 2021 e 31 de outubro de 2021¹.

Pretendendo-se a sua rápida leitura e perceção clara do estado de evolução do Projeto, o documento encontra-se organizado, seguindo a estrutura modelo proposta pelo Programa EEA Grants:

- O capítulo 2 é dedicado à descrição detalhada das atividades, no qual se inclui:
 - a identificação das atividades em curso no período em apreço e a apresentação do seu cronograma de desenvolvimento, revisto de acordo com o apresentado no Relatório Intercalar n.º 2;
 - o resumo das atividades desenvolvidas, focalizando-se na progressão técnica e financeira, bem como no envolvimento dos parceiros e de outros participantes;
- O capítulo 3 é dedicado aos resultados alcançados;
- O capítulo 4 é dedicado à descrição dos custos e avaliação do impacto financeiro;
- O capítulo 5 é dedicado à descrição da contribuição do Projeto para alcançar os objetivos gerais dos EEA Grants e do Programa Ambiente.

No Anexo A encontram-se as fichas das atividades, onde é sistematizada, em formato de tabela, toda a informação de caracterização da progressão técnica e financeira considerada relevante.

¹ Deixa-se a nota de que o período de avaliação difere do quadrimestre do Projeto de modo a reportar meses completos, de acordo com a informação recebida da SGA a 5 de março de 2021.

Página deixada propositadamente em branco

2 DESCRIÇÃO DETALHADA

2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Segundo a identificação das atividades contratualizadas, apresenta-se na tabela seguinte as atividades iniciadas e ativas no período em avaliação, destacando-se as datas previstas para o seu desenvolvimento, atualizadas de acordo com o Relatório Intercalar n.º 2, e identificando-se os parceiros responsáveis pela sua execução.

As atividades associadas à gestão geral do Projeto, nas quais se inclui a elaboração do presente relatório, são consideradas tarefas regulares ao longo de todo o Projeto pelo que, face à sua natureza, assumem-se como atividades transversais.

Tabela 2.1 – Atividades ativas no período entre 1 de julho 2021 e 31 de outubro 2021

ID	Designação	Data início	Data fim	Parceiro responsável
4	História das Reservas da Biosfera	12-11-2020	01-11-2022	UNL-FCSH
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
7	Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB	01-03-2021	31-10-2021	QP
8	Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS	01-05-2021	31-07-2021	QP
9	Concertação e validação da estrutura metodológica dos PDS	01-08-2021	30-09-2021	QP
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída	01-01-2021	30-12-2021	UNL-FCSH
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FCSH
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores	12-11-2020	11-05-2023	UNL-FSCH
13	Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera	01-05-2021	11-05-2023	UNL-FSCH
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	01-01-2021	30-01-2023	UNL-FCSH
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB	12-11-2020	30-09-2021	UC-CFE/ Univ Bergen
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	01-01-2021	30-11-2021	UC-CFE/ Univ Bergen
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	01-01-2021	31-10-2021	QP
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB	01-01-2021	31-12-2021	IPN
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	01-01-2021	31-12-2021	IPN
20	Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade	01-05-2021	31-12-2021	QP
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	01-03-2021	30-04-2022	UC-CFE/ Univ. Bergen/ RB de Nordhordland
22	Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE	01-06-2021	30-04-2022	UC-CFE/ Univ. Bergen
23	Avaliação da condição / estado dos SE	01-09-2021	30-06-2022	UC-CFE/ Univ. Bergen
24	Proposta de valorização dos SE (adicional valor)	01-09-2021	31-08-2022	UC-CFE/ Univ. Bergen/ RB de Nordhordland
25	Valoração dos SE (atribuir valor) e sua interligação com os setores económicos associados – (integra catálogo de ações piloto)	01-08-2021	31-10-2022	UC-CFE

ID	Designação	Data início	Data fim	Parceiro responsável
26	Mapeamento dos SE das RB	01-09-2021	31-10-2022	UC-CFE/ Univ. Bergen/ RB de Nordhordland
34	Seleção das 11 ações piloto	01-08-2021	30-09-2021	QP
35	Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)	01-06-2021	31-10-2022	QP
36	Memórias e identidades -registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)	12-11-2020	30-09-2022	UNL-FCSH
37	Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)	01-05-2021	11-05-2023	UNL-FCSH
38	Rede de lojas das Reservas da Biosfera e loja virtual - (integra catálogo de ações piloto)	01-10-2021	31-10-2022	QP
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	12-11-2020	11-04-2023	QP
46	Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento	01-04-2021	31-10-2021	QP
47	Programa de reforço de competências em governance para responsáveis das entidades gestoras das RB, de parceiros e de agentes locais	01-10-2021	31-10-2022	QP
48	Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS	01-05-2021	31-10-2022	QP
49	Formação associada à implementação das ações piloto	01-08-2021	31-10-2022	QP
54	Programa de visitas e de transferência de experiências entre as RB portuguesas e os países doadores	30-09-2021	11-05-2023	QP
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	12-11-2020	31-07-2021	QP
57	Conceção do Plano de Comunicação	01-01-2021	31-07-2021	QP
58	Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)	01-03-2021	31-07-2021	QP
59	Desenvolvimento Criativo Genérico	01-06-2021	31-12-2021	QP
60	Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital	01-06-2021	31-12-2021	QP
61	Produções e Materiais de divulgação - Offline	01-06-2021	31-12-2021	QP
62	Produções e Materiais de divulgação - Online	01-06-2021	31-12-2021	QP
63	Produções e Materiais de divulgação - Materiais Audiovisuais	01-08-2021	30-11-2022	QP
64	Ativações de Marca	01-08-2021	11-05-2023	QP
65	Relações Públicas	01-08-2021	11-05-2023	QP
66	Estratégia de planeamento de meios	01-08-2021	11-05-2023	QP
67	Estratégia de planeamento de meios - Imprensa	01-08-2021	28-02-2023	QP
68	Estratégia de planeamento de meios - Rádio	01-08-2021	28-02-2023	QP
69	Estratégia de planeamento de meios - Digital	01-08-2021	28-02-2023	QP
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	01-01-2021	31-07-2021	QP
72	Sessões de apresentação local do projeto em cada reserva da Biosfera incluindo ações de sensibilização e demonstração envolvendo parceiros locais	01-09-2021	31-12-2021	QP
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	01-02-2021	30-09-2021	OBio
75	Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB	01-03-2021	30-11-2021	OBio
76	Realização das Olimpíadas das RB	01-09-2021	31-07-2022	OBio
77	Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera	01-04-2021	30-09-2022	QP
78	BioKeepers: Clube de Amigos e cuidadores das RB - (integra catálogo de ações piloto)	01-09-2021	30-09-2022	Keep

ID	Designação	Data início	Data fim	Parceiro responsável
80	Extensão do conhecimento	12-11-2020	30-05-2022	Keep
81	Exposição itinerante	01-09-2021	11-05-2023	UNL-FCSH
	Gestão do projeto	12-11-2020	11-05-2023	QP
RI 3	Relatório Intercalar 3	01-07-2021	31-10-2021	QP

Fonte: Contract_09_CALL#3_Anexo I_Rev.03 e Relatório Intercalar n.º 2

2.2 RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Todas as atividades são descritas através de um conjunto de indicadores que permitem uma leitura dos respetivos níveis de execução técnica e financeira, possibilitando a apreensão do estado de execução do Projeto de uma forma objetiva, integrada e consistente, passível de ser monitorizada. Assim, cada atividade é sistematizada em duas componentes essenciais da sua execução – progressão técnica e progressão financeira – com os seguintes campos descritivos (veja-se Anexo A):

- Progressão técnica:
 - Tarefas realizadas – onde se identificam as ações desenvolvidas, o parceiro responsável e os parceiros envolvidos, bem como os participantes nomeadamente as Reservas da Biosfera e outras entidades;
 - Resultados obtidos – onde se enuncia o que foi conseguido com as tarefas realizadas e se listam os documentos, ações e outras formas de evidência dos resultados alcançados;
 - Reorientações e ajustamentos – onde se evidenciam as tarefas/ ações que, por qualquer motivo, não foram realizadas, se justifica a sua não realização e se apresentam medidas corretivas no sentido de resolver eventuais lacunas, atrasos, etc.;
 - Barómetro de execução - onde se recuperam os indicadores, metas e fontes de verificação associados a cada atividade, tal como apresentados na candidatura/ contrato e se regista o seu estado de execução (executado, em execução, não executado);
 - Cronograma de execução – onde se regista o estado de execução da atividade no período de avaliação do Relatório Intercalar em apreço e se projeta a sua evolução para o próximo período de avaliação, com a enunciação de tarefas previstas a realizar.
- Progressão financeira:
 - Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a;
 - Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b;
 - Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4;
 - Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2;
 - Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e;
 - Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f;

- Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g.

Todos estes campos especificam os seguintes parâmetros:

- Total previsto: valores contratados de acordo com o documento “Contract_09_CALL#3_Anexo I_Rev.3_2021_06_15”, parte integrante do contrato;
- Executado entre: valor do que foi executado no período de avaliação a que o relatório intercalar diz respeito;
- % do que foi executado no período de avaliação a que o relatório intercalar diz respeito em relação ao total previsto;
- Executado acumulado: somatório do valor do que foi executado nos diferentes períodos de avaliação/relatórios intercalares;
- % do executado acumulado em relação ao total previsto.

Em adicional considera-se a atividade transversal de “Gestão” do Projeto.

2.2.1 Progressão técnica

No presente período de avaliação, das 56 atividades ativas, 35 deram continuidade aos trabalhos em curso e 21 iniciaram a sua atividade como previsto.

As **tarefas realizadas** associam-se ao cronograma das atividades em avaliação, pelo que no período em apreço a tipificação das tarefas realizadas pode ser agrupada em 3 grandes grupos:

- Tarefas de continuidade das atividades iniciadas durante os períodos de avaliação anteriores do Relatório Intercalar 1 (de 12 de novembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021) e do Relatório Intercalar 2 (de 1 de março a 31 de junho de 2021), num total de 35 atividades;
- Tarefas típicas da fase inicial das atividades que agora se iniciaram, num total de 21 atividades;
- Tarefas de fecho de atividades, num total de 5.

No primeiro grupo enquadram-se as tarefas relacionadas com a continuidade de sistematização da informação recebida das RB, mas também de definição e consolidação de metodologias e de tratamento de resultados de inquéritos e entrevistas efetuadas às RB. São também de realçar as deslocações das equipas ao terreno, realizadas com os objetivos de divulgação local do Projeto, reunir presencialmente com os gestores das RB (ID7, ID35 e ID45), de apresentar e lançar atividades que envolvem diretamente a população local (ID4, ID6; ID36 e ID72), bem como a realização de levantamentos de campo e inventários (ID21 e ID35).

No segundo grupo identificam-se as tarefas de recolha, pesquisa e sistematização de informação, a preparação de base de dados e de entrevistas e inquéritos, sendo de salientar o cruzamento e interação entre os Parceiros de modo a reduzir a duplicação de tarefas, nomeadamente em termos de pedidos de informação e inquéritos. Destacam-se, também, os trabalhos de desenvolvimento de metodologias e seguir no âmbito de algumas atividades (ID24, ID25, ID26 e ID76).

No último grupo destaca-se a tarefa de elaboração e edição dos relatórios associados às atividades ID7, ID8, ID9, ID15 e ID74.

Os **resultados obtidos** incluem a troca e recolha de informações, a realização de inquéritos e entrevistas, a definição de metodologias, o tratamento de informação e a elaboração de conteúdos para os relatórios, bem como a produção e

publicação de peças de comunicação, destacando-se o lançamento do website do Projeto www.reservasdabiosfera.pt, entre outros, com **evidências** em registos próprios, em atas/ memorandos das reuniões, nas respostas aos inquéritos e na produção de diversos documentos de trabalho de tratamento de dados, bem como em peças de comunicação como as notícias, artigos, *posts* que foram saindo nos órgãos de comunicação social (jornais, televisão e rádio) ou publicados no website do Projeto e nas redes sociais.

A diversidade do tipo de atividades e do seu cronograma de execução, que justifica diferentes estágios de desenvolvimento, leva a que sejam destacadas as cinco atividades que fecharam neste período, a saber:

- “Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB” (ID7);
- “Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS” (ID8);
- “Concertação e validação da estrutura metodológica dos PDS” (ID9);
- “Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB” (ID15);
- “Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera” (ID74).

Justificado, maioritariamente, pelo facto da assessoria à comunicação do Projeto estar a ser efetuada por uma nova equipa, que defende que tanto o desenvolvimento criativo como as produções e matérias de divulgação deverão ocorrer ao longo de todo o tempo de elaboração do Projeto, apresentando, assim, um entendimento diferente relativamente ao cronograma apresentado na candidatura, bem como pela necessidade de alinhamento de entre algumas atividades, nomeadamente com o desenvolvimento dos Planos de Desenvolvimento Sustentável, e também por motivos das próprias RB, como a exoneração dos 4 gestores das RB da Região Autónoma dos Açores, são propostas **reorientações e ajustamentos** ao cronograma de algumas atividades (ID17, ID20, ID34, ID46, ID47, ID49, ID57, ID58, ID59; ID60, ID61, ID62, ID63, ID71 e ID72), as quais apresentam como **medidas corretivas** o prolongamento temporal da sua execução ou o adiamento da data de início da atividade (ID34, ID47 e ID49), nestes casos mantendo ou reduzindo o tempo de execução previsto.

A análise do campo **barómetro de execução** demonstra que a grande maioria das atividades se encontram em desenvolvimento, com todos os indicadores, metas e fontes de verificação “em execução”. Contudo, verificam-se algumas exceções, que se listam seguidamente:

- ID7, ID8, ID9, ID15: atividades fechadas com todos os campos do barómetro de execução “executados”;
- ID56: atividade com todos os campos do barómetro de execução já considerados “executados” nos Relatórios Intercalares 1 e 2, mas que se manteve ativa até ser fechada a revisão do documento após consulta às RB, o que aconteceu neste período de avaliação;
- ID60: atividade, que ao ser desenvolvida ao longo de todo o tempo do Projeto, mantém o indicador (peças de comunicação) e a fonte de verificação (artes finais) “em execução”, mas que apresenta a meta como “executa” pelo facto de já se ter ultrapassado o número de artes finais produzidas. Salienta-se, também, o facto de se ter entregado o documento “Estratégia e Gestão de Redes Sociais”, o qual apesar de não constituir uma fonte de verificação do Projeto, constitui um output do mesmo;
- ID34, ID47 e ID49: atividades não iniciadas e que por esse motivo apresentam todos os campos do barómetro de execução como “não executados”.

Destaca-se, ainda, o facto de se considerar a atividade de planeamento das olimpíadas (ID74) executada, com a edição do relatório e o lançamento das inscrições para as escolas, mantendo-se, contudo, todos os campos do barómetro de execução “em execução” até à verificação do indicador, que ocorrerá com a concretização da atividade ID76, e da fonte de verificação o que ocorrerá em 31/07/2022.

No contexto do que tem sido referido, o **cronograma de execução** evidencia que, no período de 1 de julho a 31 de outubro do corrente ano, a grande maioria das atividades se encontram “em execução” sendo exceção as 6 atividades que possuem *outputs*, consideradas como “executadas” (ID7; ID8; ID9; ID15; ID56² e ID74), e as 3 atividades não iniciadas (ID34, ID47 e ID49). É ainda possível reter que no próximo período de avaliação (1 de novembro a 28 de fevereiro de 2022), a continuação da realização das tarefas em curso constitui-se como a principal tarefa prevista para o próximo quadrimestre.

Importa, ainda, destacar que entre as 49 atividades que continuarão para o próximo período de avaliação 11 deverão ser concluídas durante o mesmo.

Por último, numa breve referência à atividade transversal de **Gestão do Projeto**, refere-se o envolvimento constante da Coordenação do Projeto, quer com todos os parceiros da equipa (nacionais e internacionais), quer com as próprias Reservas da Biosfera, bem como com o Comité Nacional MaB, traduzindo-se no acompanhamento contínuo do desenvolvimento das atividades técnicas e dos procedimentos administrativos que um Projeto desta natureza tem associado, mas também na procura de oportunidades de parcerias, divulgação e de participação do Projeto em eventos, com destaque para a exposição no âmbito das comemorações dos 50 anos do Programa MaB, que contaram com a participação de vários elementos dos diferentes Parceiros do Projeto e de representantes das Reservas da Biosfera portuguesas e dos países da CPLP, e para o colóquio internacional de partilha de experiências em sustentabilidade, organizado pela Universidade de Coimbra, o qual contou com a participação da maioria das RB portuguesas e com a RB da Noruega e representantes da futura RB da Islândia.

2.2.2 Progressão financeira

A análise da progressão financeira das atividades em avaliação permite evidenciar, em termos de afetação de **recursos humanos**, as seguintes situações distintas, a saber:

- Atividades com uma percentagem de execução de 100%, ou muito próxima, o que reflete a fase de fecho das atividades já referenciada na análise da progressão técnica (ID7, ID8, ID9, ID15 e ID56);
- Atividades com uma percentagem superior a 100%, que ultrapassaram o orçamento previsto para a sua elaboração e que, provavelmente, irão propor reorçamentação (ID6 e ID20);
- Atividades que ainda não afetaram qualquer despesa a esta rubrica, justificado por se propor o adiamento do início das atividades face à necessidade de alinhamento com outras atividades (ID34, ID47 e ID49);
- Atividade que não desenvolveram tarefas neste período em avaliação por aguardar o fecho de outra atividade (ID71);
- Atividades que consideram as tarefas desenvolvidas até ao momento como sendo ações decorrentes de competências e capacidades endógenas das próprias entidades (ID10, ID11, ID14, ID37, ID74, ID75, ID76 e ID81).

Em relação aos “recursos humanos” destaca-se também o facto da Universidade de Bergen e de Nordhordeland Utviklingsselskap IKS também terem apresentado despesas associadas a esta rubrica, em resultado das suas participações nas atividades, da Universidade de Coimbra.

É igualmente possível verificar que, das 28 atividades que possuem verbas atribuídas à rubrica **custos com transporte**, apenas 5 apresentam despesas associadas (ID4, ID6, ID21, ID36 e ID80), o que reflete o número ainda reduzido de

² Com a revisão do relatório da Estratégia de Marketing, após os contributos das RB considera-se a ID56, finalmente fechada.

atividades com ações no terreno, adivinhando-se uma intensificação das deslocações às RB no próximo período de avaliação.

Destaca-se também que das 2 atividades com verba para **equipamentos** apenas a ID36 ainda possui verba disponível nesta rubrica, e o facto de 23 atividades preverem a **aquisição de serviços** das quais 3 já esgotaram a verba disponível (ID56, ID57 e ID80).

Refere-se, ainda, que neste período de avaliação não foram apresentadas despesas nas rubricas de depreciação de equipamentos (Reg. Art. 8.2.4), e de consumíveis (Reg. Art. 8.3.1).

Em termos de **Gestão do Projeto** verifica-se que, relativamente ao total das verbas previstas, o total dos custos verificados no período em avaliação é de cerca de 11% do valor total previsto, aumentando para cerca de 37% relativamente ao executado acumulado, apresentando-se na tabela seguinte um resumo por rubrica.

Tabela 2.2 – Progressão financeira. Custos de Gestão do Projeto

Total previsto	Executado entre 1 jul. 2021 – 31 out. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
275 714,10€	31 451,45€	11,41%	104 903,85€	38,05%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
22 578,50€	2 920,76€	12,94%	4 740,18€	20,99%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
2 902,50€	0,00€	0,00%	725,63€	25,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
4 950,00€	0,00€	0,00%	3 871,34€	78,21%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
7 875,06€	985,36€	12,51%	3 295,36€	41,85%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
2 720,00€	1 010,40€	37,15%	1 689,92€	62,13%

2.2.3 Envolvimento dos parceiros

Como pode ser observado na tabela de identificação das atividades em avaliação, bem como nas respetivas fichas que constituem o Anexo A, no período a que o presente documento se reporta houve o envolvimento de todos os parceiros, incluindo os parceiros internacionais (Universidade de Bergen, Nordhordland Utviklingsselskap IKS e Icelandic National Commission for UNESCO), os quais, para além da participação ativa nas atividades em que estão envolvidos com a Universidade de Coimbra, participaram no colóquio internacional “Shared Experiences in Sustainability within UNESCO Biosphere Reserves in Portugal, Norway and Iceland”, organizado pela Universidade de Coimbra, potenciando a troca de experiências e diversos contactos com os diferentes parceiros nacionais.

Para além da participação em reuniões de coordenação, o envolvimento dos parceiros nas diferentes atividades é o registado na tabela seguinte.

Tabela 2.3 – Envolvimento dos parceiros nas atividades entre 1 de julho e 31 de outubro 2021

ID	Designação	QP	UC-CFE	UNL-FCSH	IPN	OBio	Keep	UiB	Nordh	Iscl
4	História das Reservas da Biosfera									
6	Auscultação/Perceção e identificação do património									
7	Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB									
8	Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS									
9	Concertação e validação da estrutura metodológica dos PDS									
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída									
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera									
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores									
13	Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera									
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera									
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB									
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas									
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico									
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB									
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável									
20	Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade									
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB									
22	Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE									
23	Avaliação da condição / estado dos SE									
24	Proposta de valorização dos SE (adicional valor)									
25	Valoração dos SE (atribuir valor) e sua interligação com os setores económicos associados – (integra catálogo de ações piloto)									
26	Mapeamento dos SE das RB									
34	Seleção das 11 ações piloto									

ID	Designação	QP	UC- CFE	UNL- FCSH	IPN	OBio	Keep	UiB	Nordh	Iscl
35	Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)									
36	Memórias e identidades -registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)									
37	Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)									
38	Rede de lojas das Reservas da Biosfera e loja virtual - (integra catálogo de ações piloto)									
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas									
46	Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento									
47	Programa de reforço de competências em governance para responsáveis das entidades gestoras das RB, de parceiros e de agentes locais									
48	Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS									
49	Formação associada à implementação das ações piloto									
54	Programa de visitas e de transferência de experiências entre as RB portuguesas e os países doadores									
56	Elaboração da Estratégia de Marketing									
57	Conceção do Plano de Comunicação									
58	Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)									
59	Desenvolvimento Criativo Genérico									
60	Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital									
61	Produções e Materiais de divulgação - Offline									
62	Produções e Materiais de divulgação - Online									
63	Produções e Materiais de divulgação - Materiais Audiovisuais									
64	Ativações de Marca									
65	Relações Públicas									
66	Estratégia de planeamento de meios									
67	Estratégia de planeamento de meios - Imprensa									
68	Estratégia de planeamento de meios - Rádio									
69	Estratégia de planeamento de meios - Digital									
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos									
72	Sessões de apresentação local do projeto em cada reserva da Biosfera incluindo ações de									

ID	Designação	QP	UC-CFE	UNL-FCSH	IPN	OBio	Keep	UiB	Nordh	Iscl
	sensibilização e demonstração envolvendo parceiros locais									
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera									
75	Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB									
76	Realização das Olimpíadas das RB									
77	Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera									
78	BioKeepers: Clube de Amigos e cuidadores das RB - (integra catálogo de ações piloto)									
80	Extensão do conhecimento									
81	Exposição itinerante									
RI 3	Relatório Intercalar 3									

2.2.4 Informação relativa aos participantes no Projeto

No presente período de avaliação consideram-se participantes no Projeto as Reservas da Biosfera e o Comité Nacional MaB.

O envolvimento das RB, representadas por membros do órgão de gestão, verificou-se de forma mais evidente e intensa na participação em diversas reuniões de trabalho diretamente relacionadas com algumas das atividades em curso, as quais tiveram objetivos distintos, a saber:

- Atividade ID7 - apresentar e discutir o conceito desenhado pela equipa da QP para os Plano de Desenvolvimento Sustentáveis (PDS), permitindo a troca de ideias, a incorporação de contributos e a consolidação do conceito a ser desenvolvido;
- Atividade ID21 – consolidar a estratégia participativa para a seleção de serviços de ecossistemas chave para o desenvolvimento sustentável das RB;
- Atividades ID35 e ID45 – trocar informações sobre biodiversidade, paisagem, património cultural e histórico, infraestruturas, acessibilidades e serviços;
- Atividade ID36 – apresentar o Projeto e proceder à recolha de memórias.

É de destacar o envolvimento e apoio da RBT Meseta Ibérica e da RBT Tejo/ Tajo Internacional, bem como da Freguesia de Castelo Rodrigo aos trabalhos desenvolvidos nos territórios, nos períodos de 13 a 17 de setembro e entre 25 e 29 de outubro, respetivamente, os quais juntaram elementos das equipas da UNL-FCSH, Keep, UC-CFE e QP.

É ainda de destacar a participação de todas as RB, com exceção da RBT do Gerês/ Xurés e das duas RB do Arquipélago da Madeira, no workshop participativo dedicado à identificação dos serviços de ecossistemas chave das RB, realizado pela Universidade de Coimbra no dia 20 de outubro.

Para além destas participações, as RB responderam ao pedido de identificação dos principais *stakeholders* presentes nos seus territórios, efetuado no âmbito da atividade ID17, e continuaram a responder a questionários e a acompanhar o desenvolvimento do Projeto.

Em termos internacionais realçam-se os contactos efetuados, no âmbito da atividade ID19, com a RB La Palma, os quais tiveram o objetivo de identificar boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo, alinhadas com o desenvolvimento sustentável.

Neste período de avaliação também se manteve o acompanhamento do desenvolvimento do Projeto por parte do Comité Nacional MaB, tendo o Coordenador Geral do Projeto assegurado contactos regulares com a Sra. Presidente e outros membros deste Comité.

Ainda associada à realização da Conferência Internacional “Reservas da Biosfera Territórios sustentáveis, comunidades resilientes – Diálogos lusófonos”, promovida pela Fundação de Serralves e integrada nas celebrações do programa global da UNESCO – MaB 50º aniversário, a qual ocorreu nos passados dias 28 e 29 de junho e contou com a participação da Presidente do Comité MaB de Portugal, do Diretor da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da UNESCO, de representantes das Reservas da Biosfera do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e S. Tomé, bem como de vários elementos da equipa do Projeto, nomeadamente o Coordenador Geral, o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a 18 de julho, foi inaugurada a exposição constituída por 27 painéis alusivos ao Programa MaB e à UNESCO, à Rede CPLP, às 12 RB portuguesas, a 7 RB do Brasil, a 2 RB de Cabo Verde e às RB de Guiné-Bissau, da Ilha do Príncipe e de Moçambique.



Deixa-se, também, a nota do envolvimento dos municípios, escolas, associações de âmbito local, das comunidades das RB e do público em geral nas sessões de apresentação local do Projeto (atividades ID4, ID6, ID36 e ID72), para além do convite lançado, no passado dia 26 de outubro, aos principais *stakeholders* para responderem ao inquérito associado ao tema “dinâmicas socioeconómicas” (atividade ID17).

Por último, refere-se o colóquio internacional “Shared Experiences in sustainability within UNESCO Biosphere Reserves in Portugal, Norway and Iceland”, evento organizado pela Universidade de Coimbra que ocorreu no passado dia 21 de outubro, o qual foi aberto ao público em geral, tendo igualmente contado com a participação da Dra. Susana Escária da Secretaria-Geral do Ambiente.

Página deixada propositadamente em branco

3 RESULTADOS ALCANÇADOS

Relativamente à dimensão técnica do Projeto³, a taxa global de execução, neste período de avaliação, é de 38,9%, calculada em função do peso relativo de cada atividade no orçamento global⁴ do Projeto e do seu cronograma de execução atualizado de acordo com o Relatório Intercalar n.º 2.

De modo a permitir um acompanhamento do Projeto mais detalhado, na sequência do referido no capítulo anterior, os resultados alcançados na dimensão técnica são estruturados em dois eixos, um primeiro dedicado à execução do Projeto e um segundo dedicado à comunicação e divulgação do Projeto.

No que respeita à execução do Projeto caracterizam-se quatro variáveis, a saber:

- Atividades, quer em termos da progressão das atividades iniciadas e executadas, quer em termos de progresso de execução das atividades ativas relativamente ao seu cronograma de desenvolvimento;
- Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento, procedendo-se à identificação do número de atividades que foram ajustadas, ou que são propostas de o serem no âmbito do presente documento, em relação ao contratualizado;
- *Outputs*, onde se dá conta do número de produtos entregues;
- Indicadores de resultados, onde se apresenta o grau de concretização do Projeto relativamente às suas metas.

No tocante à comunicação e divulgação do Projeto pretende-se dar conta do número de iniciativas que foram realizadas, quer tenham sido através de edição de notícias nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais, como por via da participação em eventos onde houve a oportunidade de fazer referência ao Projeto e às Reservas da Biosfera portuguesas, como ocorreu no âmbito da exposição associada à Conferência Internacional “Reservas da Biosfera Territórios sustentáveis, comunidades resilientes – Diálogos lusófonos”, integrada nas celebrações do programa global da UNESCO – MaB 50º aniversário, ou no âmbito do colóquio internacional “Shared Experiences in sustainability within UNESCO Biosphere Reserves in Portugal, Norway and Iceland”, evento organizado pela Universidade de Coimbra.

Para uma rápida leitura dos resultados alcançados os mesmos são apresentados em forma de gráficos, nos subcapítulos seguintes.


3.1 EXECUÇÃO DO PROJETO

Da leitura da figura seguinte regista-se que as atividades iniciadas e ativas no período de avaliação (1 de julho a 31 de outubro de 2021) correspondem a 69,1% do total das atividades do Projeto, que as atividades em execução representam 63,0%, correspondendo as atividades executadas a 6,2% (ID7, ID8, ID9, ID15 e ID74). Por sua vez, as atividades a iniciar correspondem a 30,9% do Projeto. Estes números refletem bem a fase de desenvolvimento do Projeto, na qual já predominam as atividades iniciadas e ativas em relação às que ainda não começaram.

³ Os resultados da execução financeira são apresentados no capítulo seguinte.

⁴ Excluídos os custos de gestão por serem considerados transversais.

Figura 3.1 – Execução do Projeto. Progressão das atividades iniciadas/ ativas e executadas

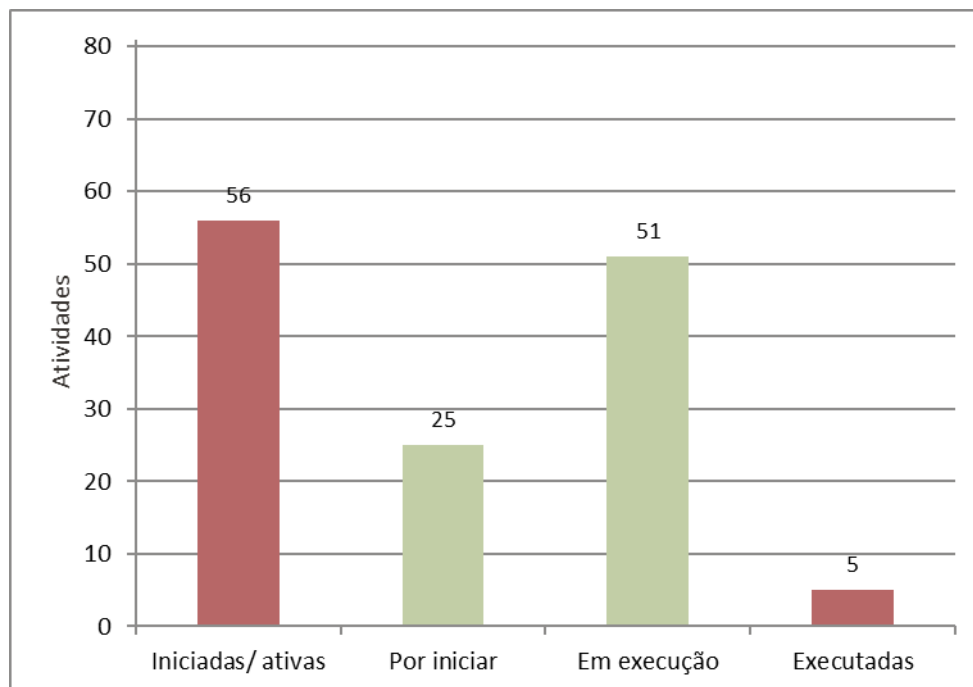



A leitura da progressão do cronograma de execução das atividades em desenvolvimento (Figura 3.2), refletindo a recalendarização proposta no Relatório Intercalar n.º 2, permite verificar que todas as atividades se encontram dentro da programação prevista. No global, tendo unicamente em consideração o tempo de execução já despendido, verifica-se que este corresponde a 32,2% do tempo previsto para as atividades em apreço.

Contudo, maioritariamente, justificado pelo facto da assessoria à comunicação do Projeto estar a ser efetuada por uma nova equipa, com um entendimento diferente relativamente ao cronograma apresentado na candidatura, bem como pela necessidade de alinhamento de entre algumas atividades, nomeadamente com o desenvolvimento dos Planos de Desenvolvimento Sustentável, entre outros, como referido anteriormente no subcapítulo 2.2.1, verifica-se a necessidade de, neste documento, propor a recalendarização de 15 atividades (ID17, ID20, ID34, ID46, ID47, ID49, ID57, ID58, ID59, ID60, ID61, ID62, ID63, ID71 e ID72), como registado nas respetivas fichas, o que se traduz na redução do tempo já execução despendido, o qual passa a representar 29,5% do tempo previsto para as atividades em apreço.

É em resultado desta proposta de reprogramação que as atividades ID34, ID47 e ID49 não foram iniciadas e, por esse facto, não apresentam qualquer execução.


Figura 3.2 – Execução do Projeto. Progressão de execução das atividades ativas

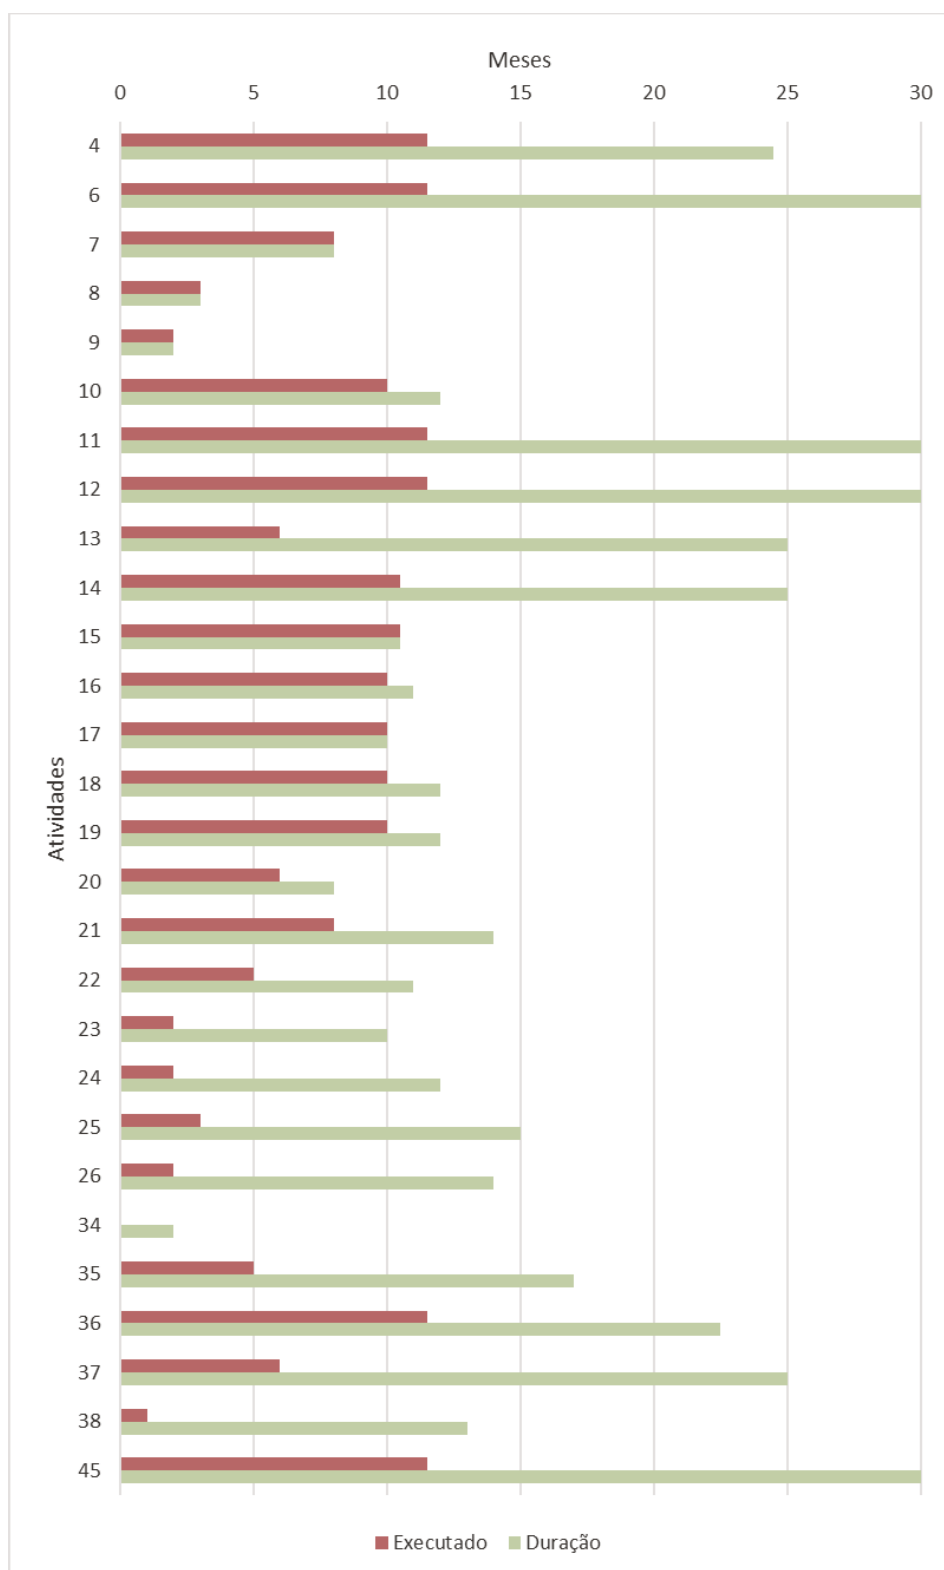

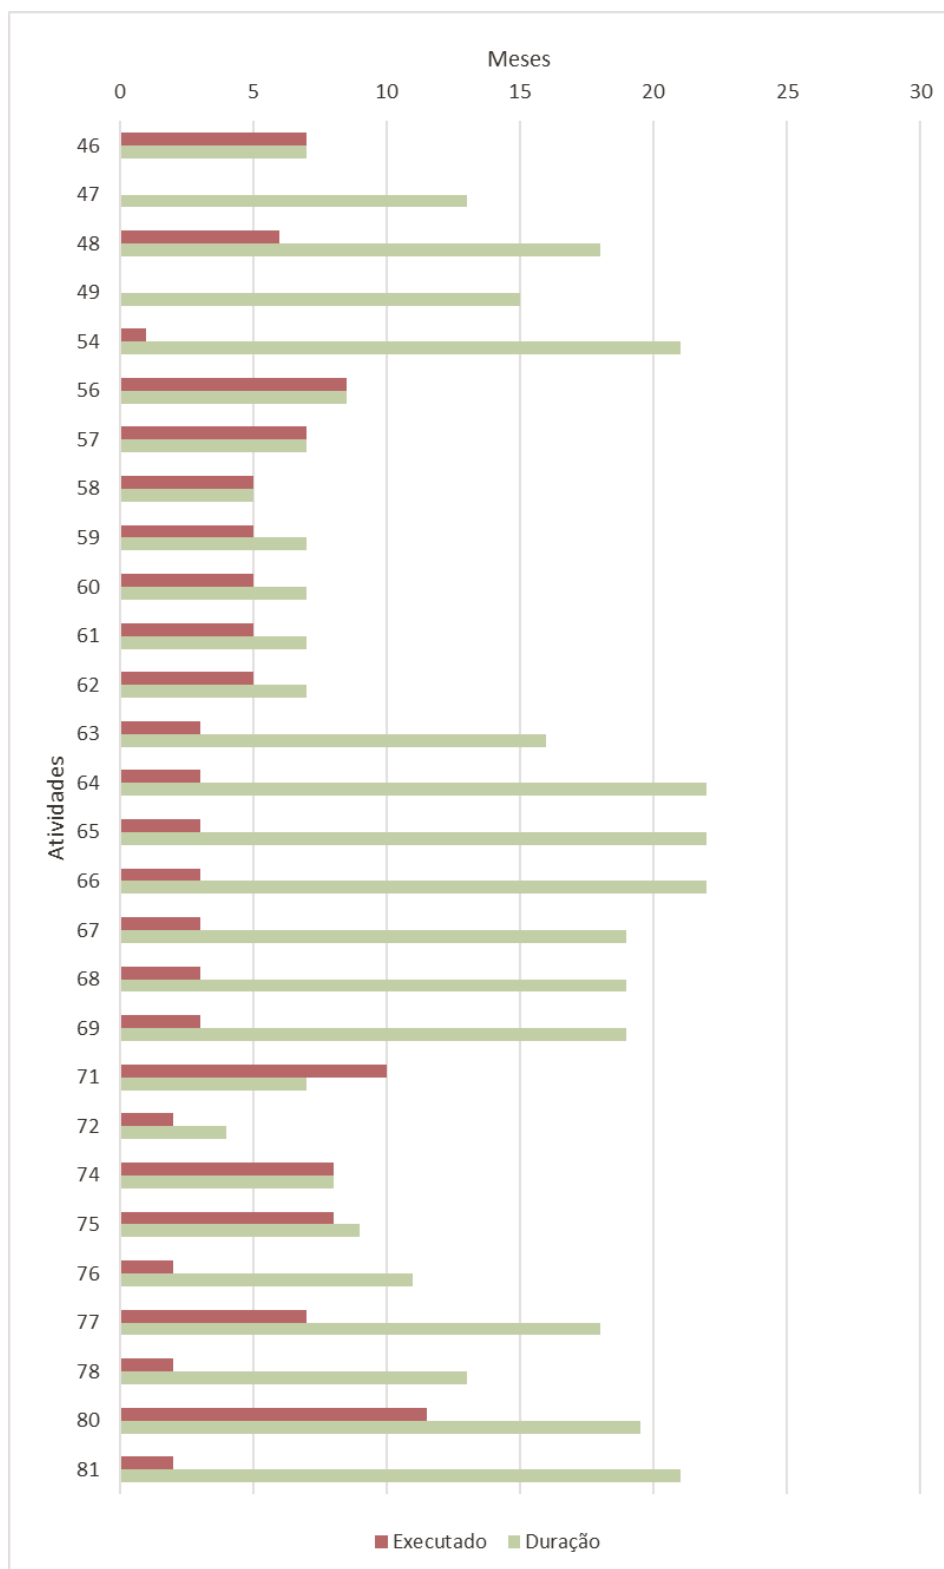

Na sequência do referido, no que respeita a reajustamentos realizados em relação ao apresentado no Relatório Intercalar 2, os ajustamentos ao cronograma abrangem as 15 atividades identificadas anteriormente, não se tendo verificado a necessidade de se reorçamentar qualquer atividade.


Figura 3.3 – Execução do Projeto. Reajustamentos ao cronograma e ao orçamento

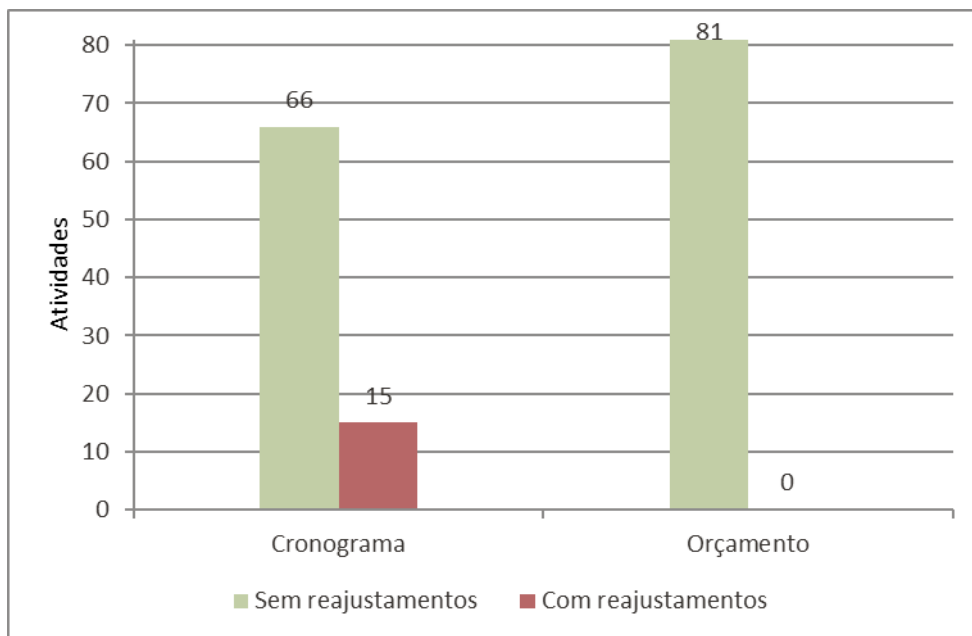

Apesar do acréscimo de atividades ativas e iniciadas neste período de avaliação, como é visível na Figura 3.2, muitas das atividades prolongam-se para além de 31 de outubro, pelo que, naturalmente, ainda são poucos os produtos finalizados, correspondendo os mesmos às atividades ID7, ID8, ID9, ID15 e ID74, o que representa 6,2% dos *outputs* do Projeto.


Ainda que não constitua uma fonte de verificação do Projeto, associado à atividade ID60, salienta-se a entrega do documento “Estratégia e Gestão de Redes Sociais”, o qual constitui mais um *output* do Projeto.

Figura 3.4 – Execução do Projeto. *Outputs*

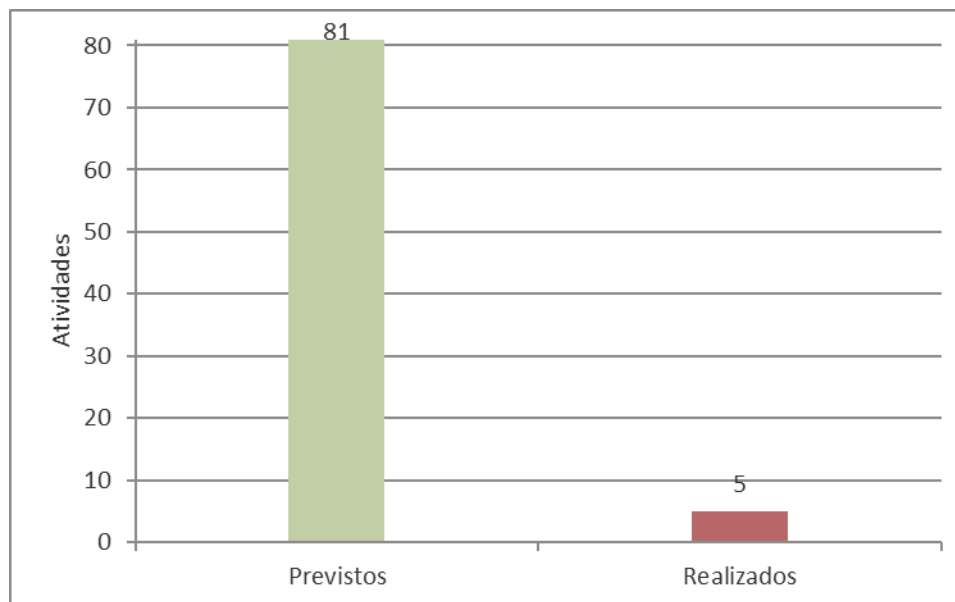

Em consonância, os indicadores de resultados refletem o referido anteriormente. É assim possível verificar que o “indicador” e a “fonte de verificação” se encontram 6,2% executados, 59,3% em execução e que 34,6% ainda não foram iniciados. No que respeita às “metas”, pelo facto da mesma já ter sido ultrapassada na ID60, a percentagem aumenta ligeiramente no “executado” (7,4%), diminuindo em proporção no “em execução” (58,0%), mantendo-se a mesma percentagem de “não executado”.

Figura 3.5 – Execução do Projeto. Indicadores de resultados

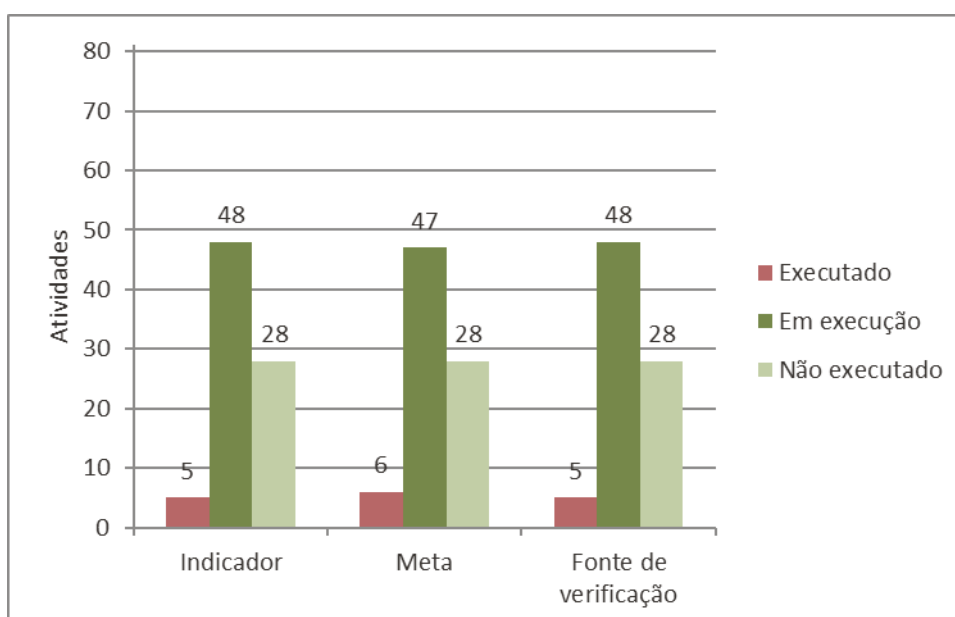

3.2 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

No que toca à comunicação do Projeto, seguindo o Plano de Comunicação do Projeto, entregue a 1 de julho, e a Estratégia de Gestão de Redes Sociais, disponibilizada a 12 de julho, o Projeto e as Reservas da Biosfera portuguesas começam a surgir nos órgãos de comunicação social com um novo ritmo e uma nova abrangência, em resultado da consultoria de comunicação, assessoria de imprensa e gestão de redes sociais que se iniciou.

Assente na identificação de oportunidades com diferentes órgãos de comunicação social (OCS), no acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Projeto e na monitorização de notícias relevantes para o Projeto e para a rede das Reservas da Biosfera portuguesas, começou-se a falar das Reservas da Biosfera. Divulga-se o Projeto, comunicam-se particularidades das RB portuguesas e dá-se a conhecer outras RB da UNESCO alargando-se o conhecimento à rede internacional.

Para o efeito são de destacar, em particular, duas datas importantes: o lançamento do website do Projeto (www.reservasdabiosfera.pt), que ocorreu a 8 de julho, e o lançamento do Projeto nas redes sociais (Facebook, Instagram e LinkedIn – Reservas da Biosfera Portuguesas), que ocorreu a 23 de julho.

Em simultâneo, a divulgação do Projeto fez-se através de propostas aos OCS sobre o último e as suas atividades, que resultaram em participações dos seus porta-vozes em entrevistas (rádio, televisão e edições impressas de jornais nacionais), na publicação de um artigo de opinião e em reportagens e notícias. A título de exemplo, referem-se alguns OCS que comunicaram o Projeto e as RB: jornais Público e Expresso, jornais locais como o Jornal da Madeira, o Jornal de Leiria ou o Jornal da Guarda, RTP, SIC, rádio Observador, rádio Regional do Centro e diversos websites, nomeadamente o [Jornal Económico \(sapo.pt\)](http://Jornal Económico (sapo.pt)).

Figura 3.6 – Exemplos de publicações nos órgãos de comunicação social




A análise da performance nas redes sociais permite referir que o crescimento dos vários indicadores é positivo e que acompanha as tendências habituais: um pico de crescimento no momento de entrada, uma diminuição acentuada no mês de agosto, novo pico de crescimento (menos acentuado) no regresso em setembro, e a estabilização em outubro. O Facebook é a rede social por excelência das RB.

Figura 3.7 – Métricas de performance das redes sociais



A figura seguinte traduz o número de peças de comunicação publicadas, quer tenham sido impulsionadas pelo Projeto, quer tenham surgido nos OCS através de outras iniciativas, sendo possível verificar que as mesmas se traduzem numa métrica de 38 peças por mês.

Figura 3.8 – Comunicação e divulgação do Projeto

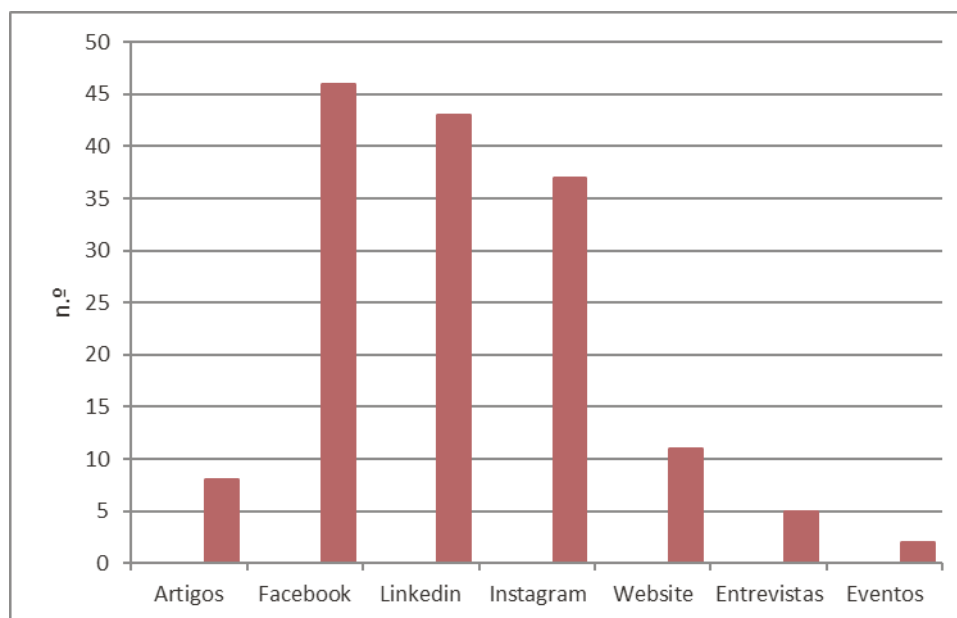

4 DESCRIÇÃO DOS CUSTOS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO

Este relatório é acompanhado pelo Anexo 17 - Lista de documentos justificativos de despesa onde estão registadas todas as despesas apresentadas pelo Promotor e Parceiros, cujos documentos justificativos se anexam, e que totalizam o valor de 206 395,97€. Salienta-se que este valor global inclui os Custos Indiretos.

Em termos globais verifica-se que, relativamente às verbas previstas do Projeto, o total dos custos já executados representa de 22,5% do valor total previsto, apresentando-se na tabela seguinte um resumo por rubrica.

Tabela 4.1 – Progressão financeira. Custos do Projeto

Total previsto	Executado entre 1 jul. 2021 – 31 out. 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
1 127 932,04€	143 614,31€	12,73%	349 832,27€	31,02%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
254 460,14€	9 731,29€	3,82%	13 848,79€	5,44%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
4 858,50€	0,00€	0,00%	1 276,81€	26,28%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
19 007,90€	283,71€	1,49%	12 281,38€	64,61%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
12 453,64€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
523 215,06€	20 053,36€	3,83%	43 563,36€	8,33%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
2 720,00€	1 010,40€	37,15%	1 689,92€	62,13%
Custos indiretos				
254 019,17€	31 702,88€	12,48%	72 806,07€	28,66%

A rubrica **Custos com recursos humanos** representa cerca de 70% do total reportado neste período, refletindo a fase de pleno desenvolvimento em que o Projeto se encontra, dos quais cerca de 22% se associam à Gestão, em parte devido a todo o processo de substituição e de envolvimento de uma nova equipa para a área da Comunicação.

Como referido anteriormente algumas entidades não apresentam despesa nesta rubrica por considerarem as tarefas desenvolvidas até ao momento como sendo ações da competência da própria entidade, como se verifica com a Universidade Nova de Lisboa e Ordem dos Biólogos. Por outro lado, já se encontram englobadas as despesas desta rubrica da Universidade de Bergen e de Nordhordland Utviklingsselskap IKS.

Relativamente às restantes rubricas é de destacar a relacionada com **Custos com a aquisição de serviços a terceiros**, a qual neste período de avaliação representa cerca de 10% do total das despesas apresentadas, verificando-se que as despesas com **deslocações** chegam a cerca de 5% e que todas as demais rubricas possuem um peso inferior a 1%. Verifica-se, por fim, que os **Custos indiretos** representam cerca de 15% do total de despesas deste período de avaliação.

5 DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS GERAIS DOS EEA GRANTS E DO PROGRAMA AMBIENTE

No âmbito dos EEA Grants 2014-2021, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, na qualidade de Doadores, financiam em 15 Estados Membros da União Europeia iniciativas e projetos que pretendem reduzir as disparidades sociais e económicas, reforçando as relações bilaterais com os estados beneficiários, sendo que, de acordo com o Memorando de Entendimento assinado com Portugal, em 2017, o Projeto em desenvolvimento enquadra-se nas áreas de “Ambiente, Energia, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono”.

De acordo com o Aviso de Concurso⁵, o projeto selecionado no âmbito deste aviso contribuirá para a execução do objetivo n.º 2 do ‘Programa Ambiente’ “FOMENTO DE MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS RESERVAS DA BIOSFERA PORTUGUESAS.” e do respetivo Output 2.1 “Capacidade de gestão das Reservas da Biosfera aumentada”, através do desenvolvimento de várias tipologias de ações e materiais que servirão de ferramentas de trabalho para uma melhor gestão e implementação das Reservas da Biosfera no território (...).

Na tabela seguinte descrevem-se os indicadores e as metas para os quais o projeto a financiar irá contribuir.

Tabela 5.1 – Programa Ambiente, indicadores e metas

Área Programática (PA) Objetivo	Resultado esperado	Indicador	Unidade de medida	Fonte de Verificação	Frequência de Reporte	Valor de base	Ano Base	Meta
PA11 Objetivo 2	FOMENTO DE MODELOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS RESERVAS DA BIOSFERA	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Anual (APR)	0	N/A	314967
Output 2.1	Capacidade de gestão das Reservas da Biosfera aumentada.	Número de Reservas da Biosfera onde as medidas foram implementadas.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	6
		Número de profissionais treinados (desagregado por género).	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	22
		Número de planos de desenvolvimento sustentável para Reservas da Biosfera desenvolvidos.	Número	Dados do Promotor do Projeto	Semestral	0	N/A	11

Fonte: Secretaria-Geral do Ambiente e da Ação Climática, 2019. Aviso #3 – *Projetos para o fomento de modelos de desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas*

⁵ Secretaria-Geral do Ambiente e da Ação Climática, 2019. Aviso #3 – *Projetos para o fomento de modelos de desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas*

Destaca-se, ainda, do Aviso de Concurso que os *grandes desafios que se colocam às Reservas da Biosfera portuguesas* são o *conhecimento do seu significado e da importância da sua existência, o aumento da sua visibilidade, a necessidade de utilizar novas formas de comunicar, o reforço do envolvimento de todos os atores locais e a promoção da qualidade e atratividade destes territórios*. Neste contexto, o *Conhecimento, a Capacitação e a Comunicação* são os três domínios essenciais à afirmação da identidade das Reservas da Biosfera no sentido de:

- a) *Valorizar os territórios que constituem as Reservas da Biosfera como laboratórios vivos de sustentabilidade, promovendo a qualidade de vida dos seus habitantes;*
- b) *Aumentar a visibilidade, o conhecimento e a capacidade de gestão destes espaços através de instrumentos que promovam a afirmação e a identidade dos 11 territórios classificados como Reservas da Biosfera.*

Em resposta ao enunciado, no âmbito da candidatura apresentada, a proposta desenvolvida refere no ponto sobre a demonstração da coerência entre os objetivos, atividades, resultados e impactos esperados (Parte C), o seguinte:

O projeto está organizado por forma a articular os eixos prioritários do conhecimento, capacitação e comunicação, numa abordagem estratégica coletiva e orientada para a valorização do conjunto dos territórios das Reservas da Biosfera (RB), entendidos como laboratórios vivos de sustentabilidade e modelos da Agenda 2030 e dos seus ODS, visando promover uma maior visibilidade nacional e internacional, e dinamizar um plano de capacitação inovador, abrangente e dirigido à qualidade de vida e prosperidade das comunidades.

O racional estratégico dos Planos de Desenvolvimento Sustentável das RB, entendidos como instrumentos de reforço e inovação das estratégias locais de desenvolvimento sustentável, estruturam-se com base nas iniciativas relacionadas com o mapeamento, priorização e valoração dos serviços dos ecossistemas, numa aposta no conhecimento, com o apoio do sistema científico e tecnológico nacional e redes internacionais, incorporando o saber transmitido pelas comunidades. As iniciativas relacionadas com o registo e valorização das memórias das comunidades e dos territórios, contarão com a participação ativa dos atores locais, e serão fundamentais para fomentar uma maior apropriação identitária - os territórios e os seus recursos -, e gerar oportunidades para a economia local. A valorização da identidade e dos recursos endógenos, numa leitura harmoniosa e sinérgica do Homem (cultura) e da Natureza, garante a promoção efetiva dos valores percebidos pelas comunidades e pelos agentes económicos.

As iniciativas associadas à criação e desenvolvimento de uma plataforma digital única e versátil, constituirá desde logo uma interface de comunicação e interação privilegiada entre as RB (redes nacional e internacionais), com as populações e com o público em geral. Esta ferramenta de gestão, diálogo e informação terá múltiplas valências, registando a informação coletiva das RB, apoiando o desenvolvimento e monitorização de ações piloto de economia e comércio local e ainda a promoção turística das RB. Permitirá ainda potenciar a capacitação e o conhecimento através de dinâmicas de ciência aberta e ciência cidadã, tornando mais operacional o desígnio de laboratório vivo de sustentabilidade.

As iniciativas associadas ao eixo de capacitação, estão inscritas num plano global e coerente, dirigido a todas as RB, e destinam-se aos técnicos, administradores, comunidades, e promotores da economia local. Visam corresponder aos interesses e expectativas das RB e serão asseguradas pelas universidades envolvidas, com o apoio das 3 cátedras Unesco e pelo sistema científico e tecnológico que será chamado a colaborar em iniciativas complementares. A abordagem proposta no domínio da capacitação visa melhorar as competências e as práticas de gestão e cooperação das RB, individualmente e em rede, e ligadas a domínios suscetíveis de impulsionar a economia local, desde o turismo sustentável ao empreendedorismo, com a valorização e promoção dos recursos endógenos dos territórios.

O plano global de comunicação proposto para as RB nacionais, visa o reforço da sua visibilidade e uma articulação mais eficaz das iniciativas de promoção da rede de RB, e o fomento das oportunidades de cooperação nacional e internacional. Propõe-se um plano de sensibilização dirigido às populações e aos atores de desenvolvimento local para a importância das RB que no sector escolar se corporiza nas Olimpíadas da Biologia complementado pela criação dos cuidadores das RB.

A enorme experiência da coordenação do projeto assegura uma maior visibilidade e presença das RB portuguesas na rede Mundial de RB da UNESCO por via da cooperação com a Noruega e Islândia, o IberoMaB e CPLP, e com a participação ativa de vários peritos internacionais.

Este preâmbulo, que por si só é demonstrativo do alinhamento do Projeto com os objetivos do EEA Grants e com os grandes desafios lançados às Reservas da Biosfera, foi depois detalhado por atividade, fazendo-se a correspondência com o indicador específico do Programa Ambiente para o qual cada atividade contribui de forma mais direta. A tabela seguinte traduz essa relação para as atividades em avaliação no presente relatório.

Tabela 5.2 – Relação de cada atividade em avaliação com os indicadores previstos no Programa Ambiente

ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
4	História das Reservas da Biosfera	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
6	Auscultação/Perceção e identificação do património	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
7	Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
8	Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
9	Concertação e validação da estrutura metodológica dos PDS	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
10	Infraestrutura Digital - modelo de gestão distribuída	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
11	Infraestrutura Digital - Website das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
12	Infraestrutura digital - Dashboard de gestão de indicadores	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
13	Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
14	Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
15	Mapeamento da diversidade ecossistémica das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
16	Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
17	Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
18	Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
19	Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
20	Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
21	Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
22	Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
23	Avaliação da condição / estado dos SE	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
24	Proposta de valorização dos SE (adicional valor)	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos

ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
25	Valoração dos SE (atribuir valor) e sua interligação com os setores económicos associados – (integra catálogo de ações piloto)	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
26	Mapeamento dos SE das RB	Número de planos de desenvolvimento sustentável para reservas da biosfera desenvolvidos
34	Seleção das 11 ações piloto	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
35	Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
36	Memórias e identidades - registo sistematizado de memórias - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
37	Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
38	Rede de lojas das Reservas da Biosfera e loja virtual - (integra catálogo de ações piloto)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
45	Referencial de certificação em sustentabilidade - Reservas da Biosfera Portuguesas	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
46	Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento	Número de profissionais treinados (desagregados por género)
47	Programa de reforço de competências em governance para responsáveis das entidades gestoras das RB, de parceiros e de agentes locais	Número de profissionais treinados (desagregados por género)
48	Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS	Número de profissionais treinados (desagregados por género)
49	Formação associada à implementação das ações piloto	Número de profissionais treinados (desagregados por género)
54	Programa de visitas e de transferência de experiências entre as RB portuguesas e os países doadores	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
56	Elaboração da Estratégia de Marketing	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
57	Conceção do Plano de Comunicação	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
58	Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
59	Desenvolvimento Criativo Genérico	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
60	Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
61	Produções e Materiais de divulgação - Offline	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
62	Produções e Materiais de divulgação - Online	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
63	Produções e Materiais de divulgação - Materiais Audiovisuais	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
64	Ativações de Marca	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
65	Relações Públicas	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
66	Estratégia de planeamento de meios	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
67	Estratégia de planeamento de meios - Imprensa	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas


ID	Designação	Indicador previsto no Programa Ambiente
68	Estratégia de planeamento de meios - Rádio	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
69	Estratégia de planeamento de meios - Digital	Número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas
71	Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
72	Sessões de apresentação local do projeto em cada reserva da Biosfera incluindo ações de sensibilização e demonstração envolvendo parceiros locais	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
74	Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
75	Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
76	Realização das Olimpíadas das RB	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
77	Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
78	BioKeepers: Clube de Amigos e cuidadores das RB - (íntegra catálogo de ações piloto)	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
80	Extensão do conhecimento	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera
81	Exposição itinerante	Número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera

Fonte: Candidatura 09/Call#3, maio 2020. Parte C.

Da leitura da tabela anterior e da figura seguinte, verifica-se que as atividades do Projeto ativas no período em avaliação, possuem relação com todos os indicadores estabelecidos no Programa Ambiente, à semelhança do que acontecia no período de avaliação anterior. Pode-se igualmente verificar que das 56 atividades em avaliação, o indicador “número de reservas da biosfera em que as medidas foram implementadas” já possui 26 atividades, de um total de 32, a contribuírem para o alcance da sua meta (81%), que o indicador “número do planos de desenvolvimento sustentável para as reservas da biosfera desenvolvidos”, possui 17 das atividades, de um total de 27, a contribuírem para a sua concretização (63%), surgindo, logo de seguida, o indicador “número de pessoas beneficiadas pela promoção do desenvolvimento sustentável nas Reservas da Biosfera”, com 9 atividades, de um total de 15, a contribuírem para o alcance da sua meta (60%) e, por fim, registam-se 4 atividades que contribuem para o indicador “número de profissionais treinados (desagregados por género)”, representando 57% da sua concretização, tal como pode ser observado na figura seguinte.

No contexto do referido, realça-se o facto de todos os indicadores do Programa Ambiente já possuírem mais de 50% das atividades associadas a contribuírem para o alcance das suas metas.

Figura 5.1 – Contribuição do Projeto para o alcance dos indicadores do Programa Ambiente

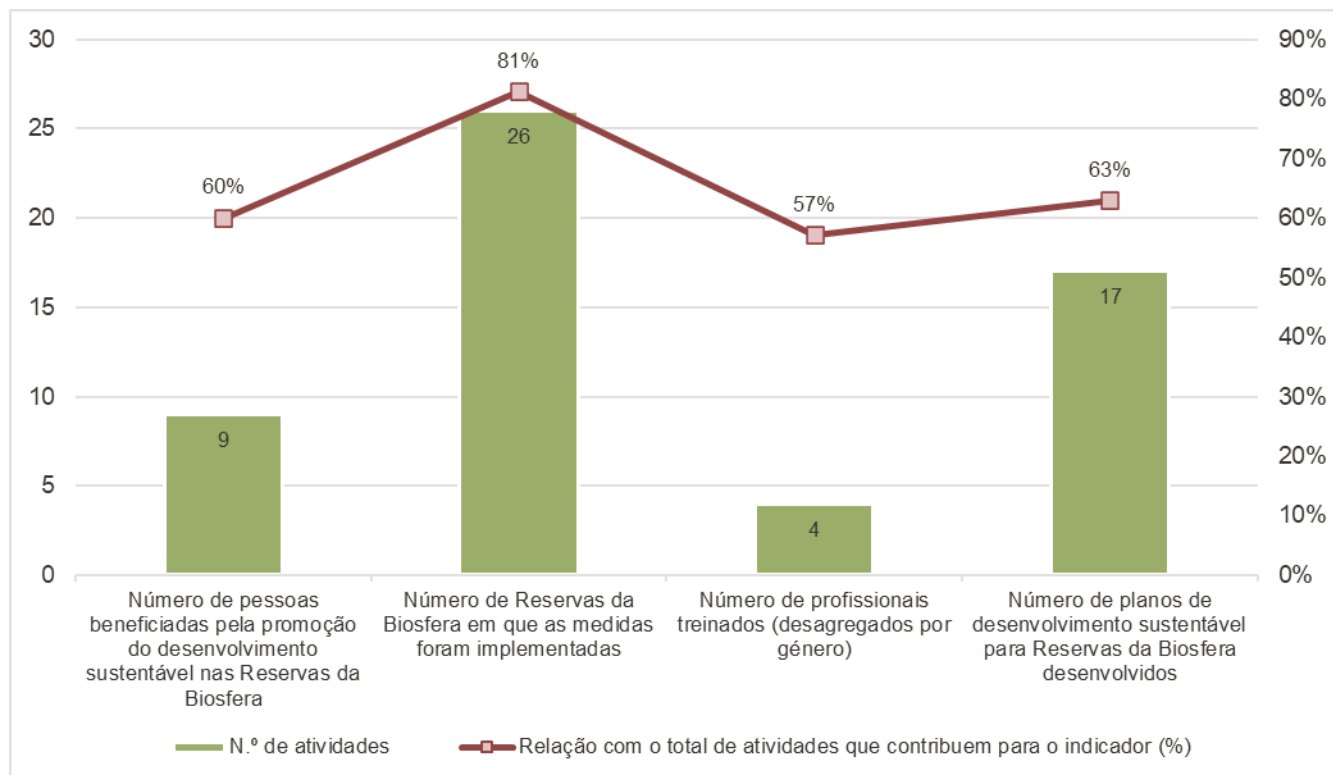

Ressalva-se que, pela natureza do Projeto (decomposto em 81 atividades) e das próprias metas associadas a cada indicador, a avaliação do real contributo para a concretização de cada indicador apenas poderá ser efetuada aquando da conclusão do Projeto ou do conjunto de atividades que contribuem para cada indicador, sendo a leitura atualmente possível apenas a de contribuição para o seu alcance.

A. FICHAS DAS ATIVIDADES

Página deixada propositadamente em branco

ID4_História das Reservas da Biosfera

Início | 12/11/2020

Fim | 01/11/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Realização de entrevistas	UNL-FCSH	23-07-2021/ 03-09-2021 – Comunidades da RB Paul do Boquilobo 13/17-09-2021 - Comunidades da RBT Meseta Ibérica 15-10-2021 - Comunidades da BR Berlengas 25/29-10-2021 - Comunidades da RBT Tejo/ Tajo Internacional
Pesquisa bibliográfica	UNL-FCSH	
Inscrição de conteúdos em tabelas Excel e BD	UNL-FCSH	
Realização de pesquisa bibliográfica em repositórios de teses e artigos científicos sobre produção científica realizada no âmbito das RB	UNL-FCSH	
Pesquisa de iconografia em arquivos de fotografia	UNL-FCSH	
Pesquisa em arquivos audiovisuais	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Relatórios trabalho de campo (RB Paul do Boquilobo; BR Berlengas; RBT Meseta Ibérica; RBT Tejo/ Tajo Internacional)	Documento
Entrevistas nas RB Paul do Boquilobo, Berlengas, Meseta Ibérica e Tejo/ Tajo Internacional	Registo audiovisual
Resumos críticos das entrevistas realizadas em RB Paul do Boquilobo; BR Berlengas; RBT Meseta Ibérica; RBT Tejo/ Tajo Internacional)	Documento / Relatório e Bases de dados
Conteúdos em bases de dados e folhas de cálculo relativamente aos conteúdos recolhidos nas RB Paul do Boquilobo, Berlengas, Meseta Ibérica e Tejo/ Tajo Internacional	Base de dados
Resumos críticos das entrevistas realizadas online relativamente aos conteúdos recolhidos nas RB Paul do Boquilobo, Berlengas, Meseta Ibérica e Tejo/ Tajo Internacional	Documento e base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Publicações		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
15 718,00€	4.045,70€	25,74%	8.059,02€	51,27%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 900,00€	836,23€	10,59%	1.202,24€	15,22%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID6_Auscultação/Perceção e identificação do património

Início | 12/11/2020

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Definição das infraestruturas, bases de dados e outros recursos de recolha de informação sobre património cultural	UNL-FCSH	-
Realização do inquérito aos visitantes - papel e online	UNL-FCSH Keep; UC-CFE	Comunidades das RB

Resultados obtidos	Evidências
Inquérito aos visitantes	Documento
Inquérito aos parceiros locais	Documento
Inquérito aos visitantes - formulário on-line	form online

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Inquéritos aplicados		x	
Meta	300		x	
Fonte de verificação	Relatório de Análise		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	1.386,32€	57,96%	2.573,87€	107,60%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 480,00€	591,26€	6,24%	957,27€	10,10%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID7_Desenvolvimento do conceito de Planos de Desenvolvimento sustentável (PDS) das RB

Início | 01/03/2021 Fim | 31/10/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Apresentação do conceito aos gestores das RB	QP	13-09-2021 - RBT da Meseta Ibérica 25-10-2021 – RBT Tejo/ Tajo Internacional
Contacto com gestores das RB	QP	21-10-2021 – RB de Paul do Boquilobo, RB Berlengas, RB Castro Verde, RBT Meseta Ibérica, RBT Tejo/ Tajo Internacional, RB Graciosa, RB Corvo, RB Flores, RB Fajãs de S. Jorge
Consolidação do conceito dos PDS	QP	
Elaboração de relatório	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Troca de informações/ contributos	Memorandos Registo efetuado no ficheiro "Registo_eventos" Informação disponibilizada na drive do Projeto
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	PDS consultados	x		
Meta	11	x		
Fonte de verificação	Relatório do Conceito dos PDS	x		

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Executado	-	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 040,00€	5 192,91€	64,59%	8 516,69€	105,93%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
84,00€	0,00€	0,00%	84,00€	100,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID8_Elaboração da metodologia de planeamento participativo para os PDS

Início | 01/05/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação das atividades com metodologias participativas e das práticas participativas previstas	QP UC-CFE; UNL-FCSH; IPN; Keep	-
Identificação de práticas participativas utilizadas nas RB	QP	-
Desenvolvimento da metodologia participativa para os PDS	QP	-
Elaboração e edição de Relatório do Modelo Participativo	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Metodologia desenvolvida	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório do Modelo Participativo	x		

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Execução	-	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 780,00€	2 463,38€	42,62%	5 706,68€	98,73%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
62,00€	0,00€	0,00%	41,33€	66,66%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID9_Consertação e validação da estrutura metodológica dos PDS

Início | 01/08/2021 Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Apresentação e discussão da proposta de estrutura dos PDS aos gestores das RB	QP	02-07-2021 – RBT Tejo/ Tajo Internacional
		13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
		25-10-2021 - RBT Tejo/ Tajo Internacional
Consolidação de proposta de estrutura de base a utilizar na elaboração dos PDS	QP	-
Elaboração de relatório	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para o relatório	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Parecer favorável	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório da Estrutura dos PDS	x		

Observações: No período de avaliação anterior (Relatório Intercalar 2) a proposta de estrutura metodológica dos PDS foi apresentada e discutida juntamente com o conceito (atividade ID7), tendo sido realizada com as RB da Região Autónoma dos Açores; RB de Santana, RB de Castro Verde, RBT do Gerês/ Xurés e RBT do Tejo/ Tajo Internacional

Considera-se que os contributos recebidos das RB correspondem ao indicador da atividade.

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Executado	-	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 840,00€	1 809,46€	98,34%	1 809,46€	98,34%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
20,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID10_Infraestrutura Digital – Modelo de gestão distribuída

Início | 01/01/2021 Fim | 30/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de fontes de informação e de contribuição de dados	UNL-FCSH	
Identificação e análise comparada de soluções tecnológicas	UNL-FCSH	
Elaboração de arquitetura de informação	UNL-FCSH	
Modelo de gestão da infraestrutura - Manual de procedimentos	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Análise e organização da informação recolhida sobre fontes de informação e recolha de dados	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Orientação/ Manual de procedimentos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Conclusão do processo de auscultação e recolha de informação junto das RB e outras entidades
		Conclusão e edição do relatório orientador e de manual de procedimentos

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID11_Infraestrutura Digital – Website das Reservas da Biosfera

Início | 12/11/2020

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Acompanhamento da produção do site de apresentação do Projeto	UNL-FCSH	
Agregação de conteúdos gráficos para integração do website	UNL-FCSH QP; UC-CFE; IPN; OBio; Keep	Todas as RB

Resultados obtidos	Evidências
Sítio de apresentação do projeto - www.reservasdabiosfera.pt	Website

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lançamento de Website		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 490,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
64 575,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID12_Infraestrutura Digital – Dashboard de gestão de indicadores

Início | 12/11/2020

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões entre parceiros para identificação e seleção de indicadores e harmonização de fornecedores de conteúdos	UNL-FCSH Keep, UC-CFE, QP	
Definição de indicadores	UNL-FCSH Keep, UC-CFE, QP	

Resultados obtidos	Evidências
Identificação e análise de infraestruturas, bases de dados e outros recursos de recolha de dados	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Disponibilização de Dashboard de indicadores		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Estabilização da definição de indicadores e recolha de informação / dados.
		Definição de metodologias de análise e interpretação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 490,00€	1.102,79€	8,83%	1.102,79€	8,83%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
24 600,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID13_Infraestrutura Digital - Catálogo de dados de investigação das Reservas da Biosfera

Início | 01/05/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de repositórios de dados / infraestruturas de investigação	UNL-FCSH	
Identificação de projetos de investigação promovidos ou associados às RB	UNL-FCSH	
Identificação e análise de dados produzidos pelo Projeto	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Conteúdos em bases de dados e folhas de cálculo	Base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Catálogo online criado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	1.777,41€	74,31%	2.329,73€	97,40%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID14_Guias digitais do património cultural e natural das Reservas da Biosfera

Início | 01/01/2021

Fim | 30/01/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de conteúdos nas plataformas e instituições culturais e integração em base de dados	UNL-FCSH	
Identificação de conteúdos nas plataformas e instituições património natural e integração em base de dados	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Conteúdos em folhas de dados e bases de dados	Documento base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Guias/ roteiros realizados		x	
Meta	15		x	
Fonte de verificação	Website ou Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Mapeamento / roteiro de fontes e documentos

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
16 333,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID15_Mapeamento da diversidade de ecossistemas das RB

Início | 12/11/2020

Fim | 30/09/2021

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	-
Definição do sistema de classificação dos ecossistemas/ habitats	UC-CFE Universidade de Bergen	-
Identificação dos habitats/ ecossistemas a delimitar e/ou reclassificar	UC-CFE	-
Mapeamento dos ecossistemas das RB	UC-CFE	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação de base para relatório	Relatório (https://drive.google.com/file/d/1heEMOVnyjR29NJ2M95N_KUU4gibdB3A/view?usp=sharing)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Mapas de composição de ecossistemas / habitats	x		
Meta	11	x		
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website	x		

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Executado	-	-
		-

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 261,82€	3 801,33€	22,02%	17 284,61€	100,13%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 628,00€	0,00€	0,00%	4 628,00€	100,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	1 664,69€	64,88%	2 566,44€	100,03%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 985,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID16_ Identificação dos Serviços de Ecossistema (SE) potenciais associados aos ecossistemas

Início | 01/01/2021

Fim | 30/11/2021

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	
Análise da estrutura analítica do MAES, CICES e IPBES e sua interligação com os ecossistemas definidos e mapeados na atividade 15	UC-CFE	
Identificação dos serviços dos ecossistemas potenciais associados a cada ecossistema definido e mapeado na Atividade ID15	UC-CFE Universidade de Bergen	

Resultados obtidos	Evidências
Lista de serviços dos ecossistemas potenciais providenciados por cada ecossistema definido e mapeado na Atividade ID15, segundo a estrutura analítica do MAES (versão de trabalho)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CYtxGK8NFT3xps4wS_5zdHmXCX_VgChM/edit?usp=sharing&ouid=100102083608359418856&rtopof=true&sd=true

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de serviços de ecossistema potenciais		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de Relatório de Atividades

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 698,42€	4 558,34€	31,01%	12 991,02€	88,38%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	1 661,40€	64,75%	2 563,15€	99,90%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID17_Análise das dinâmicas do tecido socioeconómico

Início | 01/01/2021 Fim | 31/10/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação de <i>stakeholders</i> para cada uma das RB e recolha de contactos	QP	-
Aplicação do inquérito por questionário a todos os <i>stakeholders</i>	QP	-
Reuniões com equipas de parceiros	QP UC-CFE; UNL-FCSH; IPN	-
Troca de informações com os gestores das RB e com os parceiros internacionais (Noruega e Islândia) – Workshop participativo da atividade ID21	UC-CFE QP; Universidade de Bergen; Nordhordland Utviklingsselskap IKS; Iceland National Commission UNESCO	20-10-2021 – RB de Paul do Boquilobo, RB Berlengas, RB Castro Verde, RBT Meseta Ibérica, RBT Tejo/ Tajo Internacional, RB Graciosa, RB Corvo, RB Flores, RB Fajãs de S. Jorge

Resultados obtidos	Evidências
Análise do Painele estatístico	Contributo para Relatório final da atividade

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
A aplicação do inquérito por questionário obrigou a uma reprogramação do envio on-line	As datas de envio on-line do inquérito coincidiam com o período de férias pelo que se considerou necessário adiar para ter mais hipóteses de sucesso na resposta	Reprogramação dos trabalhos de tratamento da informação e de elaboração do relatório final para 31 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Tratamento dos resultados do inquérito por questionário
		Análise integrada de dados quantitativos e qualitativos
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 254,50€	3 333,23€	53,29%	5 264,63€	84,17%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 283,80€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
80,00€	0,00€	00,00%	48,00€	60,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID18_Identificação de atores-chave do sector socioeconómico nas Reservas da Biosfera (RB)

Início | 01/01/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
<i>Desk research</i> e compilação de informação	IPN	
Análise do painel de indicadores construído pela QP no âmbito da Atividade 17	IPN	

Resultados obtidos	Evidências
<i>Desk research</i> e compilação de informação	Relatório

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização de reuniões com as RB
		Continuação de <i>desk research</i> e compilação de informação
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 572,53€	3 939,61€	21,21%	15 517,01€	83,55%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
953,52€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID19 Identificação de boas práticas de I&DT, inovação e empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável

Início | 01/01/2021 Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Compilação e análise de informação relativa à RB La Palma	IPN	
Reunião em formato remoto com a RB La Palma, com o objetivo de identificar boas práticas de I&DT, Inovação e Empreendedorismo alinhadas com o desenvolvimento sustentável;	IPN	RB La Palma
Reunião em formato presencial que ocorreu na Universidade de Coimbra com a RB Nordhordland (Noruega)	IPN Nordhordland Utviklingsselskap IKS	
Reunião em formato remoto com UC-CFE com o objetivo de identificar leituras e / ou contatos para execução da Atividade 19	IPN UC-CFE	

Resultados obtidos	Evidências
Reunião com RB La Palma	Troca de emails para marcação da reunião, foto de reunião e relatório pós-reunião
Reunião com RB Nordhordland	Troca de emails após a reunião e relatório pós-reunião
Reunião com Parceiro do projeto (UC-CFE)	Troca de emails para marcação da reunião

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização de reuniões com as RB
		Revisão de literatura, análise de informação e <i>desk research</i>
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 572,53€	7 476,71€	40,26%	14 363,44€	77,34%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
953,52 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID20_ Identificação das prioridades e projetos nas áreas de desenvolvimento e sustentabilidade

Início | 01/05/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Análise documental – documentação disponibilizada pelas entidades gestoras das 11 RB	QP	-
Reunião com outros parceiros	QP UC-CFE; UNL-FCSH; IPN	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação aprofundada sobre estratégia e prospetiva relativamente às 11 RB	Contributos para relatório da atividade

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Adiamento da realização das entrevistas com gestores das RB	Considerando o adiamento da realização do inquérito por questionário aplicado on-line na atividade 17, essencial em termos de input para esta atividade	Reprogramação das atividades previstas até 28 de fevereiro de 2022

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Análise de resultados da Atividade ID17
		Entrevistas com Gestores das 11 Reservas da biosfera
		Análise e tratamento dos resultados das entrevistas
		Integração de diversa informação recolhida
		Elaboração e edição de Relatório de Diagnóstico

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 840,00€	7 939,69€	116,08%	8 490,61€	124,13%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 979,75€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
126,00€	0,00€	0,00%	31,50€	25,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID21_Seleção de SE chave para o desenvolvimento sustentável das RB

Início | 01/03/2021

Fim | 30/04/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra, Universidade de Bergen e Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	
Desenvolvimento e organização do workshop participativo e colóquio internacional	UC-CFE Universidade de Bergen Nordhordland Utviklingsselskap IKS	
Realização do workshop participativo e colóquio internacional	UC-CFE QP; UNL-FCSH; Universidade de Bergen; Nordhordland Utviklingsselskap IKS; Iceland National Commission UNESCO	20/21-10-2021 – RB de Paul do Boquilobo, RB Berlengas, RB Castro Verde, RBT Meseta Ibérica, RBT Tejo/ Tajo Internacional, RB Graciosa, RB Corvo, RB Flores, RB Fajãs de S. Jorge
Elaboração de questionários (em curso)	UC-CFE Universidade de Bergen	
Saída de campo para desenvolvimento da estratégia participativa e visita às RB, em articulação com as atividades desenvolvidas pela UNL-FCSH	UC-CFE UNL-FCSH	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo 13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica 25-10-2021 - RBT Tejo/ Tajo Internacional

Resultados obtidos	Evidências
Metodologia para a execução de um workshop participativo (versão final)	https://docs.google.com/document/d/1AOxHE7ZmDT92xz5sGLJluyYvsyl8ELc/edit?usp=sharing&ouid=100102083608359418856&rtpof=true&sd=true
Relatório de execução do workshop participativo “Serviços dos ecossistemas-chave nas Reservas da Biosfera Portuguesas” (versão de trabalho)	https://docs.google.com/document/d/1PA2g8bLa1RTh7_atVga50lg8s2gklfvi/edit?usp=sharing&ouid=100102083608359418856&rtpof=true&sd=true
Cartaz de divulgação do Colóquio Internacional “Shared experiences in Sustainability within UNESCO Biosphere Reserves in Portugal, Norway, and Iceland”	https://drive.google.com/file/d/1AWzEuofCnF4Gyi4AwLBCx-82Vqa6Xg-g/view?usp=sharing

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de serviços de ecossistema chave para as RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 638,68€	4 602,18€	26,09%	13 667,93€	77,49%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
23 141,00€	1 154,38€	4,99%	1 282,39€	5,54%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 100,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	2 546,59€	99,25%	2 546,59€	99,25%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 832,00€	4 871,23€	83,53%	4 871,23€	83,53%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 045,52€	753,60€	24,74%	753,60€	24,74%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID22_ Seleção de indicadores e desenvolvimento de metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE

Início | 01/06/2021

Fim | 30/04/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	-
Revisão bibliográfica de indicadores de avaliação da condição/estado dos SE (em curso)	UC-CFE Universidade de Bergen	-
Desenvolvimento de metodologias para a avaliação da condição/estado dos SE (em curso)	UC-CFE Universidade de Bergen	

Resultados obtidos	Evidências
Revisão bibliográfica de indicadores de avaliação da condição/estado dos SE	-
Metodologia para a avaliação da condição/estado dos SE (versão de trabalho)	https://docs.google.com/document/d/1xn2h2kKF9bnrrdqKhSOtRJeQNOXX0NpL/edit?usp=sharing&ouid=100102083608359418856&rtpof=true&sd=true
Lista de potenciais indicadores de condição/estado dos SE (versão de trabalho)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGEMUjC4QePwvtAjnJWM-vmN5n6Kq4bm/edit?usp=sharing&ouid=100102083608359418856&rtpof=true&sd=true

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de indicadores e Metodologia para a avaliação da condição dos SE		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividade		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
19 103,59€	5 419,35€	28,37%	6 824,09€	35,72%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	2 566,53€	100,03%	2 566,53€	100,03%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID23_Avaliação da condição/ estado dos SE

Início | 01/09/2021

Fim | 30/06/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra e Universidade de Bergen

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	-
Compilação dos indicadores e análise da sua capacidade de resposta na avaliação da condição/estado dos SE (em curso)	UC-CFE Universidade de Bergen	-

Resultados obtidos	Evidências
Compilação bibliográfica dos indicadores de avaliação da condição/estado selecionados dos SE	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Determinação da qualidade dos SE em cada RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
19 750,40€	1 409,51€	7,14%	1 409,51€	7,14%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	2 566,53€	100,03%	2 566,53€	100,03%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID24_Proposta de valorização dos SE (adicional valor)

Início | 01/09/2021

Fim | 31/08/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra, Universidade de Bergen e Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	-
Desenvolvimento de metodologias participativas para a identificação dos bens e serviços que podem ser valorizados em ecológicos, socioculturais e económicos (em curso)	UC-CFE Universidade de Bergen Nordhordland Utviklingsselskap IKS	-

Resultados obtidos	Evidências
Revisão bibliográfica sobre metodologias participativas para valorização de SE	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Lista de SE chave valorizáveis e mapas de potencial de valorização de cada RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 265,53€	1 001,41€	7,02%	1 001,41€	7,02%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
13 618,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 100,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	925,14€	36,06%	925,14€	36,06%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 832,00€	1 338,25€	22,95%	1 338,25€	22,95%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 045,52€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID25_Valoração dos SE (atribuir valor) e sua interligação com os setores económicos associados – (integra catálogo das ações piloto)

Início | 01/08/2021 Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	-
Revisão bibliográfica sobre estratégias de valoração, utilizando abordagens monetárias e não monetárias (em curso)	UC-CFE	-

Resultados obtidos	Evidências
Revisão bibliográfica sobre estratégias de valoração, utilizando abordagens monetárias e não monetárias, dos SE	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Determinação do valor económico e ecológico dos SE chave de cada RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
17 046,43€	329,20€	1,93%	329,20€	1,93%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 900,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID26_Mapeamento dos SE das RB

Início | 01/09/2021

Fim | 31/10/2022

Progressão técnica – Universidade de Coimbra, Universidade de Bergen e Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões técnico-científicas semanais	UC-CFE	-
Desenvolvimento de geodatabases para mapeamento dos SE (em curso)	UC-CFE	-
Revisão bibliográfica de técnicas de interpolação espacial	UC-CFE	-

Resultados obtidos	Evidências
Desenvolvimento de geodatabases para mapeamento dos SE	-
Revisão bibliográfica de técnicas de interpolação espacial	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Mapas de SE chave de cada RB		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades / Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira – Universidade de Coimbra

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
22 004,71€	1 110,49€	5,05%	1 110,49€	5,05%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Universidade de Bergen

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 565,73€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Progressão financeira – Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 832,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID34_Seleção das 11 ações piloto

Início | 01/08/2021 Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
-	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
-	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o desenvolvimento dos PDS e com as atividades que integram o catálogo de ações piloto, de modo a ter como referencial as estratégias e linhas de atuação de cada RB.	Adiamento do início da atividade para 1 de junho de 2022 e da sua conclusão para 31 de julho de 2022.

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Ações piloto selecionadas			x
Meta	11			x
Fonte de verificação	Ações piloto implementadas			x

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Não iniciada	Não iniciada	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
380,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2,00	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID35_Roteiros Turísticos das Reservas da Biosfera Portuguesas - (integra catálogo de ações piloto)

Início | 01/06/2021 Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Participação em reuniões de trabalho com as RB	QP	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo 13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
Deslocações às RB para inventários e entrevistas	QP	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo 13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
Troca de informações com os gestores das RB e com os parceiros internacionais (Noruega e Islândia) – Workshop participativo da atividade ID21 e Colóquio Internacional	UC-CFE QP; Universidade de Bergen; Nordhordland Utviklingsselskap IKS; Iceland National Commission UNESCO	20/21-10-2021 – RB de Paul do Boquilobo, RB-Berlengas, RB Castro Verde, RBT Meseta Ibérica, RBT Tejo/Tajo Internacional, RB Graciosa, RB Corvo, RB Flores, RB Fajãs de S. Jorge
Compilação de informação geral sobre os territórios onde estão localizadas as RB	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Informação recolhida através das reuniões realizadas com os gestores das RB	Registos das informações recolhidas
Informação recolhida relativa às RB Paul do Boquilobo e RBT Meseta Ibérica, nomeadamente: biodiversidade, paisagem, património cultural e histórico, infraestruturas, acessibilidades e serviços	Compilação da informação obtida Registos fotográficos disponíveis na drive do Projeto
Diversa informação recolhida através da consulta de documentação disponível em publicações e em websites	Compilação da informação consultada

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Roteiros criados		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Roteiros Turísticos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso Deslocações às RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 307,86€	1 449,43€	11,78%	1 914,90€	15,56%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
8 567,60	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID36_Memórias e identidades – registo sistematizado de memórias – (integra catálogo de ações piloto)

Início | 12/11/2020

Fim | 30/09/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Produção de materiais de apresentação atividade recolha de memórias	UNL-FSCH Keep	-
Sessão de apresentação do projeto às RB e Comunidades na RB Meseta Ibérica	UNL-FSCH Keep	RBT Meseta Ibérica RBT Tejo/ Tajo Internacional
Recolha local de entrevistas - Dias da Memória	UNL-FSCH Keep	23-07-2021/ 03-09-2021 – Comunidades da RB Paul do Boquilobo 13/17-09-2021 – Comunidades da RBT Meseta Ibérica Comunidades da BR Berlengas 25/29-10-2021 - Comunidades da RBT Tejo/ Tajo Internacional
Recolha de testemunhos materiais - fotografias e objetos	UNL-FSCH Keep	23-07-2021/ 03-09-2021 – Comunidades da RB Paul do Boquilobo 13/17-09-2021 – Comunidades da RBT Meseta Ibérica Comunidades da BR Berlengas 25/29-10-2021 - Comunidades da RBT Tejo/ Tajo Internacional
Trabalho de Campo: auscultação e reuniões com comunidade local	UNL-FSCH Keep	23-07-2021/ 03-09-2021 – Comunidades da RB Paul do Boquilobo 13/17-09-2021 – Comunidades da RBT Meseta Ibérica Comunidades da BR Berlengas 25/29-10-2021 - Comunidades da RBT Tejo/ Tajo Internacional
Caracterização e integração em base de dados de elementos relativos às entidades das RB Paul do Boquilobo, RB Berlengas, RBT Meseta Ibérica e BRT Tejo/ Tajo Internacional	UNL-FSCH Keep	-
Tratamento e edição das entrevistas	UNL-FSCH Keep	-
Validação das entrevistas	UNL-FSCH Keep	-
Relatórios Trabalho de Campo	UNL-FSCH Keep	-

Resultados obtidos	Evidências
Guião das entrevistas	Documento
Relatórios trabalho de campo	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Entrevistas realizadas		x	
Meta	165		x	
Fonte de verificação	Website		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Convite à recolha de memórias
		Apresentação local do projeto de registo de memórias.
		Realização de Dias da Memória

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
28 510,00€	3 109,36€	10,91%	4 691,42€	16,46%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
28 645,00€	1 250,32€	4,36%	1 982,35€	6,92%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 429,90	283,71€	3,01%	3 782,04€	40,11%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
18 450,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID37_Criação de espaços de memória e comunidade - (integra catálogo de ações piloto)

Início | 01/05/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Apresentação proposta de projeto	UNL-FCSH Keep	23-07-2021 RB Paul do Boquilobo
		13/17-09-2021 RBT Meseta Ibérica
		25/29-10-2021 RBT Tejo / Tajo Internacional

Resultados obtidos	Evidências
Definição de estratégia com RB Paul do Boquilobo	Documento
Diversa informação recolhida e inscrita em tabelas e base de dados	Folhas de calculo e base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Centros de memória criados		x	
Meta	3		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
		Desenvolvimento da proposta e implementação em Castro Verde
		Apresentação de propostas noutras RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID38_Rede de Lojas das Reservas da Biosfera e loja virtual – (integra catálogo de ações piloto)

Início | 01/10/2021

Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Programação dos trabalhos da atividade	QP	-
Análise benchmarking	QP	-
Preparação do inquérito on-line a produtores locais	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Conhecimento de outras experiências nas RB portuguesas e outras	Documentos de trabalho

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Loja virtual criada		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Site do Projeto		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Conclusão da análise benchmarking
		Preparação do inquérito por questionário a produtores locais
		Desenvolvimento de proposta preliminar

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 460,00€	178,01€	3,26%	178,01€	3,26%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
50,00	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID45_Referencial de certificação em sustentabilidade – Reservas da Biosfera Portuguesas

Início | 12/11/2020 Fim | 11/04/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Lançamento da ficha de recolha de informação relativa aos eventos/ características/ património mais relevantes de cada RB	QP	Todas as RB
Continuação dos trabalhos relacionados com a análise de benchmarking sobre as RB com o objetivo de analisar as melhores práticas utilizadas nas RB mundiais, nomeadamente ao nível da sustentabilidade e de sistemas de certificação em turismo sustentável	QP	-
Trabalhos relacionados com a análise de benchmarking sobre as RB com o objetivo de analisar as melhores práticas utilizadas nas RB portuguesas e, nomeadamente ao nível da sustentabilidade, sistemas de certificação em turismo sustentável e certificação de bens e serviços nos territórios onde as RB estão inseridas	QP	
Participação em reuniões de trabalho com as RB	QP	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo 13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
Participação em workshop com as RB	UNL; Keep QP	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo 13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
Deslocações às RB para inventários e entrevistas	QP	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo 13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
Troca de informações com os gestores das RB e com os parceiros internacionais (Noruega e Islândia) – Workshop participativo da atividade ID21 e Colóquio Internacional	UC-CFE QP; Universidade de Bergen; Nordhordland Utviklingsselskap IKS; Iceland National Commission UNESCO	20-10-2021 – RB de Paul do Boquilobo, RB-Berlengas, RB Castro Verde, RBT Meseta Ibérica, RBT Tejo/ Tajo Internacional, RB Graciosa, RB Corvo, RB Flores, RB Fajãs de S. Jorge
Compilação de informação geral sobre os territórios onde estão localizadas as RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação recolhida através das reuniões realizadas com os gestores das RB	Registos das informações recolhidas
Informação recolhida através da ficha enviada aos gestores das RB	Registos das informações recolhidas
Discussão presencial com a sociedade civil sobre o projeto RB	Registos fotográficos disponíveis na drive do Projeto
Informação recolhida através da análise de consulta de documentação disponível e consulta a websites de RB mundiais	Registos em formato excel sobre a análise de benchmark
Compilação e trabalho de análise dos dados recolhidos no inquérito sobre Turismo nas RB	Formulário do inquérito Respostas aos inquéritos
Informação recolhida relativa às RB Paul do Boquilobo e RBT Meseta Ibérica, nomeadamente: biodiversidade, paisagem, património cultural e histórico, infraestruturas, acessibilidades e serviços	Compilação da informação obtida Registos fotográficos disponíveis na drive do Projeto
Diversa informação recolhida através da consulta de documentação disponível em publicações e em websites	Compilação da informação consultada

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Referencial e respetivo quadro normativo		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório Referencial Normativo e Manuais de Boas Práticas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Deslocações às RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
12 064,14	2 674,05€	22,17%	9 521,93€	78,93%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 422,18	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID46_Diagnóstico de Necessidades de Formação que suportará o seu planeamento

Início | 01/04/2021

Fim | 31/10/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Continuação da análise documental	QP	-
Levantamento das atividades formativas realizadas pelas RB dirigidas aos gestores	QP	-
Levantamento de boas práticas formativas relacionadas com ODS em outras RB da UNESCO	QP	-
Continuação da elaboração dos instrumentos de diagnóstico de necessidades – guiões de entrevista	QP	-
Partilha de informação recolhida com parceiros	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Recolha e análise documental	-
Afinação metodológica	Quadro metodológico
Levantamento da formação realizada para gestores das RB	Quadro de atividades formativas realizadas nas reservas nos últimos 2 anos
Seleção de boas práticas formativas para gestores sobre ODS	Quadro com boas práticas
Instrumentos de inquirição para validação	Versão final do guião de entrevista

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	A identificação das necessidades de formação deve ser realizada após a definição do referencial de competências associado ao ODS estratégicos de cada RB, a serem identificados nos PDS, pelo que é necessário o alinhamento entre atividades.	Adiamento da conclusão da atividade para 31 de março de 2022

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório de Diagnóstico		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da recolha e análise documental
		Preparação do trabalho de terreno
		Realização das entrevistas com os gestores das reservas
		Consulta de especialistas e parceiros acerca das conclusões do DNF

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
19 140,00€	3 918,05€	20,47%	4 775,29€	24,95%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 433,27€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
174,00€	0,00€	0,00%	74,58€	42,86%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID47_Programa de reforço de competências em governance para responsáveis das entidades gestoras das RB, de parceiros e de agentes locais

Início | 01/10/2021 Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
-	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
-	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o desenvolvimento dos PDS, de modo a ter como referencial as estratégias e linhas de atuação de cada RB	Adiamento do início da atividade para 1 de fevereiro de 2022

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Loja virtual criada			x
Meta	1			x
Fonte de verificação	Site do Projeto			x

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Não iniciada	Em execução	Identificação das áreas estratégicas de cada RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 260,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 033,27€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
56,00	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00 €	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID48_Formação em planeamento e metodologias participativas para gestores das reservas relativamente à implementação dos PDS

Início | 01/05/2021

Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Consulta dos dossiers de candidatura, planos de atividade e relatórios periódicos das RB e demais informação recebida	QP	-
Análise de boas práticas	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Identificação das formações realizadas destinadas aos gestores das reservas	Listagem das formações realizadas
Início da recolha de exemplos de boas práticas formativas	Boas práticas formativas recolhidas

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Pessoas abrangidas na formação		x	
Meta	100		x	
Fonte de verificação	Relatório de Execução da Formação e Certificados Emitidos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração do esboço de planeamento de formações articulado com a atividade ID46
		Recolha de boas práticas formativas sobre metodologias participativas

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 900,00€	0,00€	0,00%	203,18€	2,05%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas partilham informação de base trabalhada na ID46.				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 794,36€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
70,00€	0,00€	0,00%	7,78€	11,11%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID49_Formação associada à implementação das ações piloto

Início | 01/08/2021

Fim | 31/10/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
-	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
-	-

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o desenvolvimento dos PDS, de modo a ter como referencial as estratégias e linhas de atuação de cada RB	Adiamento do início da atividade para 1 de fevereiro de 2022

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Ações de formação			x
Meta	11			x
Fonte de verificação	Folhas de presença nas ações realizadas			x

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Não iniciada	Em execução	Identificação das áreas estratégicas de cada RB.

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 740,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 225,70€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
134,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID54_Programa de visitas e de transferência de experiências entre as RB portuguesas e os países doadores

Início | 30/09/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Troca de informações sobre o ponto de situação do Programa MaB nos países doadores.	QP Nordhordland Utviklingsselskap IKS; Iceland National Commission UNESCO	-
Discussão sobre a orientação estratégica a seguir no âmbito da primeira candidatura a Reserva da Biosfera por parte da Islândia.	QP Iceland National Commission UNESCO	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação sobre o processo de candidatura em curso para uma primeira Reserva da Biosfera na Islândia	Apresentação feita no Colóquio Internacional, na Universidade de Coimbra
Conhecimento das atividades em curso na Reserva da Biosfera de Nordhordland, Noruega	

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Visitas realizadas		x	
Meta	13		x	
Fonte de verificação	Relatório de visitas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização de contactos e reuniões com os parceiros dos países doadores

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
609,30€	268,14€	44,01%	268,14€	44,01%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 800,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID56_Elaboração da Estratégia de Marketing

Início | 12/11/2020

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Revisão e análise crítica da Estratégia de Marketing	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Ajustamentos à identificação de públicos-alvo (mais amplos e inclusivos)	Relatório “Estratégia de Comunicação e Plano de Ação” (output da ID57)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado	x		
Meta	1	x		
Fonte de verificação	Relatório da Estratégia de Marketing	x		

Observações: Com a introdução dos ajustamentos considerados necessários ao documento da Estratégia de Marketing, entregue a 31 de março, no documento “Estratégia de Comunicação e Plano de Ação” (atividade ID57), dá-se por fechada a presente atividade.

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Executado	-	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 400,00€	442,67€	31,62%	1 341,11€	95,79%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 500,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 500,00€	2 500,00€	100,00%	2 500,00€	100,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID57_Conceção do Plano de Comunicação

Início | 01/01/2021 Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Revisão do Plano de Comunicação do Projeto após partilha com os parceiros	QP UC-CFE; UNL-FCSH; IPN; OBio; Keep	-
Integração dos ajustamentos à Estratégia de Marketing (ID56) nos conteúdos do Plano de Comunicação das RB	QP	-
Elaboração e edição do Plano de Comunicação das RB, doravante designado "Estratégia de Comunicação e Plano de Ação"	QP	-
Partilha do documento com os parceiros, as RB e o Comité Nacional MaB	QP UC-CFE; UNL-FCSH; IPN; OBio; Keep	Todas as RB Comité Nacional MaB
Receção de opiniões e contributos	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Plano de Comunicação do Projeto	Informação disponibilizada na drive do Projeto (Comunicação_imagem)
Estratégia de Comunicação e Plano de Ação	Relatório editado
Contributos dos Parceiros, das RB e do Comité Nacional MaB	Registo de correspondência

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Revisão do documento da Estratégia de Comunicação e Plano de Ação face aos contributos recebidos e a receber na sequência da consulta aos Parceiros, às RB e ao Comité Nacional MaB	Prolongar a atividade até 30 de novembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Plano de Comunicação		x	

Observações: Apesar de não considerado um produto formal do Projeto regista-se a entrega do Plano de Comunicação do Projeto

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Análise e ponderação dos contributos ao documento Estratégia de Comunicação e Plano de Ação
		Revisão e edição final do documento da Estratégia de Comunicação e Plano de Ação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 400,00€	442,67€	31,62%	1 302,48€	93,03%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 500,00€	2 100,00€	60,00%	3 500,00€	100,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID58_Estratégia e Identidade de marca (Tom, Assinatura e Mensagens de comunicação, Logótipo e Brandbook)

Início | 01/03/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Conceção da proposta de Estratégia e Identidade de Marca	QP	
Partilha da proposta da Estratégia e de Identidade de Marca com os parceiros, as RB e o Comité Nacional MaB	QP UC-CFE; UNL-FSCH, IPN; OBio; Keep	Todas as RB Comité Nacional MaB
Receção de opiniões e contributos	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Estratégia e Identidade de Marca	Documento disponibilizado a todos os parceiros, às RB e ao Comité Nacional MaB
Contributos dos parceiros, das RB e do Comité	Registo de correspondência

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento ao cronograma da atividade	Revisão da Estratégia e Identidade de Marca face aos contributos recebidos e a receber na sequência da consulta aos parceiros, às RB e ao Comité Nacional MaB	Prolongar a atividade até 31 de dezembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	2		x	
Fonte de verificação	Manual de Identidade Corporativa		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Análise e ponderação dos contributos recebidos ao documento da Estratégia e Identidade de Marca
		Seleção da Identidade de Marca das Reservas da Biosfera
		Edição do Manual de Identidade Corporativa

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 800,00€	484,62€	26,92%	1,466,34€	81,46%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 095,95€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID59_Desenvolvimento Criativo Genérico

Início | 01/06/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Criação de conteúdos gráficos para aplicações diversas, nomeadamente para as redes sociais e roll-up	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Conteúdos gráficos para aplicações diversas	LinkedIn; Facebook; Instagram; Sumário do Projeto (informação disponibilizada na drive do Projeto - Comunicação_imagem)
Roll-up do Projeto	Roll-up

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com a duração do Projeto, tendo em conta que existirão materiais a ser desenvolvidos ao longo de toda a sua execução	Adiamento da conclusão da atividade para 11 de maio de 2023

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	25		x	
Fonte de verificação	Artes finais		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Edição de artes finais

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 400,00€	4 184,20€	56,54%	4 356,82€	58,88%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 095,95€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
9 600,00€	7 000,00€	72,92%	7 000,00€	72,92%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g

Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID60_Desenvolvimento Criativo da Comunicação Digital

Início | 01/06/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Elaboração da Estratégia e Gestão de Redes Sociais	QP	
Planeamento semanal de conteúdos para as Redes Sociais	QP UC-CFE	
Criação de conteúdos para as Redes Sociais	QP UC-CFE; UNL-FCSH	
Gestão das Redes Sociais	QP	

Resultados obtidos	Evidências
Estratégia e Gestão de Redes Sociais	Relatório editado
Lançamento das Redes Sociais do Projeto	Facebook, LinkedIn e Instagram
Criação orgânica de comunidade, com crescimento positivo de seguidores nas Redes Sociais do Projeto	Facebook, LinkedIn e Instagram
Promoção do alcance (orgânico) das publicações nas Redes Sociais	Facebook, LinkedIn e Instagram
Conteúdos publicados	Facebook, LinkedIn e Instagram

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com a duração do Projeto: tendo em conta que as redes sociais serão geridas ao longo de toda a sua execução, fará sempre sentido que sejam produzidos conteúdos para o efeito	Adiamento da conclusão da atividade para 11 de maio de 2023

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	10	x		
Fonte de verificação	Artes finais		x	

Observações: No âmbito da comunicação digital e trabalho criativo desenvolvido para as redes sociais do Projeto, já foram realizadas 18 artes finais (imagens gráficas trabalhadas para as publicações das rubricas "Sabia que?", "Dias comemorativos" e mapas das RB), o que permite sinalizar a meta como executada, apesar da atividade continuar ativa.

Salienta-se, também, o facto de se ter entregado o documento "Estratégia e Gestão de Redes Sociais", o qual apesar de não constituir uma fonte de verificação do Projeto, constitui um output do mesmo.

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação de criação e publicação de conteúdos para as Redes Sociais
		Continuação do crescimento orgânico da comunidade e alcance das publicações nas Redes Sociais

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 100,00€	3 634,31€	59,58%	3 806,93€	62,41%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
438,38€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
6 400,00€	3 545,00€	55,39%	4 945,00€	72,27%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID61_Produções e Materiais de divulgação - Offline

Início | 01/06/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Produção de conteúdos para materiais de divulgação diversos	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Roll-up do Projeto	Informação disponibilizada na drive do Projeto (Comunicação_imagem)
Sumário do Projeto	

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com o planeamento do Projeto, no que toca à produção e materiais de divulgação offline	Adiamento da conclusão da atividade para 11 de maio de 2023

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	14		x	
Fonte de verificação	Manual; livro		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação de criação, produção e edição de peças de comunicação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 300,00€	1 275,59€	24,07%	1 448,21	27,32%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
84 125,00€	1 500,00€	1,78%	1 500,00€	1,78%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID62_Produções e Materiais de divulgação - Online

Início | 01/06/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Produção de notícias para website do Projeto	QP UC-CFE	-
Criação de conteúdos para as redes sociais do Projeto	QP UC-CFE	-

Resultados obtidos	Evidências
Notícias publicadas no website	Disponíveis no website
Conteúdos publicados	Disponíveis nas redes sociais (LinkedIn, Facebook, Instagram)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Alinhamento com a duração do Projeto: tendo em conta que estas plataformas (website e redes sociais) serão geridas ao longo de toda a sua execução, fará sempre sentido que sejam produzidos conteúdos para o efeito	Adiamento da conclusão da atividade para 11 de maio de 2023

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	4		x	
Fonte de verificação	Website, Mapas, Roteiros, Concursos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação de criação, produção e edição de peças de comunicação
		Publicação de conteúdos nas redes sociais e website

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 600,00€	2 024,41€	36,15%	2 197,03€	39,23%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
57 625,00€	1 423,00€	2,47%	2 823,00€	4,90%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID63_Produções e Materiais de divulgação – Materiais Audiovisuais

Início | 01/08/2021

Fim | 30/11/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Planeamento dos materiais audiovisuais	QP	-
Definição de um guião preliminar para os conteúdos audiovisuais	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Guião preliminar dos conteúdos audiovisuais	Documentos de trabalho

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma de atividade	Alinhamento com o planeamento do Projeto, no que toca à produção e materiais audiovisuais	Adiamento da conclusão da atividade para 11 de maio de 2023

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	20		x	
Fonte de verificação	Documentários, reportagens, spots rádio		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Inventariação de materiais audiovisuais disponíveis junto das RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 900,00€	235,34€	12,39%	235,34€	12,39%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
16 875,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID64_Ativações de marca

Início | 01/08/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Análise sobre as atividades de ativação de marca, o seu planeamento e recursos a considerar para a sua execução	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Identificação dos materiais necessários e de contactos a realizar	Documentos de trabalho

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Peças de comunicação		x	
Meta	10		x	
Fonte de verificação	Artes finais		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 800,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 579,75€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
32 240,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID65_Relações públicas

Início | 01/08/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Assessoria de Imprensa – divulgação das atividades relacionadas com o Projeto	QP UC-CFE; UNL-FCSH	-

Resultados obtidos	Evidências
Presença nos meios de comunicação (televisão, papel e digital)	26-07-2021 - “As reservas da biosfera portuguesas que desconhecemos” (Observador - podcast) - com a participação do Coordenador Geral do Projeto.
	28-07-2021 - Bom Dia Portugal (RTP) – presença e comentário do CoordenadorG do Projeto, no âmbito do dia da conservação da natureza
	28-07-2021 - Portugal em Direto (RTP) – visita à RB Paul do Boquilobo, no âmbito do dia da conservação da natureza.
	28-07-2021 - Publicação de artigo de opinião “As Reservas da Biosfera e a celebração da Natureza” (Expresso online) - escrito pela Coordenadora Científica do Projeto
	15-08-2021 - “As reservas da biosfera portuguesas querem deixar de ser ilustres desconhecidas” (Público - papel) - reportagem sobre o Projeto e visita à primeira RB em Portugal, Paul do Boquilobo.
	15-08-2021 - “As reservas da biosfera portuguesas querem deixar de ser ilustres desconhecidas” (Público - online), - reportagem sobre o Projeto e visita à primeira RB em Portugal, Paul do Boquilobo.
	17-09-2021 - Portugal em Direto (RTP) – visita à RBT Meseta Ibérica, no âmbito da apresentação do Projeto em Castelo Rodrigo
	20-10-2021 - “Reservas da Biosfera promovem Colóquio Internacional em Coimbra” (Ambiente Magazine)
	20-10-2021 - “Reservas da Biosfera promovem Colóquio Internacional em Coimbra” (website Rádio Regional do Centro)
	20-10-2021 - “Reservas da Biosfera promovem Colóquio Internacional em Coimbra” (Campeão das Províncias)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Atividades divulgadas		x	
Meta	300		x	
Fonte de verificação	Registo de contactos		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Assessoria de imprensa contínua

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 400,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 991,90€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
22 450,00€	1 000,00€	4,45%	1 000,00€	4,45%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID66_Estratégia e planeamento de meios

Início | 01/08/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Recolha de orçamentos para definição posterior de estratégia e planeamento nos meios de comunicação	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação base para relatório	Orçamentos recebidos

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Estratégia de meios		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Análise dos orçamentos
		Conceção da estratégia de projeção da notoriedade de cada uma das RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 700,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID67_Estratégia e planeamento de meios - Imprensa

Início | 01/08/2021

Fim | 28/02/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Recolha de orçamentos para imprensa	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação base para relatório	Orçamentos recebidos

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Análise dos orçamentos
		Conceção da estratégia de inserções publicitárias

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 600,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 550,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID68_Estratégia e planeamento de meios - Rádio

Início | 01/08/2021

Fim | 28/02/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Recolha de orçamentos para rádio	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação base para relatório	Orçamentos recebidos

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Análise dos orçamentos
		Conceção da estratégia das campanhas

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 500,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 750,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID69_Estratégia e planeamento de meios - Digital

Início | 01/08/2021

Fim | 28/02/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Prospecção de mercado no digital	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação base para relatório	Documentos de trabalho

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 730,33€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
49 750,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID71_Elaboração de Plano de Sensibilização para diferentes públicos

Início | 01/01/2021

Fim | 31/07/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Resultados obtidos	Evidências

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	A elaboração do Plano de Sensibilização deve ser realizada após a definição da Estratégia e Plano de Comunicação pelo que é necessário o alinhamento entre atividades	Adiamento da conclusão da atividade para 30 de novembro de 2021

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Relatório editado		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Relatório do Plano de Sensibilização		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da realização das tarefas em curso
		Elaboração e edição de Relatório Plano de Sensibilização

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
1 228,30	0,00€	0,00%	385,76€	31,41%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas de base já foram executadas no período anterior, faltando apenas o fecho do Plano de Sensibilização que necessita de estar alinhado com a Estratégia e Plano de Comunicação da ID57				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul. 2021 - 31 out.2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID72_Sessões de apresentação local do Projeto em cada Reserva da Biosfera incluindo ações de sensibilização e demonstração envolvendo parceiros locais

Início | 01/09/2021

Fim | 31/12/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Apresentação pública do Projeto	QP	13-09-2021 - Gestores da RBT Meseta Ibérica, Município, Escolas, Associações de âmbito local, público em geral 25-10-2021 - Gestores da RBT Tejo/Tajo Internacional, Município, Escolas, Associações de âmbito local, público em geral

Resultados obtidos	Evidências
Divulgação geral do Projeto junto de atores relevantes	Apresentação powerpoint - Informação disponibilizada na drive do Projeto

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Ajustamento do cronograma da atividade	Exoneração dos 4 gestores das RB da Região Autónoma dos Açores e adiamento da apresentação prevista na RB Berlengas a pedido do Município	Adiamento da conclusão da atividade para 28 de fevereiro de 2022

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Sessões realizadas		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Folhas de presença/ dossier de <i>clipping</i> das sessões		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Apresentação pública do Projeto na Região Autónoma dos Açores e na Berlenga-Peniche

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
360,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas inserem-se nas atividades transversais de gestão				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 568,66€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
32,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID74_Planeamento das Olimpíadas Nacionais da Biosfera

Início | 01/02/2021 Fim | 30/09/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Reuniões para a escolha das comissões de organização e científica das Olimpíadas das Reservas da Biosfera	OBio	
Reunião com equipa de comunicação para seleção do layout do site	OBio Todos os Parceiros	
Definição da estrutura do website para divulgação	OBio	
Elaboração e edição de Relatório de Planeamento das Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera.	OBio Todos os Parceiros	

Resultados obtidos	Evidências
Relatório de Planeamento das Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera.	Relatório
Listagem da Comissão Organizadora	Documento
Listagem da Comissão Científica	Documento

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Olimpíadas das RB realizada		x	
Meta	1		x	
Fonte de verificação	Inscrição efetuadas de alunos e de escolas		x	

Observações: Considera-se que a atividade de planeamento das olimpíadas se encontra executada com a edição do relatório e o lançamento das inscrições para as escolas, permanecendo aberta até à verificação do indicador, que ocorrerá com a concretização da atividade ID76, e da fonte de verificação o que ocorrerá em 31/07/2022.

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Executado	-	-

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 581,67€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto.			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID75_Comunicação e divulgação das Olimpíadas das RB

Início | 01/03/2021

Fim | 30/11/2021

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Identificação dos parceiros para a divulgação	OBio	
Preparação do conteúdo para a página de divulgação das Olimpíadas alojada no <i>site</i> do Projeto das Reservas da Biosfera.	OBio	

Resultados obtidos	Evidências
Conteúdo para a página de divulgação	Documento de trabalho

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Entidades/ pessoas contactadas		x	
Meta	1000		x	
Fonte de verificação	Site do Projeto: consulta da "área" específica das Olimpíadas / inscrições efetuadas		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Criação da área específica das Olimpíadas no site do Projeto
		Divulgação do evento nas redes sociais
		Divulgação institucional do evento, junto das escolas e Direção Geral da Educação

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
500,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 000,0€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID76_Realização das Olimpíadas das RB

Início | 01/09/2021

Fim | 31/07/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Escolha e preparação dos temas das provas	OBio Comissão Científica	
Proposta dos critérios de avaliação da 1ª eliminatória, componente B	OBio Comissão Científica	

Resultados obtidos	Evidências
Seleção de conteúdos	Documentos de trabalho

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Estudantes participantes		x	
Meta	200		x	
Fonte de verificação	Site do Projeto: consulta da "área" específica das Olimpíadas Dossier de <i>clipping</i> de notícias sobre o evento		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Divulgação das escolas inscritas.
		Elaboração e aplicação da prova da componente A da 1ª eliminatória.
		Elaboração dos critérios de elaboração e correção dos pósteres previstos na componente B da 1ª eliminatória.
		Preparação das provas da segunda eliminatória

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 581,67€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
7 000,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 000,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 000,0€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID77_Conceção e organização de Festivais das Reservas da Biosfera

Início | 01/04/2021

Fim | 30/09/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Análise documental – documentação disponibilizada pelas entidades gestoras das 11 RB	QP	-
Elaboração de cenários de festivais tendo em vista a validação com parceiros e gestores das RB	QP	-

Resultados obtidos	Evidências
Informação relativa às 11 RB	Contributos para preparação da atividade
Proposta preliminar de Festivais das RB	Documentos a colocar à apreciação de gestores das RB e dos parceiros

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Eventos realizados		x	
Meta	3		x	
Fonte de verificação	Relatório de realização da 1ª edição da Rede de Festivais de Artes e Cultura das Reservas da Biosfera de Portugal/ Dossier de <i>clipping</i>		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Recolha de informação sobre dinâmica de eventos nas 11 RB (questionário on-line aplicado na atividade ID17 e entrevistas aplicadas na atividade ID20)
		Tratamento de informação qualitativa
		Elaboração de proposta preliminar dos Festivais das RB

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
10 400,00€	366,13€	3,52%	748,55€	7,20%
Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 422,18€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
60,00€	0,00€	0,00%	9,99€	16,65%
Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%
Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID78_BioKeepers: Clube de Amigos e cuidadores das RB – (integra catálogo de ações piloto)

Início | 01/09/2021 Fim | 30/09/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Preparação de ação piloto a realizar na RB de Castro Verde (dando sequência aos contactos estabelecidos anteriormente aquando do trabalho de campo realizado na RB Castro Verde).	KEEP	RB Castro Verde
Participação nas apresentações públicas do projeto (RB de Paul do Boquilobo, RBT da Meseta Ibérica, RBT do Tejo Internacional).	KEEP	23-07-2021 - RB Paul do Boquilobo
		13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
		25-10-2021 - RBT Tejo/ Tajo Internacional

Resultados obtidos	Evidências
Planificação de atividade a partir de diagnóstico da realidade do território.	Documento que visa caracterizar a atividade, as dinâmicas de envolvimento e de constituição de uma comunidade de Keepers, bem como os seus objetivos.
Planificação, organização e execução de atividades no âmbito do trabalho de campo na RB Paul do Boquilobo, na RBT Meseta Ibérica, RB Berlengas, RBT Tejo/ Tajo Internacional	Relatório de Campo da RB de Paul do Boquilobo (RTC_PB), RBT da Meseta Ibérica (RTC_MI), RB das Berlengas (RTV_BL), RBT do Tejo Internacional (RTC_TJ)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Plano de atividades com o AE de Castro Verde	O AE está atualmente sem diretor	Pendente agendamento

Nota: Esta reprogramação não implica alteração do cronograma da atividade

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	"Membros" / BioKeepers		x	
Meta	1100		x	
Fonte de verificação	Relatório de atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Preparação da atividade piloto.
		Articulação com parceiros.
		Realização da atividade piloto.

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
21 600,00€	0 00€	0,00%	0,00€	0,00%
Nota: Período sem despesas atribuídas nesta rubrica porque as tarefas executadas partilham informação de base trabalhada na ID80.				

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
4 730,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

ID80_Extensão do conhecimento

Início | 12/11/2021 Fim | 30/05/2022

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Produção executiva e logística de reunião de parceiros na RB Paul do Boquilobo e das deslocações às RB para apresentação geral do projeto e realização de trabalho de campo em articulação com os gestores das RB e de todos os parceiros do projeto.	KEEP	-
Participação na reunião de parceiros do projeto na RB de Paul do Boquilobo.	Todos os parceiros	23-07-2021 – RB Paul do Boquilobo
Apresentação da ação em cada RB - objetivos e metodologia.	KEEP UNL-FCSH, UC-CFE, QP	23-07-2021 – RB Paul do Boquilobo
		13-09-2021 - RBT Meseta Ibérica
		15-10-2021 - RB Berlengas
		26-10-2021 - RBT Tejo/ Tajo Internacional
Acompanhamento do trabalho de Campo realizado na RB Paul do Boquilobo; RBT Meseta Ibérica; RB Berlengas; RBT Tejo Internacional.	KEEP UNL-FCSH	03-09-2021 – RB Paul do Boquilobo
		13/18-09-2021 – RBT Meseta Ibérica
		15-10-2021 – RB Berlengas
		26/29-10-2021 – RBT Tejo/ Tajo Internacional

Resultados obtidos	Evidências
Sessões de apresentação do projeto e trabalho de campo realizado em RB Paul de Boquilobo (23 de julho e 3 de setembro), RBT Meseta Ibérica (3 a 18 de setembro), RB Berlengas (15 de outubro), RBT Tejo Internacional (26 a 29 de outubro).	Programa/agenda de trabalhos.
Participação em entrevistas no âmbito a atividade ID36 da UNL-FCSH "Memórias e identidades – registo sistematizado de memórias"	10 entrevistas realizadas na RB Paul do Boquilobo; 26 entrevistas realizadas na RBT Meseta Ibérica; 10 entrevistas realizadas na RB Berlengas; 17 entrevistas na RBT Tejo/ Tajo Internacional.
Planificação, organização e execução de atividades no âmbito do trabalho de campo na RB Paul do Boquilobo, na RBT Meseta Ibérica, RB Berlengas, RBT Tejo Internacional	Relatório de Campo da RB Paul do Boquilobo (RTC_PB), RBT Meseta Ibérica (RTC_MI), RB Berlengas (RTC_BL), RBT Tejo/Tajo Internacional (RTC_TJ)

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas
Trabalho de campo na RB das Berlengas	Não foi possível realizar devido a constrangimentos apresentados pelas entidades locais	Pendente agendamento
Trabalho de Campo na RB de Santana	Não foi possível executar devido a limitações de calendário	Agendado para 1 a 5 de fevereiro 2022
Trabalho de Campo nas RB dos Açores (Flores, Corvo, Fajãs de S. Jorge e Graciosa)	Devido a alterações na orgânica das RB que se encontram sem equipa de gestão	Pendente agendamento, previsão para a primeira vista: 15 a 19 de fevereiro 2022

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Ações de formação		x	
Meta	11		x	
Fonte de verificação	Relatório de Atividades		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Reunião com parceiros do Projeto para identificar áreas de desenvolvimento a integrar estratégia de extensão do conhecimento.
		Elaboração de estratégia integrada para a extensão do conhecimento.
		Discussão em sede de Comité Nacional MaB envolvendo todas as RB (após elaboração de estratégia integrada)

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
27 000,00€	6 488,06€	24,03%	8 685,04€	32,17%

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
14 410,00€	706,00€	14,44%	2 930,75€	20,34%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
5 400,00€	0,00€	0,00%	5 400,00€	100,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Página deixada propositadamente em branco

ID81_Exposição itinerante

Início | 01/09/2021

Fim | 11/05/2023

Progressão técnica

Tarefas realizadas	Parceiro executor envolvidos	Participantes
Investigação e recolha de conteúdos	UNL-FCSH	

Resultados obtidos	Evidências
Diversa informação recolhida e inscrita em tabelas e base de dados	Folhas de calculo e base de dados

Reorientações e ajustamentos	Justificação	Medidas corretivas

Barómetro de execução		Executado	Em execução	Não executado
Indicador	Exposição realizada		x	
Meta	12		x	
Fonte de verificação	Relatórios das exposições		x	

Observações:

Cronograma de execução		Tarefas previstas
01 jul 2021 – 31 out 2021	01 nov 2021 – 28 fev 2022	01 nov 2021 – 28 fev 2022
Em execução	Em execução	Continuação da investigação em curso e organização de conteúdos

Progressão financeira

Custos com recursos humanos afetos ao projeto – Reg. Art. 8.3.1.a				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
2 392,00€	Nota: as tarefas executadas inserem-se nas competências da própria entidade pelo que até ao momento não houve afetação ao Projeto			

Custos com transporte e ajudas de custo para deslocações de pessoal que participe no projeto – Reg. Art. 8.3.1.b				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Valor de depreciação para equipamentos novos ou usados adquiridos – Reg. Art. 8.2.4				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com equipamentos novos ou em segunda mão, desde que sejam amortizados de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis - Reg. Art. 8.3.1.c & Art. 8.3.2				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com consumíveis e outros fornecimentos – Reg. Art. 8.3.1.e				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Custos com a aquisição de serviços a terceiros para a implementação do projeto – Reg. Art. 8.3.1.f				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
3 690,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

Despesas que resultem diretamente das obrigações impostas pelo contrato de projeto – Reg. Art. 8.3.1.g				
Total previsto	Executado entre 01 jul 2021 – 31 out 2021	% (executado do período s/ total previsto)	Executado acumulado	% (executado acumulado s/ total)
0,00€	0,00€	0,00%	0,00€	0,00%

**Promotor****Quatenaire Portugal**

Rua Tomás Ribeiro n.º 412 - 2º andar | 4450-295 Matosinhos
Rua Duque de Palmela n.º 25 - 2º andar | 1250-097 Lisboa

Tel. (+351) 229 399 159 | (+351) 213 513 200
Email geral@quatenaire.pt

www.quatenaire.pt

Operador do Programa

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

AMBIENTE E
AÇÃO CLIMÁTICA
